

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1127	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/04/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/11/18
<b>Last Update</b>	03/16/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Strengthen. Provincial. Inst & Fiscal Managem. Stage II (PROFIP II)	<b>Loan Number</b>	2754/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	<b>Sector/Subsector</b>	RM-DES - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
<b>Team Leader</b>	REYES, JAVIER RAMIRO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1127	36,000,000	36,000,000	9,000,000	0	45,000,000	36,000,000	33,988,911.17	94.41%	2,011,088.83
<b>Aggregated</b>	<b>36,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>33,988,911.17</b>	<b>94.41%</b>	<b>2,011,088.83</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

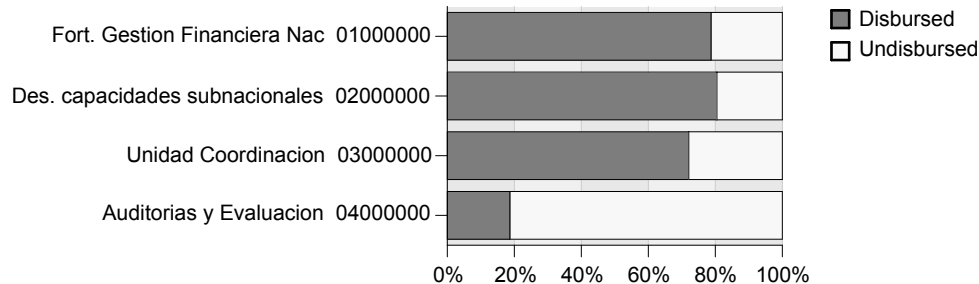

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Gestión pública orientada a resultados a nivel nacional y subnacional mejorada

##### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2018	EOP 2018
1.1	Puntaje del SEP- Pilar Gestión Financiera	Puntaje	3.30	2008	P	3.30		3.40
					P(a)	3.30	3.40	3.40
					A	3.40		

##### Details

**Means of verification:** Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015

**Observations:** En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2018	EOP 2018
1.2	Puntaje del SEP- Pilar Presupuesto por Resultados	Puntaje	2.10	2008	P	2.20		2.60
					P(a)	2.20	2.60	2.60
					A	2.50		

##### Details

**Means of verification:** Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015

**Observations:** En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2018	EOP 2018
1.3	Puntaje del SEP- Pilar Monitoreo y Evaluación	Puntaje	0.80	2008	P	1.40		2.00
					P(a)	1.40	2.00	2.00
					A	0.80		

##### Details

**Means of verification:** Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015

**Observations:** En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Sistema público de gestión financiera y presupuestaria en las instituciones de la APN modernizado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Número de programas presupuestarios de la APN con presupuesto primario gestionado en base a indicadores de resultado alineados con la programación presupuestaria	programas presupuestarios	16.00	2012	P	28.00	46.00	71.00	85.00		100.00
					P(a)	28.00	48.00	71.00	84.00	100.00	100.00
					A	36.00	48.00	73.00	81.00	110.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes anuales de monitoreo de la SH

**Observations:** La SH realiza el seguimiento de categorías programáticas y/o proyectos de inversión que tienen metas físicas, mediante el Sistema de Seguimiento Físico. En 2010, este sistema cubrió el 66,3% de la cartera programática (265 programas sobre un total de 400).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Gasto primario de la APN administrado por el Sistema Integrado de Información Financiera internet (e-SIDIF) transaccional	% gasto primario	8.00	2012	P			30.00			100.00
					P(a)			30.00	0.00	100.00	100.00
					A			65.00	0.00	100.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes anuales de monitoreo de la SH

**Observations:** El e-SIDIF trabajará sobre un total de 109 organismos de la APN más los 40 órganos rectores.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Sistema financiero público renovado (presupuesto, tesorería, contabilidad, deuda). El sistema se llama e-SIDIF.	Systems	0.00	2015	P						
					P(a)			0.00	0.00	0.00	
					A			0.00	0.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del nuevo sistema e-SIDIF.

**Observations:** .

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Gestión Pública orientada a resultados en las entidades públicas y/o mixtas sub-nacionales fortalecida

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Sub-índice de capacidad institucional del ICI	puntaje	0.24	2012	P	0.26	0.30	0.35	0.38	0.40		0.40
					P(a)	0.26	0.30	0.35	0.38	0.40	0.00	0.40
					A		0.32	0.37	0.37	0.38		

#### Details

**Means of verification:** Informes anuales de seguimiento a la ejecución y metas del Programa elaborados por la UCEN

**Observations:** La Línea de Base se construyó con el promedio de 34 proyectos evaluados al inicio del Programa. La meta será un promedio total de proyectos.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Atributo referido a las capacidades de gestión de políticas públicas orientadas a resultado a nivel sub-nacional (IGER)	puntaje	0.09	2012	P			0.11				0.15
					P(a)			0.11	0.00	0.15	0.00	0.15
					A			0.12	0.00	0.14		

#### Details

**Means of verification:** Informe de medición del IGER

**Observations:** Atributo del IGER referido a gestión pública orientada a resultados sub-nacional. La LB se obtuvo como proxy, cubriendo 34 proyectos del PROFIP I. La meta se medirá en base a la totalidad de proyectos financiados con el PROFIP II

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera gubernamental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Sistema e-SIDIF desplegado	sistema	P	1	1	1,624,560.3	16,754,446
			P(a)	1	1	4,028,001	16,621,836
			A	1	1	1,870,112	13,736,192
1.2	Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Programas presupuestarios	P	15	84	300,445.69	4,245,554
			P(a)	19	119	1,006,821	4,440,490
			A	29	110	746,380	4,043,213

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional de la gestión pública sub-nacional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Proyectos de Desarrollo de la Capacidad Institucional implementados	proyectos	P	7	40	4,099,200	19,520,000
			P(a)	4	48	3,408,179	17,228,248
			A	4	48	2,821,903	16,888,595
2.2	Provincias beneficiadas con el programa	Government agencies (#)	P		0		0
			P(a)	0	19	0	0
			A	0	19	0	0

## Other Cost

	Unidad Coordinadora	P			743,400	3,540,000
		P(a)			661,721	3,145,406
		A			482,905	3,034,040
	Auditoría, Monitoreo y Evaluación e Imprevistos	P			225,656	940,000
		P(a)			44,239	267,829
		A			30,845	75,743

## Total Cost

	Total Cost	P			6,993,261.99	45,000,000
		P(a)			9,148,961	41,703,809
		A			5,952,145	37,777,783

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Modify Output	Replanificación de metas con miras al próximo cierre del proyecto.	03/14/2018	03/01/2018
Output	Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Modify Output	Replanificación de metas con miras al cierre próximo del proyecto.	03/14/2018	03/01/2018
Output	Proyectos de Desarrollo de la Capacidad Institucional implementados	Modify Output	Replanificación de meta con miras al cierre próximo del proyecto.	03/14/2018	03/01/2018
Output	Sistema e-SIDIF desplegado	Modify Output	Replanificación de metas con miras al próximo cierre del proyecto.	03/14/2018	03/01/2018
