

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1251	Chief of Operations Validation Date	04/06/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/09/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	05/02/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Implementation of the National System for the Argentine International Trade Single Window	Loan Number	3869/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Producción de la Nación	Sector/Subsector	TD-TFL - TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
Team Leader	BEITLER, ADY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1251	73,600,000	73,600,000	8,400,000	0	82,000,000	73,600,000	400,000	0.54%	73,200,000
Aggregated	73,600,000	73,600,000	8,400,000	0	82,000,000	73,600,000	400,000	0.54%	73,200,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

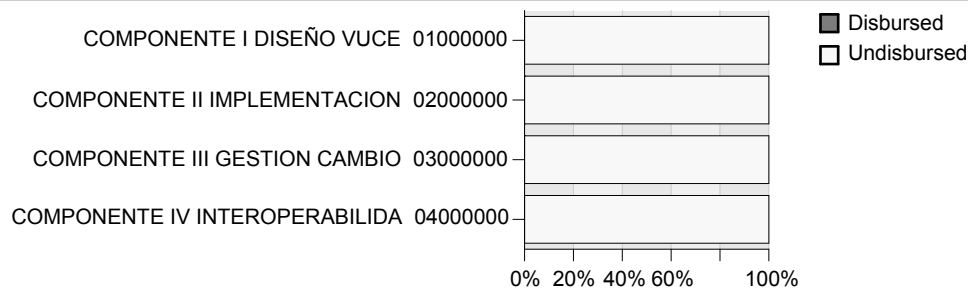

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar el nivel absoluto de desempeño de la economía en materia regulatoria y comercial externo

Observation: El indicador 1.1 permite dar cuenta de la distancia entre el desempeño de una economía en particular y el mejor desempeño a nivel global. Además permite evaluar el cambio absoluto en el entorno regulatorio de una economía a través del tiempo. El indicador 1.2 captura el crecimiento promedio diferencial de las exportaciones e importaciones y sus componentes a nivel de firma producto destino (en concreto, diferencia entre flujos tratados y flujos no tratados)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Calificación en el ranking "Distancia a la frontera en comercio transfronterizo" del Doing Business	Puntaje	53.00	2016	P	63.00
					P(a)	63.00
					A	

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.1	Crecimiento del comercio	Porcentaje	0.00	2017	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: .

Observation: Unidad de medida: Ranking “Comercio Transfronterizo”, Doing Business Report, Banco Mundial. Se suman indicadores de cumplimientos fronterizos y documentales. Nota: Dadas las limitaciones de datos, estos son los indicadores que se utilizarán por el momento. Se espera ajustarlos una vez que se tenga acceso a información transaccional del comercio y tiempos de la base de datos de Aduana/AFIP-VUCE.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Horas promedio para importar de empresas beneficiarias	Horas	636.00	2016	P		200.00
					P(a)		200.00
					A		

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Observations: Unidad de medida: Ranking “Comercio Transfronterizo”, Doing Business Report, Banco Mundial. Se suman indicadores de cumplimientos fronterizos y documentales. Nota: Dadas las limitaciones de datos, estos son los indicadores que se utilizarán por el momento. Se espera ajustarlos una vez que se tenga acceso a información transaccional del comercio y tiempos de la base de datos de Aduana/AFIP-VUCE.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Horas promedio para exportar de empresas beneficiarias	Horas	51.00	2016	P		30.00
					P(a)		30.00
					A		

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Observations: Unidad de medida: Ranking “Comercio Transfronterizo”, Doing Business Report, Banco Mundial. Se suman indicadores de cumplimientos fronterizos y documentales. Nota: Dadas las limitaciones de datos, estos son los indicadores que se utilizarán por el momento. Se espera ajustarlos una vez que se tenga acceso a información transaccional del comercio y tiempos de la base de datos de Aduana/AFIP-VUCE.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: .

Observation: Se busca una mayor inserción internacional competitiva del sector productivo, particularmente de las PYME.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Crecimiento del número de PYME exportadoras en mercados dados (pares producto-destino)	Porcentaje	0.00	2017	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Aduana/AFIP-VUCE

Observations: Se busca una mayor inserción internacional competitiva del sector productivo, particularmente de las PYME.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: .

Observation: Como parte del programa, se prevé levantar línea de base y meta a través de encuestas sobre percepción general de eficiencia de procesos de las entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Percepción general sobre eficiencia de entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes	Puntaje	0.00	2017	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

Details

Means of verification: Encuestas

Observations: Como parte del programa, se prevé levantar línea de base y meta a través de encuestas sobre percepción general de eficiencia de procesos de las entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 - Diseño de la VUCEA y reingeniería de procesos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Relevamiento institucional presentado (incluyendo: principales instituciones participantes, sus roles y funciones previstas, y los procesos posibles de incorporarse a la nueva plataforma)	relevamiento	P	1	1	1,434,125	1,434,125
			P(a)	1	1	1,434,125	144,696
			A	1	1	144,696	144,696
1.2	Análisis de brechas relevadas y propuestas de mejora presentado (GAP análisis COMEX realizado)	análisis	P	0	1		1,434,125
			P(a)		5		2,832,016
			A	0	0	0	0
1.3	Diseño de Integración entre sistemas, VUCEA y todas las entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web presentado (diseño de VUCE core realizado)	Diseño	P		1	416,666	2,099,500
			P(a)		5	416,666	2,258,100
			A		0	0	0
1.4	Organismos integrados a VUCE con trámites digitalizados	formularios	P		15		717,062.5
			P(a)		15		450,000.5
			A		0		0
1.5	Diseño de adecuaciones y homologaciones normativas y procesales de todas las instituciones involucradas presentado al Comité	documento	P	0	1	30,000	2,151,187.5
			P(a)		5	30,000	2,151,187.5
			A	1	1	11,977	11,977

Component Nbr. 2 Componente 2 - Implementación de la VUCEA y armonización tecnológica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Equipamiento Plataforma tecnológica, software y hardware para interconexión de la VUCEA adquirido	equipamiento	P		1		31,200,000
			P(a)		1		31,200,000
			A		0		0
2.2	Equipamiento Plataforma tecnológica, software y hardware para interconexión de terceros organismos adquirido	Equipamiento	P		1		22,042,500
			P(a)		1		22,042,500
			A		0		0
2.3	Fases funcionales del portal y sistema VUCEA en funcionamiento	Fases	P		1		13,737,500
			P(a)		1		13,737,500
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3 - Gestión del cambio y coordinación interinstitucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
3.1	Plan de capacitación diseñado y presentado	plan	P	1	4	45,358	541,200
			P(a)	1	4	45,358	541,200
			A	1	1	0	0
3.2	Número de cursos de capacitación realizados (Los cursos estarán dirigidos a agentes de aduanas, agentes navieros, funcionarios, importadores y exportadores a través de las cámaras y asociaciones)	cursos	P	1	4	45,100	1,141,200
			P(a)	1	4	45,100	1,141,200
			A	1	1	0	0
3.3	Centro de atención VUCE en operación	Centro	P		1		1,351,200
			P(a)		1		1,351,200
			A		0		0
3.4	Actividades de difusión de VUCE realizada	Actividades	P	1	5	108,240	541,200
			P(a)	1	5	108,240	541,200
			A	1	1	43,462	43,462
3.5	Gestión del Cambio - Plan de mejora de RRHH diseñado	Plan	P		3		541,200
			P(a)		3		541,200
			A		0		0
3.6	Sistema de calidad implementado	Sistema	P		1		900,000
			P(a)		1		900,000
			A		0		0

Component Nbr. 4 Componente 4 - Gestión de interoperabilidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
4.1	Acuerdos de cooperación interinstitucional con actores privados firmados	acuerdos	P	0	50		100,000
			P(a)	0	50		100,000
			A	2	2		0
4.2	Acuerdos de cooperación interinstitucional internacionales firmados	Integration agreements and coo	P	0	5		100,000
			P(a)	0	5		100,000
			A	0	0		0
4.3	Acuerdos de cooperación interinstitucional con actores públicos firmados	Acuerdos	P	0	5		100,000
			P(a)	0	5		100,000
			A	0	0		0

Other Cost

	Gestión del Programa	P			393,263	1,868,000
		P(a)			393,263	1,868,000
		A			52,007	52,007

Total Cost

	Total Cost	P			2,472,752	82,000,000
		P(a)			2,472,752	82,000,000
		A			252,142	252,142

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Análisis de brechas relevadas y propuestas de mejora presentado (GAP análisis COMEX realizado)	Modify Output	Necesidad de contar con mediciones anuales que reflejen la evolución del Proyecto, en lugar de una única medición.	03/12/2018	02/19/2018
Output	Diseño de Integración entre sistemas, VUCEA y todas las entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web presentado (diseño de VUCE core realizado)	Modify Output	Necesidad de contar con mediciones anuales que reflejen la evolución del Proyecto, en lugar de una única medición.	03/12/2018	02/19/2018
Output	Diseño de adecuaciones y homologaciones normativas y procesales de todas las instituciones involucradas presentado al Comité	Modify Output	Necesidad de contar con mediciones anuales que reflejen la evolución del Proyecto, en lugar de una única medición.	03/12/2018	02/19/2018
Impact	Crecimiento del comercio	Modify Impact Indicator	Se calculará la línea de base.	03/13/2018	02/19/2018
Output	Portal Etapa 4: Diseño de interoperabilidad	Modify Milestone	La unidad de medida no estaba agregada.	03/13/2018	02/19/2018
Output	Sistema de calidad implementado	Modify Output	La unidad de medida no estaba agregada.	03/13/2018	02/19/2018
Outcome	Crecimiento del número de PYME exportadoras en mercados dados (pares producto-destino)	Modify Outcome Indicator	Se calculará línea de base.	03/13/2018	02/19/2018
Outcome	Percepción general sobre eficiencia de entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes	Modify Outcome Indicator	Se calculará línea de base.	03/13/2018	02/19/2018
Output	Diseño de Integración entre sistemas, VUCEA y todas las entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web presentado (diseño de VUCE core realizado)	Modify Output	Replanificación del progreso financiero de acuerdo a la cuota presupuestaria otorgada al préstamo.	03/14/2018	02/19/2018
Output	Organismos integrados a VUCE con trámites digitalizados	Modify Output	Replanificación del progreso financiero de acuerdo a la cuota presupuestaria otorgada al préstamo.	03/14/2018	02/19/2018
