

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1113	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/18/18
<b>Last Update</b>	03/28/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Rural Land Regularization and Titling Program	<b>Loan Number</b>	3722/BL-BO
<b>Executing Agency</b>	Instituto Nacional de Reforma Agraria	<b>Sector/Subsector</b>	AG-ADM - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	LIMA, EIRIVELTHON SANTOS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	A	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Unsatisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Aunque las actividades a ser financiadas por el programa han iniciado (desde enero 2016, considerando el financiamiento retroactivo), el organismo ejecutor no ha iniciado la ejecución del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del programa, el que incluye medidas necesarias para el cumplimiento de las actividades del programa con las políticas de salvaguarda del BID.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	14,632,985	24.39%	45,367,015
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>14,632,985</b>	<b>24.39%</b>	<b>45,367,015</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

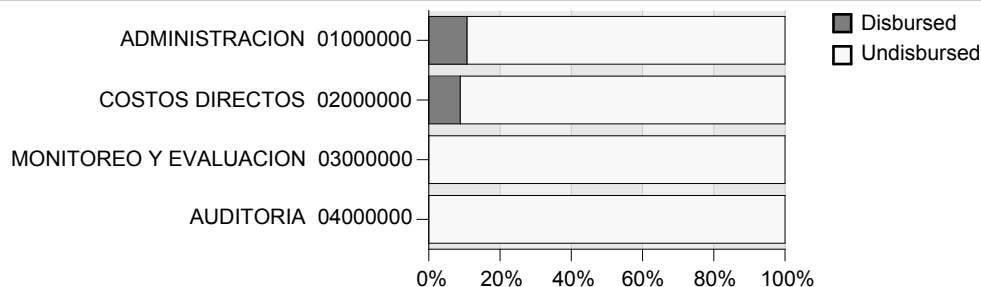

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

**Observation:** Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	P	974.00	974.00
					P(a)	974.00	974.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Impact Nbr. 1:** 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

**Observation:** Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	P	1,075.00	1,075.00
					P(a)	1,075.00	1,075.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** 1. Aumento de la inversión Productiva

**Observation:** Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P	241.00	241.00
					P(a)	241.00	241.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 1:** 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

**Observation:** Medio de Verificación: Sistema de Monitoreo y Seguimiento del INRA

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 2:** 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

**Observation:** Medio de Verificación: Sistema monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P	25.00	25.00
					P(a)	25.00	25.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 3:** 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

**Observation:** Medio de verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P	3.00	3.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P(a)	3.00	3.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr.** 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDRR

**Observation:** Medio de Verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DDRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.00	2016	P	100.00	100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	70,000	1,300,000	10,000,000	74,938,787
			P(a)	70,000	1,300,000	10,000,000	74,938,786.86
			A	72,346	72,346	10,112,183.86	10,112,183.86
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P	90	900	10,000	70,000
			P(a)	90	900	10,000	70,000
			A	85	85	6,458.14	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1		150,000
			P(a)		1		150,000
			A		0		0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P		160		150,000
			P(a)		160		150,000
			A		0		0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1		50,000
			P(a)		1		50,000
			A		0		0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)		1		21,600
			A		0		0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P		900		86,400
			P(a)		900		86,400
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1	50,000	693,054
			P(a)		1	50,000	693,054
			A		0	244,810	244,810
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P		9		131,748
			P(a)		9		131,748
			A		0		0
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1		800,000
			P(a)		1		800,000
			A		0		0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P		1		3,852,604
			P(a)		1		3,852,604
			A		0		0
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)		1		15,826
			A		0		0
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	80,000	600,000
			P(a)	1	5	80,000	600,000
			A	1	1	147,989	147,989
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P		5,000		1,900,000
			P(a)		5,000		1,900,000
			A		0		0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P		3		6,044,172
			P(a)		3		6,044,172
			A		0		0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1		2,376,514
			P(a)		1		2,376,514
			A		0		0

## Other Cost

	Administración	P			2,000,000	7,239,295
		P(a)			2,000,000	7,239,294.8
		A			1,438,941.8	1,438,941.8
	Monitoreo y evaluación	P				580,000
		P(a)				580,000.34
		A				0
	Auditoría	P				300,000
		P(a)				300,000
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			12,140,000	100,000,000
		P(a)			12,140,000	100,000,000
		A			11,950,382.8	11,950,382.8

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Modify Output	Luego de la planificación para las próximas gestiones, de efectuó un ajuste al presupuesto financiero.	03/19/2018	02/23/2018
