

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1252	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/29/18
<b>Last Update</b>	03/16/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/12/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	National Prog. to Support the Adm. and Fiscal Manag Brazilian Municípios-PNAFM	<b>Loan Number</b>	2248/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, MINISTERIO DA FAZENDA, MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	<b>Sector/Subsector</b>	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
<b>Team Leader</b>	BARROSO TOSTES NETO, JOSE	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1252	150,000,000	150,000,000	16,600,000	0	166,600,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	0
Aggregated	150,000,000	150,000,000	16,600,000	0	166,600,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

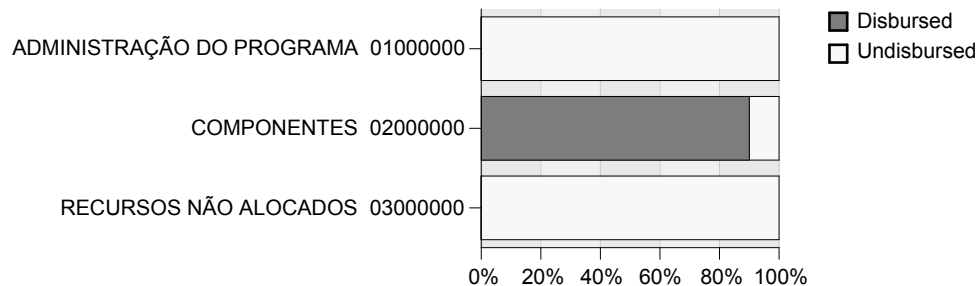

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** R1 - Projetos de subempréstimos municipais contratados.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	subempréstimo contratados.	contratos	0.00	2009	P									6.00
					P(a)	2.00	4.00					35.00	35.00	35.00
					A	5.00	8.00	22.00				28.00	28.00	28.00
Details														
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No								

**Outcome Nbr. 2:** R2 -Recursos financeiros comprometidos mediante contratos de subempréstimos

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1	Volume de recursos comprometidos	US\$ milhões	0.00	2009	P							
					P(a)							38,500,000.00
					A		93,677,633.00	147,910,339.00			111,510,000.00	37,044,138.20
Details												
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

**Outcome Nbr. 3:** R3 - Eventos de difusão de melhores práticas incorporados em Banco de Mejores practicas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
3.1	Quantidade de eventos de avaliação e difusão incluídos no Banco de Melhores Práticas.	eventos	0.00	2009	P									2.00
					P(a)						18.00		18.00	
					A	2.00	2.00	8.00	12.00	13.00	15.00	18.00		18.00
Details														
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No								

**Outcome Nbr. 4:** R4 - Uso do Ensino a Distância (EAD) ampliado.

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** R1 - Projetos de subempréstimos municipais contratados.

**Observation:**

Details			
<b>Means of verification:</b> Relatório Semestral de Progresso			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 2:** R2 -Recursos financeiros comprometidos mediante contratos de subempréstimos

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.1	Volume de recursos comprometidos	US\$ milhões	0.00	2009	P		106.80
					P(a)	38,500,000.00	38,500,000.00
					A	37,044,138.20	37,044,138.20
Details							
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 3:** R3 - Eventos de difusão de melhores práticas incorporados en Banco de Mejores practicas.

**Observation:**

Details			
<b>Means of verification:</b> Relatório Semestral de Progresso			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 4:** R4 - Uso do Ensino a Distância (EAD) ampliado.

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Replicações dos cursos pilotos de EAD desenvolvidas.	replicações	0.00	2009	P									2.00
					P(a)									2.00
					A	2.00		4.00		4.00				4.00

#### Details

**Means of verification:** Relatório Semestral de Progresso

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 5:** R5 - Potencial de receita própria dos municípios participantes da 2ª fase do Programa identificados.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
5.1	município com potencial de receita própria identificados.	Subnational governments (#)	0.00	2009	P									50.00
					P(a)									11.00
					A		5.00	18.00						18.00

#### Details

**Means of verification:** Relatório Semestral de Progresso

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 6:** R6 - Linha de base para os 4 eixos estruturadores do Programa definida: atenção ao cidadão, administração tributária, gestão do cadastro de contribuintes e administração orçamentária e financeira es medida de maneira independente por los municípios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
6.1	municípios participante do Programa com diagnóstico de linha de base dos eixos estruturadores realizado.	Subnational governments (#)	0.00	2009	P									50.00
					P(a)									11.00
					A	5.00	8.00	18.00						18.00

#### Details

**Means of verification:** Relatório Semestral de Progresso

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 COMPONENTE I - COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NACIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Projetos de fortalecimento institucional municipal apoiados em sua elaboração e revisão	projetos	P		78		276,559.86
			P(a)	0	149	0	276,559.86
			A	0	149	0	276,559.86
1.2	Governo - Municípios apoiados para contratação de operações de crédito	Subnational governments (#)	P		12		195,123.17
			P(a)	0	49	0	195,123.17
			A	0	49		195,123.17
1.3	Governo - Municípios apoiados na gestão dos respectivos projetos, envolvendo monitoramento e avaliação / Indicador: visitas técnicas de supervisão realizadas duranre a 2a fase do PNAFM	Subnational governments (#)	P		30		2,058,865.63
			P(a)	40	255	0	2,058,896.5
			A	40	255	3,650,576.62	5,709,473.12
1.4	Banco de melhores práticas na área fiscal criado. / Indicador: eventos realizados para a difusão do Banco de Melhores práticas	eventos	P		1		1,138,930
			P(a)	18	68	0	1,138,930
			A	18	68	0	1,138,930
1.5	Convênios e acordos de cooperação celebrados, tanto no âmbito nacional quanto no internacional	convênios	P		1		239,379.84
			P(a)	1	2	0	279,276.56
			A	1	2	0	279,276.56
1.6	Conferência técnica e estudos, no âmbito nacional e internacional, realizados.	conferência	P		1		433,068.35
			P(a)	0	15	0	433,068
			A	0	15	0	433,068
1.7	Plano de Comunicação interna e externa elaborado, incluindo mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade.	plano	P		1		810,129.2
			P(a)	0	1	359,901.09	1,170,030.98
			A	0	1	359,901.09	1,170,030.98
1.8	Curso de EAD implantados.	cursos	P		2		9,389,427.02
			P(a)	0	9	2,813,735.29	8,208,386.52
			A	0	9	2,813,735.29	8,208,386.52
1.9	Reunião de avaliação das ações do Programa realizadas.	reuniões	P		1		888,677.84
			P(a)	1	47	143,151	888,486.07
			A	1	47	143,151	888,486.07

## Component Nbr. 2 COMPONENTE II - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Projetos municipais implantados.	projetos	P		10		142,500,268.23
			P(a)	13	45	23,157,192.62	142,500,000
			A	13	45	27,982,832	147,325,639.38

## Other Cost

	Administração do Programa.	P				1,333,330
		P(a)			1,600,000	1,600,000
		A			0	0
	Imprevistos.	P				5,900,000
		P(a)			5,900,000	5,900,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P				166,333,790.15
		P(a)			34,950,196	166,600,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			34,950,196	166,600,000
--	------------	---	--	--	------------	-------------

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
