

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1067	Chief of Operations Validation Date	03/23/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/25/18
Last Update	03/23/18	Country Representative Validation Date	03/25/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening of the Management for Results of the Sector Health in Dominican Republic	Loan Number	2973/OC-DR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	DISTRUTTI, MARCELLA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1067	146,000,000	146,000,000	0	0	146,000,000	146,000,000	129,984,801.87	89.03%	16,015,198.13
Aggregated	146,000,000	146,000,000	0	0	146,000,000	146,000,000	129,984,801.87	89.03%	16,015,198.13

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

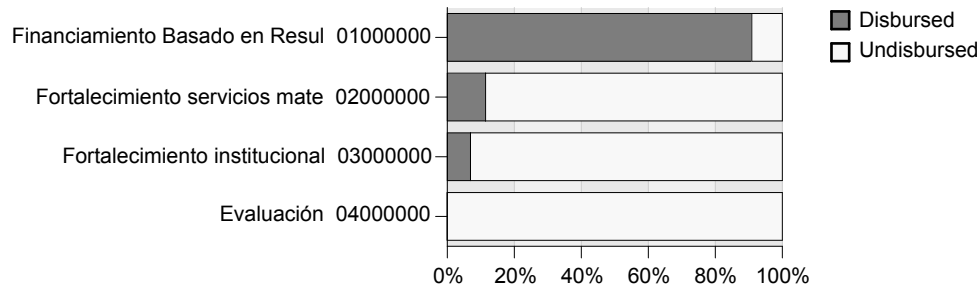

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Acceso de la población pobre a los servicios de salud mejorado y morbi-mortalidad materna e infantil disminuida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2019
1.1	Población pobre I-II (SIUBEN) no cubierta por ningún régimen con acceso garantizado a los servicios de salud primer nivel a través del FBR, en las cinco regiones de salud del Proyecto	Personas	0.00	2013	P		72,025.00		288,100.00	288,100.00
					P(a)		72,025.00		288,100.00	403,304.00
					A		80,955.00		288,100.00	

Details

Means of verification: Reportes de auditorias concurrentes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2019
1.2	Mortalidad materna disminuida en los seis hospitales en los que se implementará el Modelo de Centros de Excelencia CIME Materno Infantil (CEMI)	Porcentaje	155.00	2013	P		8.00		30.00	30.00
					P(a)			8.00	30.00	30.00
					A		0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Formulario EPI-2/Reportes SIGHO

Observations: The baseline will be calculated in 2015

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2019
1.3	Mortalidad infantil disminuida en los hospitales en que se implementará el CEMI	Porcentaje	24.00	2013	P		8.00		30.00	30.00
					P(a)			8.00	30.00	30.00
					A		0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Formulario EPI-2/Reportes del SIGHO

Observations: The baseline will be calculated in 2015

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes de la semana 15 de embarazo en las cinco regiones del Proyecto, aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	Porcentaje de mujeres	Porcentaje	2.98	2013	P		15.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		15.00	30.00	50.00	70.00	70.00
					A		15.00	28.76	62.70		

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mujeres puérperas referidas del hospital a su unidad de atención primaria correspondiente con la documentación adecuada incluida en los archivos clínicos del centro de salud en las cinco regiones del Proyecto, aumentado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
2.1	Porcentaje de mujeres	Porcentaje	0.79	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	70.00	70.00
					A		10.00	29.63	67.29		

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
3.1	Porcentaje de menores	Porcentaje	6.79	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	100.00	100.00
					A		10.00	50.85	100.00		

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: Niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
4.1	Porcentaje de niños	Porcentaje	1.80	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	100.00	100.00
					A		10.00	32.21	100.00		

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 5: Niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
5.1	Porcentaje de niños	Porcentaje	0.54	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	70.00	70.00
					A		10.00	18.73	64.98		

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 6: Individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia documentado en centro de primer nivel en las cinco regiones del proyecto, aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
6.1	Porcentaje de individuos	Porcentaje	0.81	2013	P		10.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	100.00	100.00
					A		10.00	30.85	100.00		

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 7: Mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
7.1	Hombres mayores de 18 años tamizados	Porcentaje	12.44	2013	P		10.00	30.00	50.00	50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00
					A		10.00	46.01	50.21	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
7.2	Mujeres mayores de 18 años tamizadas	Porcentaje	5.68	2013	P		10.00	30.00	50.00	50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00
					A		10.00	0.00	76.15	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 8: Diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
8.1	Hombres diagnosticados	Porcentaje	2.51	2013	P		10.00	30.00	50.00	50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00
					A		10.00	15.12	37.33	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
8.2	Mujeres diagnosticadas	Porcentaje	1.16	2013	P		10.00	50.00		50.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

8.2	Mujeres diagnosticadas	Porcentaje	1.16	2013	P(a)		10.00		50.00	80.00	80.00
					A		10.00		71.40		

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 9: Mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado .

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
9.1	Hombres mayores de 18 años	Porcentaje	0.20	2013	P		10.00	30.00	50.00	50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00
					A		0.00	20.91	43.50	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
9.2	Mujeres mayores de 18 años	Porcentaje	0.06	2013	P		10.00		50.00	50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00
					A		0.00	0.00	72.70	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 10: Diagnosticados con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
10.1	Hombres diagnosticados	Porcentaje	1.77	2013	P		10.00		50.00	50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00
					A		0.00	12.94	37.14	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity				No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
10.2	Mujeres diagnosticadas	Porcentaje	0.67	2013	P		10.00		50.00		50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00	80.00
					A		0.00	0.00	72.13		
Details											
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No			

Outcome Nbr. 11: Población SIUBEN I y II con carnets de afiliación al régimen subsidiado en las cinco regiones del proyecto, aumentado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
11.1	Porcentaje de población	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		80.00		80.00
					P(a)		30.00	69.50	0.00	80.00	80.00
					A		0.00	0.00	0.00		
Details											
Means of verification: Informes de empresa encargada de elaboración y entrega de carnets / reportes de auditorías concurrentes											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 12: Dependientes de afiliados al régimen subsidiado que poseen información de acta de nacimiento en la base de datos de afiliados del SENASA en las cinco regiones del proyecto, aumentado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
12.1	Cantidad de dependientes	Dependientes	0.00	2013	P		50,000.00		120,000.00		120,000.00
					P(a)		50,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
					A		0.00	0.00	0.00		
Details											
Means of verification: Reporte de Base de Datos del SENASA											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 13: Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHO) implementado y en funcionamiento en los hospitales en que se implementará el CEMI.

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
13.1	Hospitales con SIGHO implementado y en funcionamiento	Sistema	0.00	2013	P		3.00		9.00		12.00
					P(a)		0.00		9.00	3.00	12.00
					A		0.00		9.00		

Details

Means of verification: Reportes anuales de evaluación emitidos por la Dirección de Tecnología de Información del MISPAS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 14: Muertes maternas e incidentes auditados por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
14.1	Porcentaje de muertes maternas e incidentes auditados	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00		95.00
					P(a)		30.00		95.00	95.00	95.00
					A		44.00		28.00		

Details

Means of verification: Actas de las sesiones del Comité

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 15: Muertes neonatales auditadas por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
15.1	Porcentaje de las muertes neonatales auditadas	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00		95.00
					P(a)		30.00		95.00	95.00	95.00
					A		1.00		0.00		

Details

Means of verification: Actas de las sesiones del Comité

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 16: Mujeres que reciben tratamiento activo de la tercera etapa del parto en los hospitales en que se implementará el CEMI, aumentado .

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

16.1	Porcentaje de mujeres que reciben tratamiento	Porcentaje	0.00	2013	P		25.00		90.00		90.00
					P(a)		0.00	25.00	90.00	90.00	90.00
					A		59.00	0.00	82.00		

Details

Means of verification: Reportes de Descripción de Parto obtenido en la primera etapa del registro físico de cada paciente, una vez implementado el SIGHO

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	Beneficiaries (#)	P	1,448,100	1,448,100	13,273,674.34	130,000,000
			P(a)	1,448,100	1,448,100	14,541,483	130,053,186.12
			A	1,448,100	1,448,100	10,379,049.52	122,200,350.24

Component Nbr. 2 II. Calidad de los servicios de salud materno infantil fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Hospitales	P	5	10		272,000
			P(a)	4	4	49,541.18	365,356.97
			A	0	0	25,055.91	219,856.97
2.2	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P	6	6	1,678,100	3,178,100
			P(a)	1	4	732,454.66	3,701,577.19
			A	0	0	10,954.29	10,954.29
2.3	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		1,130,000
			P(a)	2	12	805,666	4,283,225.62
			A	0	0	40,680.62	40,680.62
2.4	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Personas	P		200	23,444.44	2,415,999.98
			P(a)	50	205	59,914	468,158.14
			A	50	205	195,181.44	429,158.14
2.5	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Personas	P		150	72,316.67	539,000
			P(a)	150	150	60,000	43,563.76
			A	0	0	13,563.76	13,563.76
2.6	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Beneficiarias	P	20	50	517,222.23	1,122,000
			P(a)	0	50	73,787	50,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III. Función de rectoría del sector salud fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Plan	P	0	1		160,000
			P(a)	0	1	362,500	408,441.01
			A	0	0	37,021.47	38,231.47
3.2	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Unidad	P	0	1		150,000
			P(a)	0	1	73,624	987,686.87
			A	0	0	48,135.16	139,436.62
3.3	Fortalecimiento de la Dirección de Habilitación	Normas	P	0	1		30,000
			P(a)	1	2	212,000	307,598.24
			A	0	1	59,098.24	59,098.24
3.4	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Normas	P	0	1		70,000
			P(a)	0	2	0	80,100
			A	0	0	0	0
3.5	Expediente Integrado de Salud implementado	Sistema	P	1	1		3,000,000
			P(a)	0	1	1,000,000	1,527,080.73
			A	0	0	36,391.79	65,080.73
3.6	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	Red	P		0		0
			P(a)		1		1,002,860
			A	0	0	2,860	2,860

Component Nbr. 4 IV. Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
4.1	Evaluación de impacto del Programa	Evaluación	P	0	1		50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Contratación personal UCP	P			803,602.02	2,525,702.03
		P(a)			300,000	965,104.11
		A			409,740.36	785,104.11
	Gerentes de Campo FBR (Componente I)	P			113,700	400,300
		P(a)			200,000	251,161.39
		A			106,748.9	251,161.39
	Gerentes de Campo CEMI (Componente II)	P			93,600	351,000
		P(a)			343,201.14	839,721.01
		A			159,636.49	464,721.01
	Gastos operativos visitas a regiones de salud para la implementación del FBR (Componente I)	P			44,500	178,000
		P(a)			100,000	104,277
		A			14,405.58	89,277
	Gastos operativos visitas a hospitales (Componente II)	P			30,000	120,000
		P(a)			150,000	135,349.41
		A			16,644.18	85,349.41
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del FBR (Componente I)	P				60,000
		P(a)			0	62,468.73
		A			0	62,468.73
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del CEMI (Componente II)	P				60,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del CEMI (Componente II)	P(a)			0	39,000
		A			0	39,000
	Readecuación física oficina UCP	P				0
		P(a)			450,897	274,083.7
		A			274,083.7	274,083.7

Total Cost

	Total Cost	P			16,733,057.69	146,000,000
		P(a)			19,515,067.98	146,000,000
		A			11,829,251.41	125,270,436.43

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Modify Output	No se podrán certificar los 12 hospitales originalmente planificados, porque la adecuación física que está llevando a cabo el Ministerio, no se ha terminado en plazo y no hay todavía fecha de entrega final.	02/26/2018	02/12/2018
Output	Fortalecimiento de la Dirección de Habilitación	Modify Output	Se ha ampliado el alcance previo de actualización de normas, añadiendo equipamiento.	02/26/2018	02/12/2018
Output	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Modify Output	Desde la separación de funcione y creación de la DDESS, la función de la Unidad se transfiere.	02/26/2018	02/12/2018
Output	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Modify Output	Debido al monto de las obras y necesidades de inversión se ha reducido la meta.	03/06/2018	02/12/2018
Output	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Modify Output	Se trata de un piloto que se llevara a cabo con el numero de 50 embarazadas	03/06/2018	02/12/2018
Output	Equipamiento	Create Milestone	Se ha ampliado el alcance previo de actualización de normas, añadiendo equipamiento.	03/06/2018	02/12/2018
Output	Normas	Create Milestone	Se ha ampliado el alcance previo de actualización de normas, añadiendo equipamiento.	03/06/2018	02/12/2018
Output	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Modify Output	La separación de funciones ha incrementado el alcance y prioridad de este producto	03/06/2018	02/12/2018
Output	Red nacional de sangre funcionando	Create Output	Este producto se ha identificado para incidir directamente en los Resultados de muerte mater-infantil.	03/06/2018	02/12/2018
Output	Evaluación de impacto del Programa	Modify Output	La evaluación de impacto no disponía de asignación presupuestaria.	03/06/2018	02/12/2018
Output	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Modify Output	Se trata de un piloto que se llevara a cabo con el numero de 50 embarazadas.	03/06/2018	02/01/2018
Output	Expediente Integrado de Salud implementado	Modify Output	El nombre del sistema ha cambiado ha cambiado oficialmente.	03/12/2018	03/01/2018
Output	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	Modify Output	La Red es una prioridad del gobierno para los recursos que se han reasignado.	03/12/2018	03/01/2018
Output	Expediente Integrado de Salud implementado	Modify Output	El sistema sera instalado en 2019.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Fortalecimiento de la Dirección de Habilitación	Modify Output	Se ha ampliado el alcance previo de actualización de normas, añadiendo equipamiento.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Modify Output	Se ha ampliado el alcance del producto.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Modify Output	La separación de funciones ha incrementado el alcance y prioridad de este producto.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Modify Output	Se cumple con la EOP planificada.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Modify Output	Cambio de metodología; la capacitacion se esta llevando a cabo con profesionales de los servicios	03/19/2018	03/01/2018
Output	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Modify Output	Actualizacion de la meta financiera, una vez firmado el contrato con la consultoria.	03/19/2018	03/01/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Normas	Delete Milestone	No se considero necesario incluir milestones porque seran apenas normas.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Equipamiento	Delete Milestone	No se considero necesario incluir milestones porque seran apenas normas.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Modify Output	Se incorporaron en la planificación 4 entregables para este producto: (i) Plan de desarrollo normativo de la Red Integrada de Servicios de Salud del Distrito Nacional Este elaborado ; (ii) Separación de funciones sistematizada; (iii) Rediseño de la arquitectura del Ministerio de Salud; (iv) Diagramación de instrumentos normativos.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Modify Output	Por el remanente de presupuesto disponible, se han ampliado las transferencias mensuales fijas y variables hasta el Q1 de 2019.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	Modify Output	Los 3 hospitales de 2018 serán dotados con incineradora. El resto es para 2019 por el retraso en levantamiento de necesidades elaborado por el SNS.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Modify Output	Debido al monto de las obras y necesidades de inversión se ha reducido la meta.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	Modify Output	Por el remanente de presupuesto disponible, se han ampliado las transferencias mensuales fijas y variables hasta el Q1 de 2019.	03/19/2018	03/01/2018
Output	Estudio de análisis de factibilidad de la implementación de una tarjeta electrónica de salud vinculada al Sistema de Gestión Clínica terminado	Modify Output	La tarjeta electrónica ha quedado descartada por el Ministerio como opción tecnológica.	03/19/2018	03/19/2018
Output	Estudio de análisis de factibilidad de la implementación de una tarjeta electrónica de salud vinculada al Sistema de Gestión Clínica terminado	Modify Output	La tarjeta electrónica ha quedado descartada por el Ministerio como opción tecnológica.	03/19/2018	03/19/2018
Outcome	Población SIUBEN I y II con carnets de afiliación al régimen subsidiado en las cinco regiones del proyecto, aumentado.	Modify Outcome	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/21/2018	03/19/2018
Impact	Población pobre I-II (SIUBEN) no cubierta por ningún régimen con acceso garantizado a los servicios de salud primer nivel a través del FBR, en las cinco regiones de salud del Proyecto	Modify Impact Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Hombres mayores de 18 años tamizados	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Porcentaje de individuos	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Porcentaje de menores	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Porcentaje de mujeres	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Porcentaje de niños	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Hombres diagnosticados	Modify Outcome	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Indicator			
Outcome	Hombres diagnosticados	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Hombres mayores de 18 años	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Mujeres diagnosticadas	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Mujeres mayores de 18 años	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Outcome	Mujeres mayores de 18 años tamizadas	Modify Outcome Indicator	Ajustado de acuerdo al ejercicio de reprogramación de la operación de febrero 2018.	03/23/2018	03/19/2018
Output	Estudio de análisis de factibilidad de la implementación de una tarjeta electrónica de salud vinculada al Sistema de Gestión Clínica terminado	Modify Output	El gobierno decidió avanzar con la implementación de un sistema de electrocic medical record sin realizar un estudio de factibilidad.	03/23/2018	03/19/2018
