

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1064	Chief of Operations Validation Date	03/31/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/03/17
Last Update	03/30/17	Country Representative Validation Date	04/06/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program	Loan Number	2719/BL-BO, 2719/BL-BO-1, 2719/BL-BO-2
Executing Agency	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	ALVARADO,NOHORA ROCIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1064	20,000,000	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000	20,000,000	15,359,500	76.80%	4,640,500
Aggregated	20,000,000	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000	20,000,000	15,359,500	76.80%	4,640,500

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

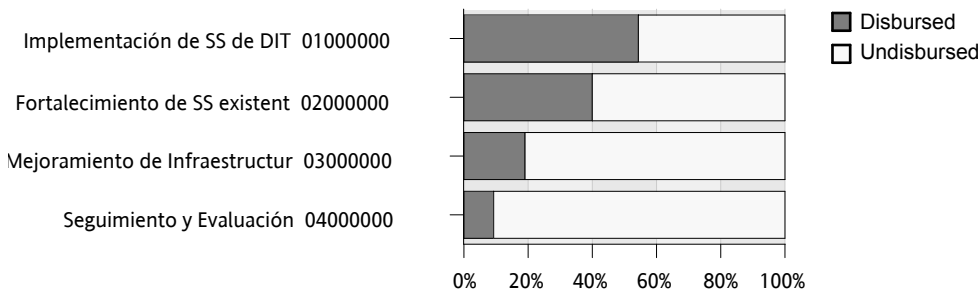

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Desarrollo cognitivo y físico de niños/as bolivianos menores de 4 años.

Observation: Los indicadores son desagregados por sexo y culturalmente adecuados en cuanto a su instrumento de medición.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.0	Niños menores de 4 años rezagados en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje según modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.1	Niñas menores de 4 años rezagadas en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje según modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.2	Niños menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	%	25.91	2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
0.3	Niñas menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	%	25.88	2014	P		
					P(a)		
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.

Pro-Gender

Yes

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados	Beneficiaries (#)	0.0	2012	P	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00		23,600.00
					P(a)	0.00	0.00		14,600.00	14,600.00		23,600.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador será desagregado por sexo.

Salas de estimulación: 9000 (40 equipos*225), diferentes niños/as atendidos cada año de ejecución.

Visitas comunitarias: 5600 (140 educadores*40), mismos niños/as atendidos cada año de ejecución, solo cuentan una

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No							
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Boys				P							
					P(a)							
					A							
	Girls				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							
	Men				P							
					P(a)							
					A							
	Region				P							
					P(a)							
					A							
	Rural				P							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Rural				P(a)							
					A							
	Urban				P							
					P(a)							
					A							
					P							
	Women				P(a)							
					A							
					P							
					P(a)							
	Women-owned/led firms				A							
					P							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.	Beneficiarios	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00		4,625.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00		4,625.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador será desagregado por sexo.

Todos los niños nacidos en instituciones de salud y al menos el 25% de los niños que van a participar en las modalidades DIT son registrados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.1	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados	Tasa		2012	P			40.00	40.00			40.00
					P(a)				40.00	40.00		40.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Costeo y dimensionamiento de brigadas prevé 40 niños/ educador y semana en brigada móvil

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.2	Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa		2012	P			7.00	7.00	7.00		7.00
					P(a)				7.00	7.00		7.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Número de niños/as menores de 2 años por educador/a en centros infantiles. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles actuales en Bo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.3	Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa		2012	P			11.00	11.00	11.00		11.00
					P(a)				11.00	11.00		11.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Número de niños/as de 2 a 4 años por educador/a en centros infantiles. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles actuales en Bolivi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.4	Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	Porcentaje		2012	P	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00		75.00
					P(a)	0.00	0.00		25.00	50.00		75.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador será desagregado por sexo. Incluye personal existente actualmente (cuidadores comunitarios).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	1.1.1 Personal de Centros Infantiles capacitado en currículo de centros infantiles (educadores comunitarios, facilitadores y nutricionistas).	Personas	P	0	520		368,000
			P(a)	41	568	91,113.42	598,916.96
			A	89	568	1,676.38	563,916.96
1.2	1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando (facilitadores y nutricionistas)	Personas	P		250	374,380	5,395,140
			P(a)	110	110	1,224,149	2,630,123.38
			A	99	99	865,259.27	1,036,661.38
1.3	1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en Salas de Estimulación Temprana - rezago	Personas	P	60	60	537,000	1,620,000
			P(a)	75	75	1,021,055.55	2,443,252.8
			A	74	74	638,957.38	1,443,108.8
1.4	1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos	P	0	2		430,000
			P(a)	2	2	223,320	380,000
			A	0	0	0	180,000
1.5	1.3.2 Convenios intergubernativos suscritos (MS, GAD (SEDES y SEDEGES), GAM)	Convenios	P	0	1	0	30,000
			P(a)	3	36	8,000	35,379.73
			A	0	33	342.03	23,379.73
1.6	1.3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para SEDES y SEDEGES.	Sistema	P	1	1	172,286	292,286
			P(a)	0	1	84,000	15,000
			A	0	0	0	0
1.7	1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Fondo	P	0	1		1,600,579
			P(a)	0	0	0	17,163.55
			A	0	0	0	17,163.55

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Personas	P	0	500		60,000
			P(a)	99	623	18,000	77,000
			A	222	623	0	42,000
2.2	2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando	Personas	P	0	140		2,956,461
			P(a)	180	180	2,006,810	3,058,309
			A	169	169	700,410	1,330,281
2.3	2.3.1 Normas y protocolos sectoriales de DIT revisados y/o complementados	Documentos	P	0	2		330,000
			P(a)	2	2	52,461	277,539
			A	0	0	0	277,539
2.4	2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Personas	P	250	500		68,000
			P(a)	500	1,079	68,000	10,000
			A	1,079	1,079	0	0
2.5	2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada e implementada	Estrategia	P	0	1		150,000
			P(a)	1	1	96,252	125,913
			A	0	0	0	53,748

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Diseños	P		90		303,837.18
			P(a)	19	30	231,764	251,926.07
			A	21	30	214,436.07	251,926.07
3.2	3.2 Centros infantiles readecuados y/o construidos según estándares	Centros	P	40	90	2,165,852.7	4,760,115.82
			P(a)	30	48	2,300,000	7,553,742
			A	0	0	1,271,441	1,271,441
3.3	3.3 Centros Infantiles equipados según estándares	Centros	P		0		0
			P(a)	0	50	241,000	919,432
			A	0	0	0	0
3.4	3.4 Pre-inversión de salas de rezago realizada y aprobada	Diseños	P		40		101,515.56
			P(a)	0	40	0	0.01
			A	0	40	0	0.01
3.5	3.5 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Salas	P	15	40	675,924.44	1,590,410.44
			P(a)	0	40	36,687	820,183
			A	0	40	26,416	813,781

Component Nbr. 4 Seguimiento y evaluación

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Sistema	P	0	1		218,000
			P(a)	0	1	54,500	142,523
			A	0	0	0	0
4.2	Evaluación final contratada	Consultoría	P	1	1	50,000	50,000
			P(a)	0	1	0	15,000
			A	0	0	0	0
4.3	Evaluación de impacto y procesos contratada	Consultoría	P		1	100,000	450,000
			P(a)	0	1	90,802	557,432
			A	0	0	6,475	37,427

Other Cost

	Administración (7%) FPS	P			159,868.9	355,574
		P(a)			200,000	668,170
		A			219,434	290,759
	Auditoría	P			40,000	100,000
		P(a)			50,000	150,000
		A			33,857	56,379
	Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y personal departamental	P			98,415	770,081
		P(a)			347,224	1,252,994.5
		A			243,702	763,091

Total Cost

	Total Cost	P			4,373,727.04	22,000,000
		P(a)			8,445,137.97	22,000,000
		A			4,222,406.13	8,452,602.5

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando (facilitadores y nutricionistas)	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	Evaluación de impacto y procesos contratada	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	1.3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para SEDES y SEDEGES.	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	2.3.1 Normas y protocolos sectoriales de DIT revisados y/o complementados	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	3.3 Centros Infantiles equipados según estándares	Modify Output	Cuando el FPS concluyó los estudios de preinversión, recién se pudo estimar el costo de los Centros Infantiles, por lo que tuvo que ajustarse la cantidad de Centros Infantiles a intervenir con infraestructura y equipamiento.	03/09/2017	07/31/2016
Output	1.1.1 Personal de Centros Infantiles capacitado en currículo de centros infantiles (educadores comunitarios, facilitadores y nutricionistas).	Modify Output	Se precisó de mejor manera el nombre del producto a lograr.	03/09/2017	01/31/2017
Output	1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en Salas de Estimulación Temprana - rezago	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	1.1.1 Personal de Centros Infantiles capacitado en currículo de centros infantiles (educadores comunitarios, facilitadores y nutricionistas).	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Modify Output	El Ministerio de Salud logró que más personal de salud sea capacitado en aplicación de protocolos e instrumentos de DIT.	03/09/2017	01/31/2017
Output	2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Modify Output	El Ministerio de Salud logró que más personal de instituciones sectoriales y locales sea capacitado.	03/09/2017	01/31/2017
Output	3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	3.5 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	1.3.2 Convenios intergubernativos suscritos (MS, GAD (SEDES y	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/10/2017	01/31/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	SEDEGES), GAM)				
Output	1.3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para SEDES y SEDEGES.	Modify Output	Se precisó de mejor manera el nombre del producto a lograr.	03/09/2017	01/31/2017
Output	3.2 Centros infantiles readecuados y/o construidos según estándares	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	3.3 Centros Infantiles equipados según estándares	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/10/2017	01/31/2017
Output	3.2 Centros infantiles readecuados y/o construidos según estándares	Modify Output	Cuando el FPS concluyó los estudios de preinversión, recién se pudo estimar el costo de los Centros Infantiles, por lo que tuvo que ajustarse la cantidad de Centros Infantiles a intervenir con infraestructura y equipamiento.	03/09/2017	07/31/2016
Output	2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
Output	3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Modify Output	Cuando se definió la lista de Centros Infantiles a intervenir, se esperaba que todos éstos sean de propiedad municipal, sin embargo al momento de hacer la verificación muchos de estos centros funcionaban en espacios de terceros, alquilados o prestados, o la construcción era muy precaria. Por tanto, se decidió ampliar el tipo de intervención a ¿construcciones nuevas¿, a través de un contrato modificatorio firmado en noviembre de 2015. Para los construcciones nuevas se realizaron prototipos, en consecuencia se redujo la cantidad de preinversiones.	03/09/2017	07/31/2016
Output	2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada e implementada	Modify Output	La planificación financiera fue ajustada en base al PEOP-POA enviado por el Ejecutor junto al informe de progreso.	03/09/2017	01/31/2017
