

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1094	Chief of Operations Validation Date	03/31/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/18/17
Last Update	03/29/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Public Administration Institutional Reform Program	Loan Number	2653/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	Sector/Subsector	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	GARCIA MEJIA,MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1094	250,000,000	250,000,000	1,456,080	0	251,456,080	250,000,000	247,321,002.73	98.93%	2,678,997.27
Aggregated	250,000,000	250,000,000	1,456,080	0	251,456,080	250,000,000	247,321,002.73	98.93%	2,678,997.27

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

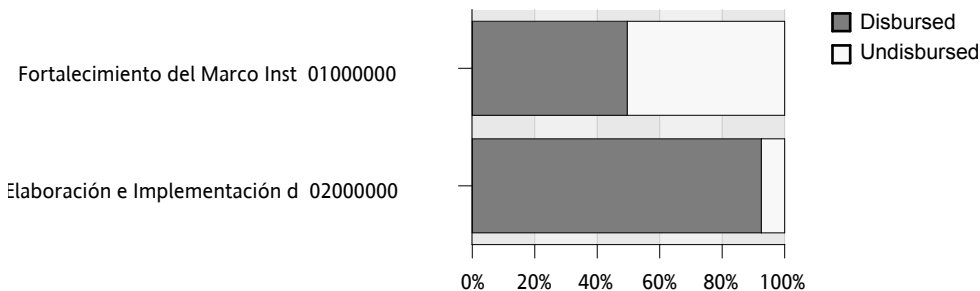

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Nivel del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo	%	36.37	2010	P	66.00
					P(a)	66.00
					A	36.57
Details						
Means of verification: Informe de seguimiento del PNBV 2009-2013, SENPLADES						
Observations: Las meta final referencial						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 2: Incrementar la satisfacción del usuario de los servicios públicos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
2.1	Satisfacción del usuario de los servicios públicos.	%	5.07	2008	P	7.00
					P(a)	7.00
					A	6.67
Details						
Means of verification: Informe de Calidad de los servicios públicos, SENPLADES. ENEMDU-INEC)						
Observations: Las meta final referencial. Este indicador tiene una escala de 1 a 10.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Indice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.4	2008	P	0.60
					P(a)	0.60
					A	0.60

Details

Means of verification: Evaluación SEP PRODEV BID

Observations: Se requiere del apoyo del SEP PRODEV para la actualización de la línea base y de acuerdo a los resultados se actualizará la meta final

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
2.1	Indice de coherencia del Servicio Civil	Indice	0.13	2011	P	0.30
					P(a)	0.30
					A	0.13

Details

Means of verification: Consultoría especializada que aplicará el Marco Analítico para el diagnóstico institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
2.2	Capacidad funcional del Servicio Civil	Indice	0.28	2011	P	0.45
					P(a)	0.45
					A	0.28

Details

Means of verification: Consultoria especializada que aplicará el Marco Analítico para el Diagnostico Institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo)

Observations: Se revisaran la Línea Base y metas establecidas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.3	Mérito del Servicio Civil	Indice	0.33	2011	P	0.55
					P(a)	0.55
					A	0.33
Details						
Means of verification: Consultoria especializada que aplicará el Marco Analítico para el Diagnostico Institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo)						
Observations: Se revisaran la Línea Base y metas establecidas						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	1 Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo	P		1		0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
1.2	5 Personal del Secretariado del Comité y de la Función Ejecutiva capacitado	Funcionarios	P		76		101,000
			P(a)	20	1,230	99,500	516,317.7
			A	275	1,485	99,497.75	516,315.45
1.3	2 Sistemas de Planificación, Inversión Publica y Presupuestos Interoperados	Sistema	P		2		0
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	2	0	0
1.4	9 Plan de mitigación social implementado	Plan	P		1		2,500,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
1.5	11 Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	P	1	2	150,000	300,000
			P(a)	1	2	228,800	301,940
			A	0	1	17,800	90,940
1.6	8 Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema	P		1		1,126,804
			P(a)	0	1	0	1,126,804
			A	0	1	0	1,126,804
1.7	6 Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional	Proyectos	P		13		8,650,000
			P(a)	6	19	5,740,110.26	9,429,981.31
			A	6	19	5,141,086.93	8,830,957.98
1.8	4 Herramientas Complementarias de la Norma Técnica del Modelo R difundidas.	Herramientas	P		2		355,000
			P(a)	0	2	0	101,000
			A	0	2	0	101,000
1.9	10 Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma	P		1		0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	12 PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs	P		11		5,909,920
			P(a)	0	5	4,066,391.25	4,349,247.77
			A	0	5	7,000	289,856.52
2.2	13 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs	P	1	1	1,409,997	199,081,988
			P(a)	1	1	7,844,702.71	221,809,799.07
			A	1	1	9,587,349.76	223,552,446.12
2.3	14 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs	P	1	1	1,683,975	116,756,141
			P(a)	1	1	0	108,020,241
			A	1	1	5,827,405.53	113,847,646.53
2.4	15 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs	P		1		33,138,892
			P(a)	1	1	0	28,770,943
			A	1	1	0	28,770,943
2.5	16 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs	P		1		2,362,061
			P(a)	1	1	0	907,526
			A	1	1	0	907,526
2.6	17 Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs	P	1	1	1,455,983	31,488,527
			P(a)	1	1	890,620	26,555,214
			A	1	1	776,752.87	26,441,346.87
2.7	19 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) de la Agencia de Regulación y Control Minero implementado	PIRI implementado	P		0		0
			P(a)	1	1	174,000	174,000
			A	1	1	128,325	128,325
2.8	21 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) del Ministerio de Trabajo implementado	PIRI implementado	P		0		0
			P(a)	1	1	1,665,873.7	1,665,873.7
			A	1	1	450,373.69	450,373.69
2.9	22 Plan de inversión de reforma institucional (PIRI) de la Agencia de Regulación y Control Sanitario implementado	PIRI implementado	P		0		0
			P(a)	1	1	2,339,715	2,339,715
			A	0	0	0	0

Other Cost

Auditorías Concurrentes	P			55,000	332,000
	P(a)			22,740	198,275
	A			18,340	193,875
Equipo de Gestión	P			168,006	1,103,535
	P(a)			330,750.98	1,097,516
	A			191,820	958,585.02
Evaluación Ex post	P			150,000	150,000
	P(a)			15,000	15,000
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			5,072,961	408,097,064
	P(a)			23,858,695.31	407,873,005.89
	A			22,284,151.53	406,298,462.11

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
