

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1051	Chief of Operations Validation Date	04/04/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/05/18
Last Update	04/04/18	Country Representative Validation Date	05/04/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to Early Childhood Development	Loan Number	2667/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1051	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	5,834,073.62	21.61%	21,165,926.38
Aggregated	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	5,834,073.62	21.61%	21,165,926.38

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

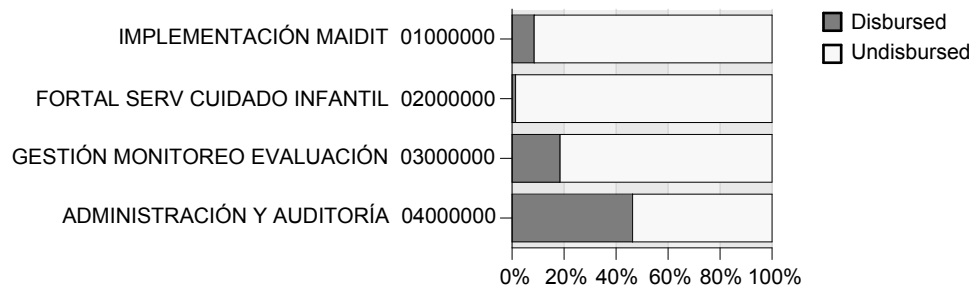

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2019	EOP 2019
1.1	Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.	% niños y niñas	10.00	2011	P			7.00
					P(a)			7.00
					A			
Details								
Means of verification: Exámenes psicomotores y de lenguaje								
Observations: Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano, ampliados.

Observation: Observaciones de indicador 1.1 Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado; 1.2 El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.3 El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.4, 1.5 y 1.6 Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas - porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
0.1	1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as	0.00	2011	P							10.00
					P(a)							10.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
0.1	1.2 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas	0.00	2011	P	5.00						10.00
					P(a)	5.00						10.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Observations: El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
0.1	1.3 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.	% niños/ñas	0.00	2011	P	20.00	30.00	40.00				50.00
					P(a)	20.00	30.00	0.00	10.00	50.00		50.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.

Observations: El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
0.1	1.4 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00	0.00	10.00	70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
0.1	1.5 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00			70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
0.1	1.6 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00		10.00	70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Outcome Nbr. 1: 2. Los servicios de los centros de desarrollo infantil articulados y fortalecidos.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	2.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00				30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00				

Details

Means of verification: Encuesta específica al final de ejecución.

Observations: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	2.2 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00				30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Encuesta específica al final de ejecución.

Observations: Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimient

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P	3	10	1,644,482	8,475,235
			P(a)	2	0	636,000	0
			A	0	0	0	0
1.2	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P		1	92,700	2,255,221
			P(a)	0	1	1,218,300	1,047,409
			A	0	0	128,323	128,323
1.3	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P	6	12	77,000	3,226,174
			P(a)	2	0	8,100	0
			A	0	0	0	0
1.4	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P	6	11		2,639,848
			P(a)		0	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P	46	167	921,953	3,678,615
			P(a)	4	4	210,000	233,011
			A	0	0	125,737	131,652
1.6	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.7	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P		0		0
			P(a)	2	5	405,281	931,308.43
			A	2	5	291,963	332,730.43
1.8	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	225	689	681,851	310,227.59
			A	426	515	69,247	115,846.59
1.9	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P		0		0
			P(a)		1	0	492,590.08
			A	0	1	0	492,590.08
1.10	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agentes comunitarios	P		0		0
			P(a)	344	137	1,864,233	2,820,195.41
			A	137		745,777	1,092,063.41
1.11	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	0	10	2,218,944	1,213,391.19
			A	0	0	0	80,852.19
1.12	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	0	7	368,000	1,024,029
			A	0	0	0	20,930

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P		1		388,000
			P(a)	1	1	0	15,713.67
			A	0	0	0	5,713.67
2.2	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P	11	31		1,188,519
			P(a)	0	29	37,779	216,388.01
			A	0	0	0	16,388.01

Component Nbr. 3 3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P	10	20		61,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.2	3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	sistema	P		1		168,998
			P(a)	0	0		0
			A	0	0	0	0
3.3	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	sistema	P		1		130,000
			P(a)	0	1	392,242	528,649.25
			A	0	0	256,456	262,863.25
3.4	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	evaluaciones	P		2		640,000
			P(a)	1	1	349,650	20,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Administracion y Auditoria	P			166,030	1,318,258
		P(a)			296,663	696,030.38
		A			210,343	379,034.38
	Imprevistos	P			19,900	63,900
		P(a)			0	175,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			3,527,065	30,000,000
		P(a)			8,687,043	9,723,943.01
		A			1,827,846	3,058,987.01

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Modify Output	Como resultado de los recortes presupuestarios ocasionados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el cupo fiscal asignado al Proyecto en 2018 fue muy reducido, requiriendo la cancelación de varios productos programados. Como resultado, no se ejecutará la estrategia de evaluación cuasi experimental originalmente programada. Con los recursos disponibles, se realizará una evaluación rápida, concentrando esfuerzos en la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas para nutrir el diseño de nuevas operaciones en el país, y documentar los resultados de instalar el MAIDIT en el primer nivel de atención. Por ende, se reduce el P(a) asignado al producto por US\$679.300.	03/09/2018	03/06/2018
