

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1068	Chief of Operations Validation Date	10/12/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/25/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Rural Development and Family Agriculture, PRODAF	Loan Number	2740/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Sector/Subsector	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Team Leader	MILEWSKI, JOSEPH CHRISTOFER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1068	30,000,000	30,000,000	11,000,000	0	41,000,000	30,000,000	20,870,000	69.57%	9,130,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	11,000,000	0	41,000,000	30,000,000	20,870,000	69.57%	9,130,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

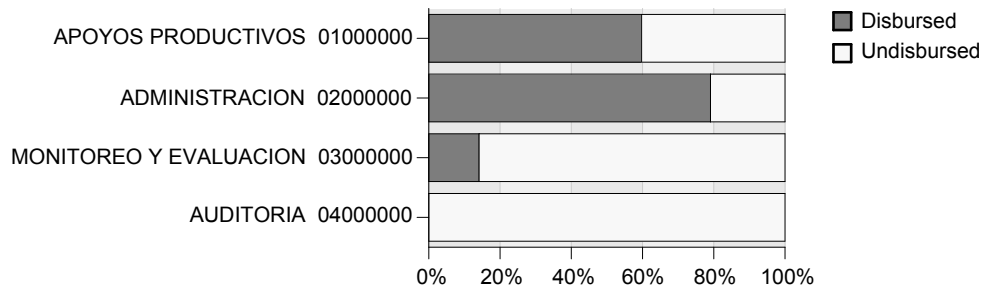

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de los ingresos netos agropecuarios promedio de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios en el Chaco y Entre Ríos.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

Observations: El indicador es 0 en la LB por construcción. El grupo de control será construido de manera que tenga características observables claves iguales al grupo de beneficiarios en la LB (ver plan monitoreo y evaluación). Supuestos:a) Situación económica nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017

Observations: Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
2.1	Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			50.00
					P(a)			50.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

Observations: Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
3.1	Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			20.00
					P(a)			20.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

Observations: Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes	P		2		792,000
			P(a)	0	2	0	1,111,262
			A	0	2	0	1,111,262
1.2	Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas	P		71		126,000
			P(a)	0	123	0	46,000
			A	1	110	0	46,000
1.3	Planes de difusión ejecutados	Planes	P		4		282,000
			P(a)	0	4		145,200
			A	0	4	340	46,540
1.4	Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos	P		100		190,000
			P(a)	36	100	91,000	121,000
			A	12	76	0	30,000
1.5	Planes de Negocios formulados	Planes	P		360		282,000
			P(a)	227	2,090	46,000	282,000
			A	65	1,928	0	136,000
1.6	Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios	P		8		528,000
			P(a)	1	7	100,000	257,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo	P		1		9,950,000
			P(a)	0	1		8,146,013
			A	0	1	0	771,000
2.2	Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes	P		300		23,000,000
			P(a)	548	2,090	5,000,000	23,134,525
			A	124	1,666	1,441,431.51	17,211,956.51
2.3	Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Farmers (#)	P		2,060		3,350,000
			P(a)	579	2,466	500,000	3,350,000
			A	140	2,027	84,057.34	1,416,057.34

Other Cost

	Coordinación y administración del proyecto	P				1,800,000
		P(a)			500,000	3,907,000
		A			106,103.02	2,228,103.02
	Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	P				500,000
		P(a)			272,000	500,000
		A			0	228,000

Total Cost

	Total Cost	P				40,800,000
		P(a)			6,509,000	41,000,000
		A			1,631,931.87	23,224,918.87

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
