

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/05/17
Last Update	04/05/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA,FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	6,778,907.59	11.30%	53,221,092.41
Aggregated	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	6,778,907.59	11.30%	53,221,092.41

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

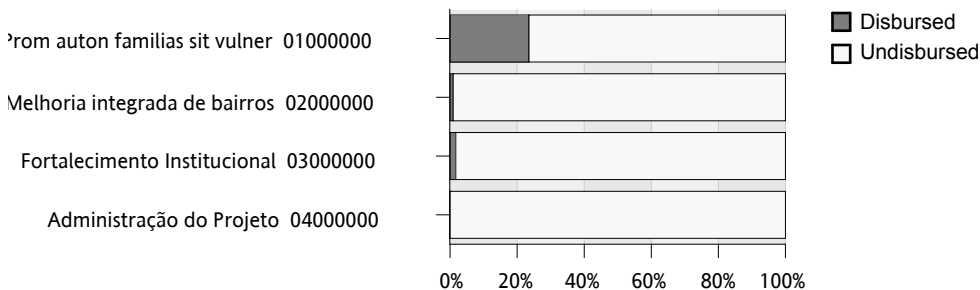

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Condicao de vida das familias mediante acoes do Governo melhoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.0	Familias com acesso e uso dos servicos em educacao, saude e desenvolvimento social produtivo melhorados	%		2014	P	
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Sistema de informacao do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.1	Familias com indice melhorado de habilitação psicosocial	%		2014	P	
					P(a)	
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.2	Familias abordadas pelo programa ao concluir 24 meses de acompanhamento, que deram continuidade a sua propria habilitacao social	%		2014	P	
					P(a)	
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.0	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%		2014	P	60.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Sistema de informação do Programa						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%		2014	P	60.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Sistema de informação do Programa						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%		2014	P	50.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Sistema de informação do Programa						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.0	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.0	2014	P	100.00
					P(a)	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.0	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.0	2014	A	
-----	---	---	------	------	---	--

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.1	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a água potável no domicílio	%	50.0	2014	P	100.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
0.0	Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0.0	2014	P	90.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Testes de conhecimento

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados	Beneficiaries (#)	P	3,870	22,000	3,829,443	14,410,366
			P(a)	5,612	12,342	2,701,916	14,410,366
			A	2,265	5,243	1,450,978.6	6,862,086.6
1.2	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P	130	130	1,353,000	8,774,200
			P(a)	130	130	1,758,529.37	8,774,200
			A	154	0	2,947,739.97	3,866,210.6
1.3	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P	53	53	1,781,000	10,781,000
			P(a)	53	53	2,104,214.29	10,781,000
			A	122	0	2,270,634.9	3,447,420.61
1.4	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P	10,000	40,000	3,000,000	10,000,000
			P(a)	10,000	99,822	3,000,000	10,000,000
			A	49,507	99,822	3,789,387.69	7,222,434.83
1.5	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P	500	3,480	312,425	2,522,478
			P(a)	500	3,480	412,425	2,522,478
			A	0	0	0	0
1.6	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P	1,500	5,600	1,943,775	7,256,760
			P(a)	2,151	5,600	2,589,775	7,256,760
			A	137	186	64,800.64	78,800.64
1.7	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Famílias	P	220	560	790,718	2,522,154
			P(a)	220	560	890,718	2,522,154
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P	96	594	3,100,000	17,940,000
			P(a)	96	594	4,227,500	17,940,000
			A	0	0	0	0
2.2	Lotes regularizados	Lotes	P	41	328	1,000,000	6,560,000
			P(a)	41	328	1,000,000	6,560,000
			A	0	0	0	0
2.3	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P	6	22	1,720,182	6,361,544
			P(a)	6	22	1,720,182	6,361,544
			A	1	1	309,825	309,825
2.4	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P	3	8	949,043	3,238,498
			P(a)	3	8	949,043	3,238,498
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	Investigações e estudos realizados	Estudos	P	0	7	329,630	1,620,000
			P(a)	2	7	700,000	1,620,000
			A	0	0	26,735.19	26,735.19
3.2	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P	2,460	12,300	637,668	2,113,000
			P(a)	4,920	12,300	737,668	2,113,000
			A	244	244	129,428.58	129,428.58
3.3	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P	3	6	300,000	900,000
			P(a)	3	6	300,000	900,000
			A	1	1	50,075.94	50,075.94

Other Cost

	Administração	P			1,000,000	4,000,000
		P(a)			1,000,000	4,000,000
		A			0	0
	Contingencia	P			250,000	1,000,000
		P(a)			250,000	1,000,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			22,296,884	100,000,000
		P(a)			24,341,970.66	100,000,000
		A			11,039,606.51	21,993,017.99

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
