

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1053	Chief of Operations Validation Date	10/08/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Social Reforms in Ceará - PROARES Phase II	Loan Number	2230/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - STDS CEARA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1053	45,000,000	45,000,000	19,260,000	0	64,260,000	45,000,000	45,000,000	100.00%	0
Aggregated	45,000,000	45,000,000	19,260,000	0	64,260,000	45,000,000	45,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

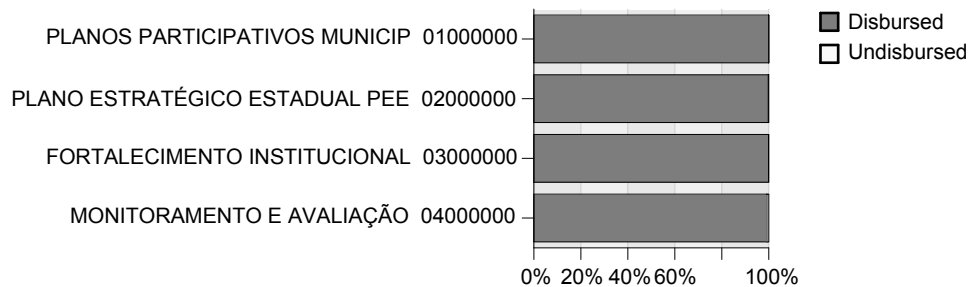

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Estado de Ceara mejoradas

Observation: El Banco y el gobierno estan negociando el modelo de evaluacion de impacto del Programa y muy posiblemente los indicadores estarán referidos a "desarrollo infantil temprano". La linea de base no ha sido recolectada hasta el momento. El atraso se debe a pr

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Niños menores de cinco años con desnutrición crónica.	%	1.03	2010	P		
					P(a)		0.00
					A	0.77	0.77

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Niños con desarrollo motor adecuado para la edad	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A	4.21	4.21

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Niños con desarrollo social adecuado para la edad	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A	4.89	4.89

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Niños con desarrollo lenguaje adecuado para la edad	%		2010	P		
					P(a)		0.00
					A	3.43	3.43
Details							
Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento							
Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.5	Reincidencia de jovenes beneficiarios en conflictos con la ley en los ultimos 20 anos	%	60.00	2010	P		
					P(a)		45.00
					A	70.00	70.00
Details							
Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento							
Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura de la red de servicios sociales orientada a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.1	Niños menores de 5 años inscritos en Centros de Educación Infantil (CEIS).	Children (#)		2011	P			
					P(a)			6,000.00
					A		5,960.00	5,960.00

Details

Means of verification: Sistema de Información del PROARES II.

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.2	Jóvenes atendidos en Cuadras o Centros Deportivos	numero		2011	P			
					P(a)			37,500.00
					A		36,200.00	36,200.00

Details

Means of verification: Sistema de Información del PROARES II.

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.3	Jóvenes atendidos en Polos de atención	numero		2011	P			
					P(a)			10,500.00
					A			8,500.00

Details

Means of verification: Sistema de Información del PROARES II.

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios de atención a los jóvenes beneficiarios mejorada

Observation:

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2016	2017	EOP 2017
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year				
2.1	Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de asesoria juridica	numero	1,102.00	2010	P			
					P(a)			1,142.00
					A		925.00	925.00

Details

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.2	Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de capacitacion profesional	numero	2012	P			
				P(a)			0.00
				A		60.00	60.00

Details

Observations: Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID. Projeto Piloto (sem meta do FDP)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.3	Valores, conocimientos y actitudes en adolescentes en conflicto con la ley	%	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

Details

Means of verification: Evaluacion cualitativa

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.4	Satisfaccion de los jovenes beneficiarios en el uso de instalaciones del programa	%	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

Details

Means of verification: Evaluacion cualitativa

Observations: Será realizada a pesquisa para identificar os níveis de satisfação e re inserção dos jovens em conflito com a Lei. Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Impacto, que esta sendo coordenada com o BID.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Capacidad institucional de municipios y la Secretaria de Trabajo y Desarrollo Social (STDS) en gestion y prestación de servicios sociales mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.1	Beneficiarios con conocimiento del Programa	%		2012	P			
					P(a)			80.00
					A		85.00	85.00

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID. A partir do plano de comunicação

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.2	Política Estadual para acciones socioeducativas.	documentos		2012	P			1.00
					P(a)			1.00
					A		1.00	1.00

Details

Observations: Plano Sócio Educativo elaborado em fase final de revisão.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.3	Servicios sociales del Programa funcionando de acuerdo a guías y manuales.	%		2012	P			80.00
					P(a)			80.00
					A		100.00	100.00

Details

Means of verification: Sistema de informacion del PROARES II

Observations: Manuais elaborados e não publicados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Planes Participativos Municipales.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2017	2018	EOP 2017
1.1	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Centros	P		54		15,300,000
			P(a)		53		11,048,040.34
			A	0	52	15,993.69	10,791,349.93
1.2	Quadras y Centros Esportivos implantados.	quadras y centros	P		49		13,740,000
			P(a)		58		11,313,144.14
			A	0	60	0	11,566,228.61
1.3	Polos de Atención construido.	Polos de Atención	P		21		8,145,000
			P(a)		21		5,739,972.51
			A	0	21	0	6,170,401.71
1.4	Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos.	Centros CRAS	P		41		6,152,000
			P(a)		41		6,219,683.11
			A	0	41	0	5,883,862.54
1.5	Bibliotecas implantadas.	Bibliotecas	P		4		856,000
			P(a)		4		861,757.7
			A	0	3	0	866,390.23

Component Nbr. 2 Plano Estratégico Estadual.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2017	2018	EOP 2017
2.1	Unidades de reabilitacion social de jovenes construídas.	centros de reabilitación	P		2		5,879,000
			P(a)		2		7,898,977.31
			A	0	2	0	8,982,325.19
2.2	Capacitação p/profissionais de centros de reabilitacion realizadas.	capacitaciones	P		10		680,000
			P(a)		25		1,182,254.75
			A	0	24	0	1,455,391.16
2.3	Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	proyectos	P		2		480,000
			P(a)		2		1,490,784.01
			A	0	2	319,256.31	1,441,198.43
2.4	Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Unidades	P		15		306,000
			P(a)		19		660,540
			A	0	19	0	801,912.94

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2017	2018	EOP 2017
3.1	Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	técnicos	P		60		450,000
			P(a)		160		452,956.65
			A	0	160	0	452,956.65
3.2	Capacitación en Planificación Participativa realizados.	capacitaciones	P		3		261,000
			P(a)		4		494,521
			A	0	4	0	494,521
3.3	Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	capacitaciones	P		3		340,000
			P(a)		7		233,519.54
			A	0	7	0	233,519.54
3.4	Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Planos	P		1		1,000,000
			P(a)		2		635,841.07
			A	0	2	0	1,143,151.02

Component Nbr. 4 Monitoreo y Evaluacion.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2017	2018	EOP 2017
4.1	Estudios y investigaciones realizados.	estudios	P		4		425,000
			P(a)		3		426,000
			A	0	3	20,738.91	231,442.05
4.2	Evaluación Intermedia realizada.	evaluaciones	P		1		700,000
			P(a)		1		23,000
			A	0	1	0	23,000
4.3	Evaluación Final realizada.	evaluaciones	P		1		700,000
			P(a)		1		100,000
			A	0	1	0	73,968.14
4.4	Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	sistema	P		1		270,000
			P(a)		4		297,951.81
			A	0	4	0	235,196.25

Other Cost

	Administración y Auditoria.	P				3,907,000
		P(a)				4,995,151.52
		A			3,198.73	4,606,639.64
	Contingencia.	P				1,572,000
		P(a)				0
		A			0	0
	Costos Financieros.	P				3,097,000
		P(a)				3,077,496.07
		A			0	2,939,369.83

Total Cost

	Total Cost	P				64,260,000
		P(a)				57,151,591.53
		A			359,187.64	58,392,824.86

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
