

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	10/10/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/02/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Curitiva, tiene un equipo para monitoreo del reasentamiento e impactos ambientales.Cantagalo ha definido los lugares para la construccion de nuevas viviendas, que aun no da inicio. Para un cumplimiento satisfactorio se requiere: (i) definir lugar para apoyo para reasentamiento temporal que se proveerá a las familias; informar sobre estos temas a cada uno de las familias afectadas; (ii) definir entidad encargada del pago por indemnizacion a viviendas afectadas y/o impactos economicos (con o sin reasentamiento) y (iii) definir la ubicación de estos resentamiento temporales		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	14,433,556.92	24.06%	45,566,443.08
Aggregated	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	14,433,556.92	24.06%	45,566,443.08

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

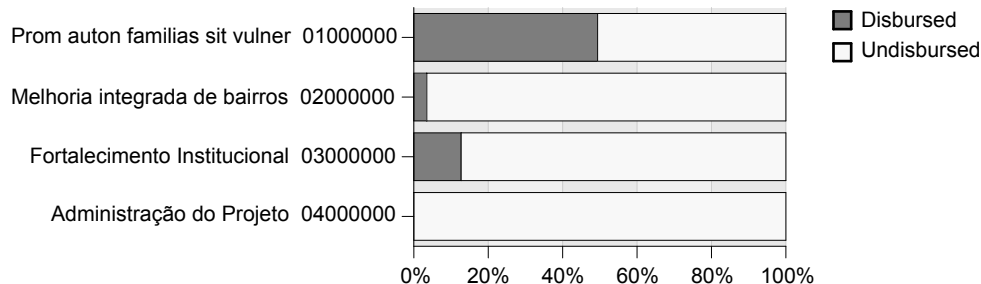

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Condição de vida das famílias mediante ações do Governo melhoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Famílias com acesso e uso dos serviços em educação, saúde e desenvolvimento social produtivo melhorados	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Famílias com índice melhorado de habilitação psicosocial	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Famílias abordadas pelo programa ao concluir 24 meses de acompanhamento, que deram continuidade a sua própria habilitação social	%		2014	P		
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%		2014	P		60.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%		2014	P		60.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%		2014	P		50.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	P		100.00
					P(a)		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.0	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	A		
-----	---	---	-------	------	---	--	--

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a agua potavel no domicilio	%	50.00	2014	P	100.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Relatorio semestral do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0.00	2014	P	90.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Testes de conhecimento

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados	Beneficiaries (#)	P	4,470	22,000	2,496,790	14,410,366
			P(a)	4,693	21,600	1,000,000	19,784,410.9
			A	2,565	13,780	67,000	8,036,621.35
1.2	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P	130	130	2,762,400	8,774,200
			P(a)	130	130	3,000,000	9,867,732.64
			A	0	0	0	6,867,732.64
1.3	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P	53	53	2,500,000	10,781,000
			P(a)	110	53	1,500,000	10,780,999.99
			A	75	0	370,000	4,808,049.34
1.4	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P	0	40,000	0	10,000,000
			P(a)	40,000	191,821	2,000,000	11,737,925.26
			A	39,577	191,398	1,770,617	11,508,542.26
1.5	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P	1,080	3,480	782,838	2,522,478
			P(a)	2,880	3,480	721,000	2,522,478
			A	173	173	108,676	108,676
1.6	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P	1,200	5,600	1,555,020	7,256,760
			P(a)	1,800	5,600	1,920,000	7,256,759.99
			A	1,137	2,510	546,118.72	1,174,592.08
1.7	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Famílias	P	0	560	840,718	2,522,154
			P(a)	200	560	700,000	2,522,154
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P	159	594	6,200,000	17,940,000
			P(a)	200	594	3,780,000	17,940,000
			A	0	0	101,990.25	101,990.25
2.2	Lotes regularizados	Lotes	P	62	328	2,000,000	6,560,000
			P(a)	53	328	1,415,321	6,560,000
			A	0	0	0	0
2.3	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P	6	22	1,721,118	6,361,544
			P(a)	7	22	2,624,000	6,361,544
			A	0	1	455,217.65	799,797.62
2.4	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P	2	8	609,356	3,238,498
			P(a)	7	8	1,681,000	3,238,498
			A	0	0	479,585.47	492,107.11

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Investigações e estudos realizados	Estudos	P	1	7	300,000	1,620,000
			P(a)	4	7	250,000	1,620,000
			A	0	3	31,083.99	256,568.41
3.2	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P	2,460	12,300	637,665	2,113,000
			P(a)	2,500	12,300	200,000	2,094,492.73
			A	1,764	6,189	127,476.45	433,245.54
3.3	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P	0	6	0	900,000
			P(a)	2	6	150,000	900,000.04
			A	0	2	0	108,258.41

Other Cost

	Administração	P			1,000,000	4,000,000
		P(a)			0	4,000,000
		A			0	0
	Contingencia	P			250,000	1,000,000
		P(a)			0	1,000,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			23,655,905	100,000,000
		P(a)			20,941,321	108,186,995.55
		A			4,057,765.53	34,696,181.01

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
