

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1047	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/01/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/27/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support to the Social Protection Program - Third Fase	<b>Loan Number</b>	2623/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	IS - SOCIAL INVESTMENT
<b>Team Leader</b>	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	DOMINICAN REPUBLIC
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1047	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00%	0
Aggregated	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

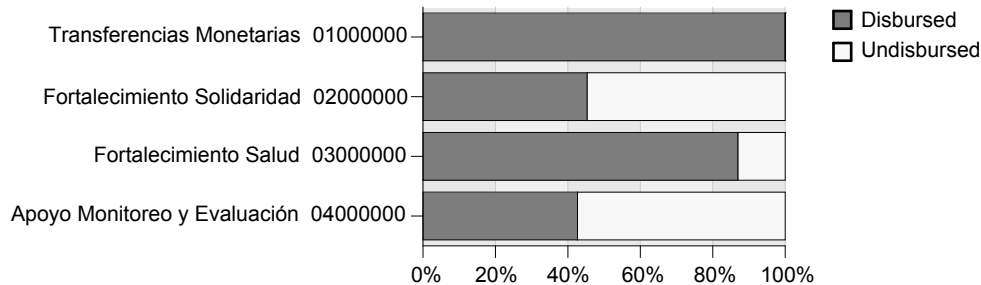

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad tienen menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0-2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad	Porcentaje	10.10	2011	P		9.80
					P(a)		9.80
					A		

#### Details

**Means of verification:** EEPS 2012, EEPS 2013

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad	Centímetros	101.10	2011	P		102.00
					P(a)		102.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** EEPS 2012, EEPS 2013

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunación completa	Porcentaje	28.50	2011	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** EEPS 2012, EEPS 2013

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos seis grados de educación básica	Porcentaje	73.93	2011	P		76.00
					P(a)		76.00
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Details			
Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación

**Observation:** El seguimiento a las condicionalidades ha sido una de las debilidades del programa desde su inicio. El banco ha incluido acciones destinadas a superar esta debilidad en el componente 2 de la segunda fase de este préstamo multifase (desarrollo del sistema

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de mujeres que llevaron al niño al menos a un control en el centro de salud	Porcentaje	56.80	2011	P		69.00
					P(a)		69.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** EEPS 2012, EEPS2013

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Porcentaje de mujeres que se les recetó y tomaron vitaminas o micronutrientes en las seis semanas siguientes al parto	Porcentaje	44.00	2011	P		55.00
					P(a)		55.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** EEPS 2012, EEPS 2013

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Porcentaje de mujeres con un hijo de 0 a 5 años que acudieron a un control en las seis semanas siguientes al parto	Porcentaje	44.60	2011	P		55.00
					P(a)		55.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** EEPS 2012, EEPS 2013

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Porcentaje de mujeres que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas	Porcentaje	10.80	2011	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details			
<b>Means of verification:</b> EEPS 2012, EEPS 2013			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 2:** Mejora el seguimiento que hace Solidaridad a los hogares beneficiarios para propiciar el cumplimiento de las condicionalidades

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	Proporción de hogares que conocen las corresponsabilidades de Solidaridad	Porcentaje	0.00	2011	P		90.00
					P(a)		90.00
					A		

Details			
<b>Means of verification:</b> EEPS 2012, EEPS 2013			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 3:** Mejora la calidad de los servicios de salud a los que acceden los beneficiarios de Solidaridad

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.1	Porcentaje de beneficiarios de Solidaridad que asiste a UNAPs habilitadas	Porcentaje	21.80	2011	P		55.00
					P(a)		55.00
					A		

Details			
<b>Means of verification:</b> Informes Semestrales			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.2	Porcentaje de médicos que proveen servicios de salud siguiendo las guías y protocolos de atención materno-infantil	Porcentaje	8.00	2011	P		50.00
					P(a)		50.00
					A		

Details			
<b>Means of verification:</b> Informes Semestrales			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.3	Porcentaje del personal de salud del primer nivel que conoce al menos un 80% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil	Porcentaje	13.20	2011	P		60.00
					P(a)		60.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe Semestral							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Transferencias condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Número de personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación.	Beneficiaries (#)	P		755,998.2		47,501,000
			P(a)	0	915,714.6		54,772,515.36
			A	0	915,714.6	0	54,772,515.16

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional de Solidaridad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Estrategia de comunicación dirigida a mejorar el conocimiento de las corresponsabilidades implementada	Estrategia	P		1		30,000
			P(a)	0	1	196,338	1,023,702.03
			A	0	1	34,338	861,702.03
2.2	Sistema automatizado de planificación, seguimiento y supervisión efectiva de los enlaces comunitarios implementado	Sistema	P		1		520,000
			P(a)	1	1	328,564.1	480,756.84
			A	0	0	18,029.09	170,221.83
2.3	Enlaces Familiares de Progresando con Solidaridad Fortalecidos	Estrategia de motivación	P		0		0
			P(a)	1	1	431,000	431,000
			A	0	0	19,814.28	19,814.28
2.4	Estrategia para el cambio de comportamiento de la ciudadanía en violencia de pareja diseñada	Contratos	P		0		0
			P(a)	1	1	415,000	415,000
			A	0	0	1,905.98	1,905.98
2.5	Estudio del Programa Progresando Avanzando realizado	Estudio	P		0		0
			P(a)	1	1	70,000	70,000
			A	0	0	0	0
2.6	Taller de inclusión social realizado	Taller	P		0		0
			P(a)	1	1	150,000	150,000
			A	1	1	196,771.56	196,771.56

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1	Personal del nivel gerencial y de coordinación de los Sistemas Regionales de Salud (SRS) capacitado en Sistemas de Gestión	personas	P		240		1,000,000
			P(a)	0	230	0	575,768.99
			A	0	230	0	575,768.99
3.2	Personal del primer nivel de atención capacitados en protocolos	personas	P		1,545		473,000
			P(a)	0	1,056	0	392,956.72
			A	0	1,056	0	392,956.72
3.3	Centros de atención primaria con déficits en equipamientos médicos cubiertos	centros de atención primaria	P		100		4,000,000
			P(a)	2	99	539,074.77	1,908,988.19
			A	0	97	412,583.34	1,782,496.76
3.4	Centros de atención primaria con infraestructura rehabilitada	Centros	P		100		8,791,680
			P(a)	0	100	116,623.78	8,140,910.04
			A	0	100	59,096.27	8,083,382.53
3.5	Modelo de atención primaria diseñado	Implementacion	P		1		3,438,878
			P(a)	0	1	0	2,874,219.24
			A	0	1	0	2,874,219.24
3.6	Banco Nacional de Sangre fortalecido	Banco de sangre	P		1		3,722,125
			P(a)	0	0	3,135,263.44	6,003,819.68
			A	0	0	898,634.72	3,767,190.96
3.7	Intervención de prevención del embarazo adolescente implementado	Intervención	P		1		250,000
			P(a)	0	0	112,883.93	407,712.83
			A	0	0	22,878.62	317,707.52
3.8	Personal de atención (Enfermeras) del nivel primario capacitado en sistemas de gestión en salud	Personas	P		1		1,457,220
			P(a)	0	1	0	45,477
			A	0	1	0	45,477
3.9	Sistema de Gestion Clinica Ampliado	sistema	P		1		1,006,633
			P(a)	0	0	0	201,837.97
			A	0	0	0	201,837.97
3.10	Programa Ampliado de Inmunizaciones difundido	Materiales	P		0		0
			P(a)	1	1	87,637	87,637
			A	0	0	0	0



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Evaluaciones

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
4.1	Evaluación del sistema de gestión clínica realizada	Evaluación	P		1		0
			P(a)	0	1		41,430.86
			A	0	1	3,566.95	45,462.18
4.2	Evaluación del sistema georeferenciado del mapa de oferta de servicios de salud realizada	Evaluación	P		1		50,000
			P(a)	0	0	0	50,000
			A	0	0	0	50,000
4.3	Evaluación de la capacitación de niveles gerenciales de los Sistemas Regionales de Salud realizada	Evaluación	P		1		30,000
			P(a)	1	1	14,297.61	69,941
			A	1	1	3,476.79	59,120.18
4.4	Evaluación de la implementación del diplomado a nivel nacional realizada	Evaluación	P		1		0
			P(a)	1	1	28,032.27	60,951.46
			A	1	1	4,300.26	37,219.45
4.5	Evaluación del Plan Piloto de intervención de la prevención del embarazo realizada	Evaluación	P		1		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	41,895.23	41,895.23
4.6	Investigación sobre fracaso de los negocios emprendidos por mujeres	Contratación	P		0		0
			P(a)	1	1	80,000	80,000
			A	0	0	0	0
4.7	Taller de evaluación de proyectos pilotos en América Latina y el Caribe realizado	Taller	P		0		0
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A	0	0	0	0
4.8	Sistematización Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas realizado	Documento	P		0		0
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	0	0	0	0

### Other Cost

Auditoría Financiera y Gastos Administrativos	P				555,708
	P(a)			22,087.97	687,498.02
	A			0	665,410.05
Consultorías y adquisiciones varias	P				0
	P(a)			65,000	507,393.1
	A			31,083.25	473,476.35
Auditoría recurrente	P				200,000
	P(a)			0	209,865.21
	A			0	209,865.21

### Total Cost

Total Cost	P				80,000,000
	P(a)			5,941,802.87	79,839,381.54
	A			1,748,374.34	75,646,417.18

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
