

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1022	Chief of Operations Validation Date	10/08/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improved Access and Quality of Health and Nutrition Services - Phase I	Loan Number	2328/BL-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL	Sector/Subsector	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	ASTORGA, IGNACIO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1022	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	22,700,000	64.86%	12,300,000
Aggregated	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	22,700,000	64.86%	12,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

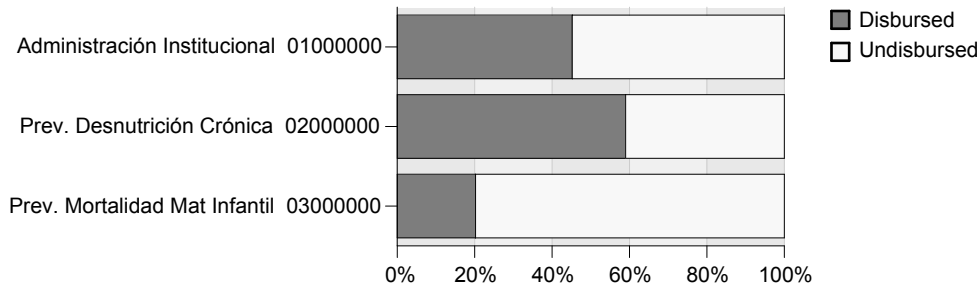

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: El acceso, la utilización y la calidad de los servicios de nutrición y salud del primer y segundo nivel de atención mejorada, en al menos 47 municipios priorizados por el programa de transferencias condicionadas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Desnutrición crónica en niños de 6 a 24 meses	%	44.50	2011	P				38.50
					P(a)				38.50
					A				

Details

Means of verification: Encuesta Evaluación de Impacto

Observations: Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Anemia en niños de 6 a 24 meses	%	65.00	2011	P				53.60
					P(a)				53.60
					A				

Details

Means of verification: Encuesta Evaluación de Impacto

Observations: Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Anemia en mujeres embarazadas y lactantes	%	22.00	2011	P				18.20
					P(a)				18.20
					A				

Details

Means of verification: ENSMI 2008 y siguientes ENSMI

Observations: Población en 47 municipios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso y cobertura de los servicios de salud del primer nivel de atención en énfasis en nutrición preventiva

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Embarazadas con al menos dos controles por médico o enfermera profesional del GMI y uno en el último trimestre	%	0.00	2011	P	15.00	22.00	30.00			30.00
					P(a)	15.00	22.00	30.00		0.00	30.00
					A	0.00	64.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de información MSPAS

Observations: Mujeres embarazadas en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios priorizados

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Recién nacidos con un control médico en los primeros 28 días de nacido por equipo GMI	%	0.00	2011	P	20.00	30.00	40.00			40.00
					P(a)	20.00	30.00	40.00		0.00	40.00
					A	0.00	52.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Información MSPAS

Observations: Poblacion cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Embarazadas captadas antes de 12 semanas de embarazo por equipo GMI	%	0.00	2011	P	11.00	16.00	21.00			21.00
					P(a)	11.00	16.00	21.00		0.00	21.00
					A	0.00	64.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de información MSPAS

Observations: Mujeres embarazadas en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios priorizados

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Niños menores de 12 meses con esquema de inmunización completa según la norma entregado	%	0.00	2011	P	40.00	60.00	80.00			80.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.3	por equipo GMI	%	0.00	2011	P(a)	40.00	60.00	80.00		0.00	80.00
					A	0.00	75.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Información MSPAS

Observations: niños menores de 12 meses en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios de salud del primer nivel de atención con énfasis en nutrición preventiva

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Niños entre 6 y 59 meses atendidos por GMI que reciben micronutrientes espolvoreados de acuerdo a la norma	%	0.00	2011	P	40.00	60.00	80.00		80.00
					P(a)	40.00	60.00	80.00	0.00	80.00
					A	0.00	64.00	0.00		

Details

Means of verification: Sistema de Información MSPAS

Observations: Población cubierta por GMI y AIMN-C en 47 municipios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Niños de 12 a 24 meses suplementados con dosis de Vitamina A a partir de los 12 meses de edad atendidos por GMI	%	0.00	2011	P	35.00	50.00	70.00		70.00
					P(a)	35.00	50.00	70.00	0.00	70.00
					A	0.00	63.00	0.00		

Details

Means of verification: Sistema de Información MSPAS

Observations: Población cubierta por GMI y AIMN-C en 47 municipios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Facilitadores institucionales GMI capacitados que pesan de acuerdo a la norma	%	0.00	2014	P		50.00			50.00
					P(a)		50.00	50.00	0.00	50.00
					A		85.00	0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Evaluación de Proceso AIMN-C y GMI

Observations: Personal técnico de los GMI en los 47 municipios priorizados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Fortalecimiento del sistema de información en salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Puestos de Salud que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses	%	0.00	2011	P		70.00				70.00
					P(a)		70.00	70.00		0.00	70.00
					A		100.00	0.00			

Details

Means of verification: Encuesta equipo Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Observations: 47 municipios priorizados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Jurisdicciones del PEC y GMI que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses	%	0.00	2014	P		70.00				70.00
					P(a)		70.00	70.00		0.00	70.00
					A		86.00	0.00			

Details

Means of verification: Evaluación de Proceso AIMN-C y GMI

Observations: 47 municipios priorizados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios del primer nivel de atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Puestos de Salud construidos y equipados	Puestos de salud	P		8		1,700,000
			P(a)	6	6	1,708,667	1,715,461
			A	0	0	0	6,794
1.2	Puestos de salud remozados	Puestos de salud	P		47		2,500,000
			P(a)	57	57	2,248,027	2,999,037
			A	26	26	229,701	980,711
1.3	Auxiliares de enfermería comunitarios dotados con equipo médico básico	Auxiliares de enfermería	P		0		0
			P(a)	223	283	80,203	80,203
			A	344	404	0	0
1.4	Kits de equipo para la implementación de huertos medicinales entregados en los Servicios de Salud	Kits de equipo	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Población atendida por servicios de salud del primer nivel (beneficiarios directos)	Beneficiaries (#)	P		0		0
			P(a)	373,630	600,000	4,563,127.87	13,121,572.87
			A	454,248		92,513	8,650,958
1.6	Servicios de salud del primer nivel de atención dotados con equipamiento y mobiliario	Servicios de salud	P		0		0
			P(a)	61	61	1,427,386.33	1,427,386.33
			A	61	61	0	0
1.7	Estudios de preinversión de primer y segundo nivel		P		0		0
			P(a)	70	70	400,000	400,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Mejoramiento de los servicios de nutrición preventiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Mujeres embarazadas que recibieron suplemento de hierro y ácido fólico	Mujeres embarazads	P		0		0
			P(a)	23,993	59,538	95,110	95,110
			A	27,555	63,100	0	0
2.2	Niños entre 0 y 24 meses de edad que ingresan al programa de monitoreo de crecimiento en los 17 municipios priorizados en Huehuetenango y San Marcos	Niños	P		0		0
			P(a)	26,154	97,094	300,982	300,982
			A	22,532	93,472	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Gestión del desarrollo del recurso humano en nutrición y salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1	Auxiliares de enfermería comunitarias que finalizan la formación descentralizada en las sedes cubiertas por el proyecto	Auxiliares de enfermería	P		0		0
			P(a)	788	788	594,451	995,561
			A	786	786	278,554	679,664
3.2	Recurso humano que completa el Diplomado del Modelo Incluyente en Salud (MIS)	Personas	P		0		0
			P(a)	400	400	235,880	371,890
			A	450	450	0	136,010
3.3	Documento propuesta para modificar el Reglamento Orgánico Interno del MSPAS	Documento	P		0		0
			P(a)	1	1	25,000	28,279
			A	0	0	0	3,279
3.4	Documento propuesta para modificar el Manual de Organización y Funciones del MSPAS	Documento	P		0		0
			P(a)	1	1	25,000	25,000
			A	0	0	0	0
3.5	Documento propuesta para el Reglamento de la Red de Servicios de Salud	Documento	P		0		0
			P(a)	1	1	25,000	28,279
			A	0	0	0	3,279
3.6	Documento propuesta de mecanismos de gestión de recursos humanos y calidad de la atención	Documento	P		0		0
			P(a)	1	1	622,914	628,640
			A	0	0	0	5,726
3.7	Documento de sistematización del proceso de dotación y permanencia del personal en los servicios de salud	Documento	P		0		0
			P(a)	1	1	25,000	29,294
			A	0	0	0	4,294

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de los sistemas de información y de la capacidad de supervisión y monitoreo del MSPAS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
4.1	Territorios que reportan la producción de servicios de salud a través del sistema de información	Territorios	P		0		0
			P(a)	0	389	309,003.71	309,003.71
			A	136	525	21,244	21,244
4.2	Sectores que reciben asistencia técnica por parte del Equipo de Apoyo al Primer Nivel de Atención	Sectores	P		0		0
			P(a)	0	3,022	0	0
			A	394	3,416	0	0
4.3	Documento propuesta para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Supervisión del Primer y Segundo Nivel de Atención	Documentos	P		0		0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
4.4	Unidad Central de Sistemas de Información Gerencial en Salud (SIGSA) dotada con equipo y capacitada para acceso remoto y resguardo de base de datos del Sistema	Unidades	P		0		0
			P(a)	1	1	2,798,105.33	2,798,105.33
			A	1	1	0	0
4.5	Evaluación de Impacto	Evaluaciones	P		0		900,000
			P(a)	1	1	200,000	200,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administración, Auditoría e Imprevistos	P				5,631,000
	P(a)			320,546	1,372,993
	A			101,977	1,154,424

Total Cost

	Total Cost	P				35,000,000.06
		P(a)			16,004,403.24	32,319,462.66
		A			723,989	17,039,048.42

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
