

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1105	Chief of Operations Validation Date	10/11/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/11/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Social Inclusion Network with Priority in Western Honduras	Loan Number	3723/BL-HO, 3723/BL-HO-1, 3723/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	VILLA LORA, JUAN MIGUEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1105	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	19,000,000	38.00%	31,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	19,000,000	38.00%	31,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

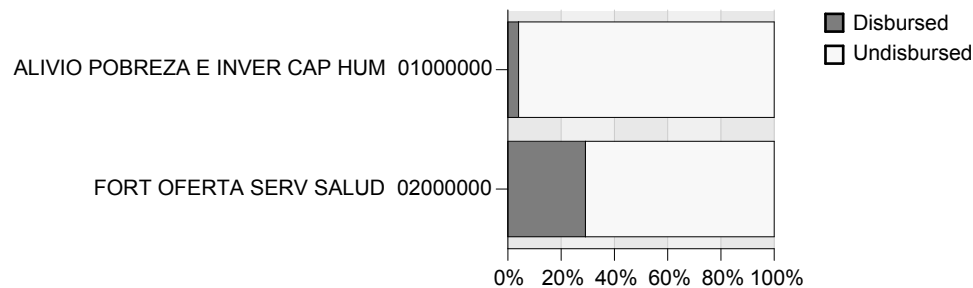

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Alivio de la Pobreza e Inversion en Capital Humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa de Pobreza extrema en beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor a nivel rural	%	61.20	2016	P		58.20
					P(a)	58.20	58.20
					A		

Details

Means of verification: Encuesta continua de Hogares

Observations: Contribuye al impacto que se mide a nivel de Programa BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 1: Salud Materna e Infantil

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de mortalidad neonatal en Hospitales financiados por el proyecto	%	12.00	2016	P		10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

Details

Means of verification: Registros Hospitalarios

Observations: Linea base obtenidos de la Unidad de Gestión de la Información de los Hospitales de Occidente. Para 2016 Intibuca, Lempira, Valle y San Pedro Sula. Para 2018 se espera añadir Copan, La Paz y Comayagua.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Nutricion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses en población de participantes del BVM	Tasa	23.10	2016	P		20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de Hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Observations: Datos del seguimiento (EDH 2013) anemia según clasificación de OMS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matricula del tercer ciclo de educacion	Students (#)	24.00	2016	P		30.00
					P(a)	30.00	30.00
					A		

Details

Means of verification: Reporte de bases de datos SACE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

	Women				P		31.00
					P(a)		31.00
					A		
	Men				P		29.00
					P(a)		29.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en las modalidades alternas	Students (#)	27.90	2016	P		32.00
					P(a)	32.00	32.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de base de datos SACE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

	Women				P		31.00
					P(a)		31.00
					A		
	Men				P		33.00
					P(a)		33.00
					A		

Outcome Nbr. 1: Salud

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 SG en los últimos 12 meses.	%	44.30	2016	P		49.00
					P(a)	49.00	49.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	% de cobertura de parto institucional por en los últimos 12 meses.	%	64.00	2016	P		69.00
					P(a)	69.00	69.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	% de cobertura en atención puerperal en los primeros 7 días post parto* en hospitales, EAFs unidades de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.3	% de atención neonatal en los primeros tres días de nacido** en hospitales, EAFs y centros de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.4	Disponibilidad de Gineco-obstetras hospitalarios 24 horas al día / 7 días de la semana en los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	70.00	2016	P		80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.5	Establecimientos de salud de primer y segundo nivel abastecidos con métodos de Planificación familiar en los 33 municipios priorizados y los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	86.40	2016	P		89.00
					P(a)	89.00	89.00
					A		

Details

Means of verification: Expedientes de los centros de salud

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.6	% de recursos humanos capacitados en el uso de la metodología de consejería en PF.	%	0.00	2016	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono Vida Mejor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	P		70.00
					P(a)	70.00	70.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	A		
Details							
Means of verification: Informes del sistema gerencial de informacion							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares beneficiarios rurales que han recibido tres transferencias en el año en municipios priorizados	%	0.00	2015	P		80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de salud de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	17.00	2015	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de educación de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	74.00	2015	P		83.00
					P(a)	83.00	83.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.4	Incremento en nivel de consumo per capita	%	0.00	2016	P		8.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.4	mensual en Hogares participantes del Piloto de graduación.	%	0.00	2016	P(a)	8.00	8.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación Fundación Capital							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Alivio de la pobreza e inversión en capital Humano.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas	Beneficiaries (#)	P	311,231	311,231	10,475,320	16,200,000
			P(a)	256,752	256,752	7,179,444	16,200,000
			A	0	0	190,000	190,000
1.2	Numero de consultorias para el fortalecimiento de la operatividad de la SSIS	Consultorias	P	170	170	1,404,100	1,404,100
			P(a)	170	170	1,274,699	1,314,699
			A	195	0	270,198	270,198
1.3	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	hogares	P	672	672	800,000	1,300,000
			P(a)	672	672	616,136	1,300,000
			A	0	0	0	485,000
1.4	Número de fichas socioeconomicas unicas levantadas	Hogares	P	15,000	20,000	129,608	194,411
			P(a)	0	20,000	0	194,411
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	Beneficiaries (#)	P	543,863	543,863	9,034,744	17,290,000
			P(a)	543,863	543,863	9,034,744	17,290,000
			A	543,863	0	2,659,323	9,353,564
2.2	Municipios beneficiarios para estrategia de malaria	Municipios	P	0	20	200,000	2,400,000
			P(a)	0	20	200,000	2,400,000
			A	0	0	0	0
2.3	Convenios de Gestión firmados con Comités de Apoyo.	Convenios	P	4	5	283,192	784,177
			P(a)	4	5	283,192	784,177
			A	4	0	216,673	717,658
2.4	Número de convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel.	Convenios	P	4	8	2,518,246	6,660,262
			P(a)	4	8	2,518,246	6,660,262
			A	2	0	1,247,755	2,437,727
2.5	Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo.	Establecimientos de salud	P	75	75	420,000	420,000
			P(a)	75	75	420,000	420,000
			A	0	0	0	0
2.6	Consultorias para Fortalecimiento Hospitalario.	Consultorias	P	2	2	137,600	175,603
			P(a)	2	2	137,600	175,603
			A	2	2	29,642	29,642
2.7	Asistencia técnica para el fortalecimiento de certificación de gestores de primer y segundo nivel	consultoría	P	0	1	50,000	75,000
			P(a)	0	1	50,000	75,000
			A	0	0	0	0
2.8	Equipamiento para establecimientos de salud y hospitales	Equipo	P	2	3	384,270	584,270
			P(a)	2	3	384,270	584,270
			A	0	0	0	0
2.9	Taller de alto nivel para análisis del sistema de salud del Conjunto Garantizado de Servicios de Salud	Taller	P	1	1	60,000	60,000
			P(a)	1	1	60,000	60,000
			A	0	0	0	0
2.10	Consultorías para el fortalecimiento institucional de la SESAL.	Consultorias	P	15	20	444,202	669,958
			P(a)	15	20	444,202	669,958
			A	0	0	222,172	427,928
2.11	Talleres para el fortalecimiento de las intervenciones en salud en los gestores de la Iniciativa de Salud Mesoamérica	talleres	P	3	11	13,274	38,615
			P(a)	3	11	13,274	38,615
			A	1	1	1,405	1,405

Other Cost

Gestión del Programa SSIS	P			304,997	661,489
	P(a)			13,391	750,890
	A			0	0
Auditoria SSIS	P			56,250	240,000
	P(a)			56,250	240,000
	A			0	0
Gestión del Programa Salud	P			490,678	692,115
	P(a)			490,678	692,115
	A			182,043	226,941
Auditoria SESAL	P			50,000	150,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria SESAL	P(a)			50,000	150,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			27,256,481	50,000,000
		P(a)			23,226,126	50,000,000
		A			5,019,211	14,140,063

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
