

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1159	Chief of Operations Validation Date	10/13/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/05/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of Foreign Trade Facilitation Services Through the Single Window(VUC	Loan Number	3546/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Sector/Subsector	TD-TFL - TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
Team Leader	MEJIA RIVAS, ISABEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1159	20,000,000	20,000,000	41,900,000	0	61,900,000	20,000,000	2,600,000	13.00%	17,400,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	41,900,000	0	61,900,000	20,000,000	2,600,000	13.00%	17,400,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

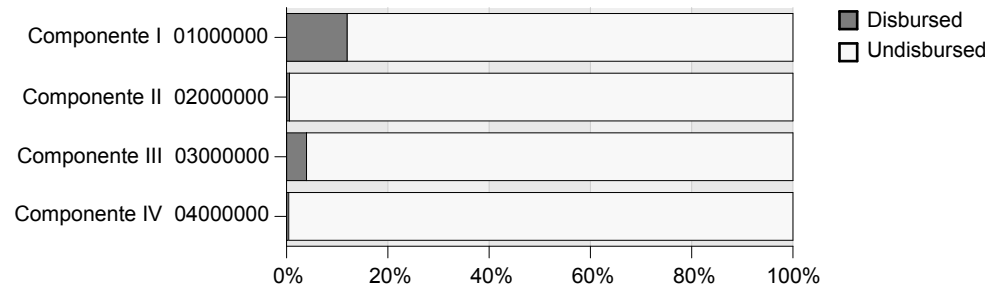

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la competitividad del sector transable a través de la reducción de costos de transacción asociados al comercio exterior

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
0.0	Ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	Posición en el ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	88.00	2016	P		85.00	85.00
					P(a)		85.00	85.00
					A			

Details

Means of verification: Medición 2021 Doing Business

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Reducción del número de días promedio para la tramitación de las operaciones de comercio exterior

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
0.0	Número de días promedio para llevar a cabo los trámites y permisos en la VUCE	días promedio de tramitación	12.67	2016	P		10.67	10.67
					P(a)		10.67	10.67
					A			
Details								
Means of verification: Datos de extraídos de la VUCE								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 1: Reducción a los costos logísticos promedio en las operaciones de comercio exterior

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
1.0	Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	Posición en el ranking Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	80.00	2016	P		77.00	77.00
					P(a)		77.00	77.00
					A			
Details								
Means of verification: Estudio Banco Mundial								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Nuevo flujograma de procesos de comercio exterior consensuado con las entidades involucradas	Flujograma	P		1	2,694,500	3,170,000
			P(a)		1	2,015,563	3,170,000
			A		0	546,444	931,954.03
1.2	Reporte sobre Talleres de Trabajo	Talleres	P	2	3	30,000	30,000
			P(a)	2	3	20,000	30,000
			A		0		0
1.3	Reporte sobre Homologación de datos	Reporte	P		1	500,000	500,000
			P(a)		1	111,318	500,000
			A		0	2,774	6,444.81
1.4	Instrumentos de control y manejo de riesgos diseñados e implementados en las entidades de control	Entidades	P		6	400,000	400,000
			P(a)		6		400,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente II: Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Plataforma VUCE	P		1	6,789,225	19,152,000
			P(a)		1	669,169	19,152,000
			A		0	107,305	129,037.41
2.2	Reporte sobre infraestructura de hardware para la VUCE 2.0	Reporte	P		1	1,372,500	2,745,000
			P(a)		1	159,104	2,745,000
			A		0		0
2.3	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	Entidades	P		8	4,902,000	6,603,000
			P(a)		8	82,746	6,603,000
			A		0		0
2.4	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento	Países con los que se interope	P	2	3	175,000	500,000
			P(a)	2	3	8,358	500,000
			A		0	1,671	1,671
2.5	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento	Reporte	P		1	50,000	500,000
			P(a)		1	64,030	500,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Servicios de información para el comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento	Sistemas	P		5	851,667	6,900,000
			P(a)		5	148,915	6,900,000
			A		0	959	959
3.2	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	Plataforma	P		1	1,141,667	3,250,000
			P(a)		1	197,736	3,250,000
			A		0		0
3.3	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Reporte	P		1	1,941,667	5,250,000
			P(a)		1	206,134	5,250,000
			A		0	146,505	386,047.38
3.4	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Reporte	P		1		3,100,000
			P(a)		1	209,930	3,100,000
			A		0	25,942	43,242.46
3.5	Programas de e-learning de capacitación a usuarios privados y entidades de control implementados	Programas	P		5	37,500	1,200,000
			P(a)		5		1,200,000
			A		0		0

Component Nbr. 4 Componente IV: Transferencia de conocimiento y gestión del cambio

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
4.1	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Estrategias	P	1	4	100,000	1,500,000
			P(a)	1	4	112,090	1,500,000
			A	1	2	52,129	56,714.92
4.2	Estrategias implementadas de gestión del cambio	Estrategias	P		3		1,900,000
			P(a)		3	172,000	1,900,000
			A		0		0

Other Cost

Gestión del Proyecto: Unidad de Gestión	P			790,000	3,950,000
	P(a)			502,734	3,049,999.95
	A			244,450	578,215.95
Gestión del Proyecto: Adecuación física para la Unidad Ejecutora	P			60,000	300,000
	P(a)			331,363	1,200,000.05
	A			232,688	569,163.08
Gestión del Proyecto: Evaluaciones	P				600,000
	P(a)			11,940	600,000
	A				0
Gestión del Proyecto: Auditorías	P			70,000	350,000
	P(a)				350,000
	A				0

Total Cost

Total Cost	P			21,905,726	61,900,000
	P(a)			5,023,130	61,900,000
	A			1,360,867	2,703,450.04

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
