

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1068	Chief of Operations Validation Date	04/25/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	04/16/19	Country Representative Validation Date	04/30/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Rural Development and Family Agriculture, PRODAF	Loan Number	2740/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Sector/Subsector	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Team Leader	MILEWSKI, JOSEPH CHRISTOFER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1068	30,000,000	30,000,000	11,000,000	0	41,000,000	30,000,000	23,870,000	79.57%	6,130,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	11,000,000	0	41,000,000	30,000,000	23,870,000	79.57%	6,130,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

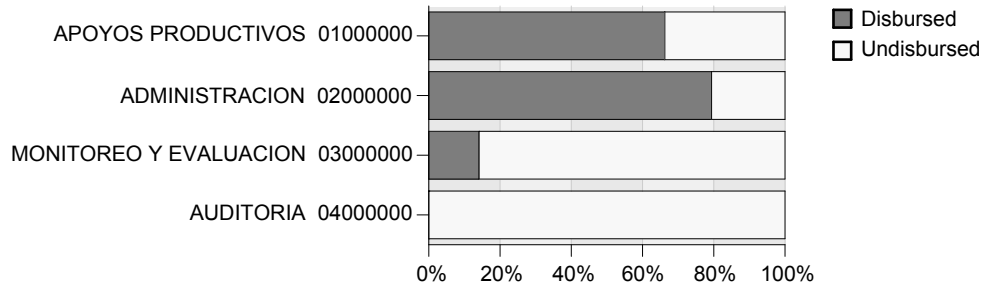

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de los ingresos netos agropecuarios promedio de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios en el Chaco y Entre Ríos.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

Observations: El indicador es 0 en la LB por construcción. El grupo de control será construido de manera que tenga características observables claves iguales al grupo de beneficiarios en la LB (ver plan monitoreo y evaluación). Supuestos:a) Situación económica nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017

Observations: Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
2.1	Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			50.00
					P(a)			50.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

Observations: Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
3.1	Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P			20.00
					P(a)			20.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

Observations: Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes	P		2		792,000
			P(a)	0	2	0	1,111,262
			A	0	2	0	1,111,262
1.2	Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas	P		71		126,000
			P(a)	0	109	0	46,000
			A	0	109	0	46,000
1.3	Planes de difusión ejecutados	Planes	P		4		282,000
			P(a)	0	4		46,200
			A	0	4	0	46,200
1.4	Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos	P		100		190,000
			P(a)	36	100	91,000	30,000
			A	15	79	0	30,000
1.5	Planes de Negocios formulados	Planes	P		360		282,000
			P(a)	227	2,175	46,000	136,000
			A	270	2,133	0	136,000
1.6	Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios	P		8		528,000
			P(a)	1	0	100,000	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo	P		1		9,950,000
			P(a)	0	1		771,000
			A	0	1	0	771,000
2.2	Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes	P		300		23,000,000
			P(a)	548	1,867	5,000,000	18,624,957
			A	283	1,825	2,464,432	18,234,957
2.3	Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Farmers (#)	P		2,060		3,350,000
			P(a)	579	2,235	500,000	1,681,057
			A	303	2,190	269,057	1,601,057

Component Nbr. 3 Coordinación y administración del proyecto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Coordinación y administración del proyecto	P				1,800,000
		P(a)			500,000	2,397,103
		A			255,103	2,377,103
	Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	P				500,000
		P(a)			272,000	228,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	A			0	228,000
--	---	---	--	--	---	---------

Total Cost

	Total Cost	P				40,800,000
		P(a)			6,509,000	25,071,579
		A			2,988,592	24,581,579

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	LMIRANDA	04/16/2019
					MSGOMEZ	03/12/2019
	Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	03/12/2019
	Fondo de garantía constituido y transferido	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
	Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
	Planes de Negocios formulados	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	03/12/2019
	Planes de difusión ejecutados	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
					VANINAD	04/12/2019
	Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	03/12/2019
	Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Replanificacion segun informe enviado por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	VANINAD	03/25/2019
				Modify Financial P(a) value	MSGOMEZ	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	MSGOMEZ	03/12/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design
