

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1251	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/15/19
Last Update	04/12/19	Country Representative Validation Date	04/25/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Implementation of the National System for the Argentine International Trade Single Window	Loan Number	3869/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Producción de la Nación	Sector/Subsector	TD-TFL - TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
Team Leader	BEITLER, ADY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1251	73,600,000	73,600,000	8,400,000	0	82,000,000	73,600,000	4,200,000	5.71%	69,400,000
Aggregated	73,600,000	73,600,000	8,400,000	0	82,000,000	73,600,000	4,200,000	5.71%	69,400,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

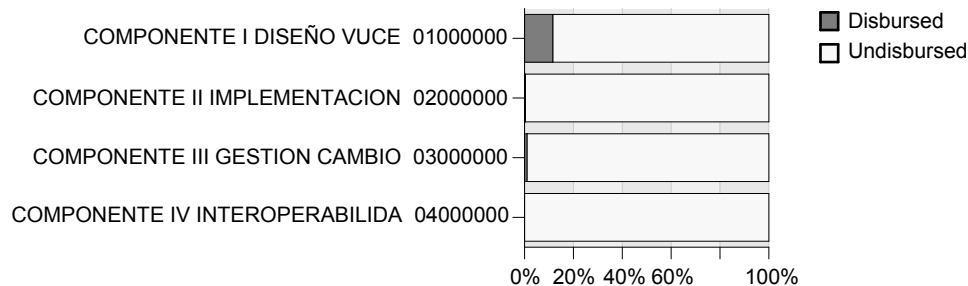

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar el nivel absoluto de desempeño de la economía en materia regulatoria y comercial externo

Observation: El indicador 1.1 permite dar cuenta de la distancia entre el desempeño de una economía en particular y el mejor desempeño a nivel global. Además permite evaluar el cambio absoluto en el entorno regulatorio de una economía a través del tiempo. El indicador 1.2 captura el crecimiento promedio diferencial de las exportaciones e importaciones y sus componentes a nivel de firma producto destino (en concreto, diferencia entre flujos tratados y flujos no tratados)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Calificación en el ranking "Distancia a la frontera en comercio transfronterizo" del Doing Business	Puntaje	53.00	2016	P		63.00
					P(a)		63.00
					A		

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Crecimiento del comercio	Porcentaje	0.00	2017	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: .

Observation: Unidad de medida: Ranking "Comercio Transfronterizo", Doing Business Report, Banco Mundial. Se suman indicadores de cumplimientos fronterizos y documentales. Nota: Dadas las limitaciones de datos, estos son los indicadores que se utilizarán por el momento. Se espera ajustarlos una vez que se tenga acceso a información transaccional del comercio y tiempos de la base de datos de Aduana/AFIP-VUCE.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Horas promedio para importar de empresas beneficiarias	Horas	636.00	2016	P		200.00
					P(a)		200.00
					A		

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Observations: Unidad de medida: Ranking "Comercio Transfronterizo", Doing Business Report, Banco Mundial. Se suman indicadores de cumplimientos fronterizos y documentales. Nota: Dadas las limitaciones de datos, estos son los indicadores que se utilizarán por el momento. Se espera ajustarlos una vez que se tenga acceso a información transaccional del comercio y tiempos de la base de datos de Aduana/AFIP-VUCE.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Horas promedio para exportar de empresas beneficiarias	Horas	51.00	2016	P		30.00
					P(a)		30.00
					A		

Details

Means of verification: Medición 2022 Doing Business Report, Banco Mundial

Observations: Unidad de medida: Ranking "Comercio Transfronterizo", Doing Business Report, Banco Mundial. Se suman indicadores de cumplimientos fronterizos y documentales. Nota: Dadas las limitaciones de datos, estos son los indicadores que se utilizarán por el momento. Se espera ajustarlos una vez que se tenga acceso a información transaccional del comercio y tiempos de la base de datos de Aduana/AFIP-VUCE.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: .

Observation: Se busca una mayor inserción internacional competitiva del sector productivo, particularmente de las PYME.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Crecimiento del número de PYME exportadoras en mercados dados (pares producto-destino)	Porcentaje	0.00	2017	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Aduana/AFIP-VUCE

Observations: Se busca una mayor inserción internacional competitiva del sector productivo, particularmente de las PYME.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: .

Observation: Como parte del programa, se prevé levantar línea de base y meta a través de encuestas sobre percepción general de eficiencia de procesos de las entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Percepción general sobre eficiencia de entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes	Puntaje	0.00	2017	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

Details

Means of verification: Encuestas

Observations: Como parte del programa, se prevé levantar línea de base y meta a través de encuestas sobre percepción general de eficiencia de procesos de las entidades de control que representan el 80% del volumen de permisos, licencias o autorizaciones emitidas para importación, exportación y tránsito de bienes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 - Diseño de la VUCEA y reingeniería de procesos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Relevamiento institucional presentado (incluyendo: principales instituciones participantes, sus roles y funciones previstas, y los procesos posibles de incorporarse a la nueva plataforma)	relevamiento	P		1		1,434,125
			P(a)		1	0	144,696
			A		1	0	144,696
1.2	Análisis de brechas relevadas y propuestas de mejora presentado (GAP análisis COMEX realizado)	análisis	P	1	1	1,434,125	1,434,125
			P(a)	1	5	1,169,706	2,832,016
			A	1	1	746,240	746,240
1.3	Diseño de Integración entre sistemas, VUCEA y todas las entidades, basada en arquitectura BPM y servicios web presentado (diseño de VUCE core realizado)	Diseño	P		1	1,370,834	2,099,500
			P(a)	1	5	1,056,106	2,258,100
			A	1	1	78,752	78,752
1.4	Organismos integrados a VUCE con trámites digitalizados	formularios	P	15	15	717,062.5	717,062.5
			P(a)		15	0	450,000
			A	0	0	0	0
1.5	Diseño de adecuaciones y homologaciones normativas y procesales de todas las instituciones involucradas presentado al Comité	documento	P	1	1	2,121,187.5	2,151,187.5
			P(a)	1	5	531,075	2,151,188
			A	1	2	22,771	34,748

Component Nbr. 2 Componente 2 - Implementación de la VUCEA y armonización tecnológica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Equipamiento Plataforma tecnológica, software y hardware para interconexión de la VUCEA adquirido	equipamiento	P		1	10,000,000	31,200,000
			P(a)		1	191,481	31,200,000
			A		0	690,142	690,142
2.2	Equipamiento Plataforma tecnológica, software y hardware para interconexión de terceros organismos adquirido	Equipamiento	P		1		22,042,500
			P(a)		1	0	22,042,500
			A		0	0	0
2.3	Fases funcionales del portal y sistema VUCEA en funcionamiento	Fases	P		1	4,808,125	13,737,500
			P(a)		1	163,000	13,737,500
			A		0	158,324	158,324

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3 - Gestión del cambio y coordinación interinstitucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	Plan de capacitación diseñado y presentado	plan	P	1	4	269,054	541,200
			P(a)	1	4	0	541,200
			A	1	2	0	0
3.2	Número de cursos de capacitación realizados (Los cursos estarán dirigidos a agentes de aduanas, agentes navieros, funcionarios, importadores y exportadores a través de las cámaras y asociaciones)	cursos	P	1	4	270,600	1,141,200
			P(a)	1	4	0	1,141,200
			A	1	2	0	0
3.3	Centro de atención VUCE en operación	Centro	P	1	1		1,351,200
			P(a)	0	1	0	1,351,200
			A	0	0	0	0
3.4	Actividades de difusión de VUCE realizada	Actividades	P	1	5	108,240	541,200
			P(a)	1	5	0	541,200
			A	1	2	0	43,462
3.5	Gestión del Cambio - Plan de mejora de RRHH diseñado	Plan	P	1	3	270,600	541,200
			P(a)	0	3	0	541,200
			A	0	0	0	0
3.6	Sistema de calidad implementado	Sistema	P		1	150,000	900,000
			P(a)		1	0	900,000
			A		0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4 - Gestión de interoperabilidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
4.1	Acuerdos de cooperación interinstitucional con actores privados firmados	acuerdos	P	15	50	30,000	100,000
			P(a)	13	50	0	100,000
			A	13	15	0	0
4.2	Acuerdos de cooperación interinstitucional internacionales firmados	Integration agreements and coo	P	0	5		100,000
			P(a)	0	5	0	100,000
			A	0	0	0	0
4.3	Acuerdos de cooperación interinstitucional con actores públicos firmados	Acuerdos	P	2	5	40,000	100,000
			P(a)	1	5	0	100,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestión del Programa	P			393,263	1,868,000
		P(a)			153,673	1,868,000
		A			86,720	138,727

Total Cost

	Total Cost	P			21,983,091	82,000,000
		P(a)			3,265,041	82,000,000
		A			1,782,949	2,035,091

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Diseño de adecuaciones y homologaciones normativas y procesales de todas las instituciones involucradas presentado al Comité	Debido a restricciones presupuestarias para el ejercicio 2019, fue necesario readecuar la planificacion financiera del producto, en función a la criticidad de las actividades para el mejor desarrollo del programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	VANINAD	03/15/2019
	Equipamiento Plataforma tecnológica, software y hardware para interconexión de la VUCEA adquirido		Modify Output	Modify Financial P(a) value	VANINAD	03/15/2019
	Fases funcionales del portal y sistema VUCEA en funcionamiento		Modify Output	Modify Financial P(a) value	VANINAD	03/15/2019
	Organismos integrados a VUCE con trámites digitalizados	Debido a restricciones presupuestarias para el ejercicio 2019, fue necesario readecuar la planificacion financiera del producto, en función a la criticidad de las actividades para el mejor desarrollo del programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	VANINAD	03/15/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Organizational and Managerial Dimensions
