

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1064	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	05/07/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/08/19
<b>Last Update</b>	05/07/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/09/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program	<b>Loan Number</b>	2719/BL-BO, 2719/BL-BO-1, 2719/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	<b>Sector/Subsector</b>	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	JOHANNSEN, JULIA	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Estado Plurinacional de Bolivia		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B(R)	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1064	20,000,000	19,342,993.75	2,000,000	0	22,000,000	19,342,993.75	19,342,993.75	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>20,000,000</b>	<b>19,342,993.75</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,342,993.75</b>	<b>19,342,993.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

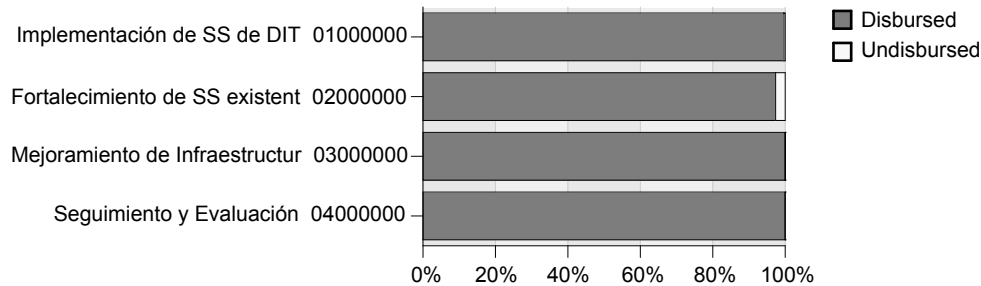

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Contribuir a mejorar en forma sostenible y con pertinencia cultural, el desarrollo cognitivo, socio-emocional y físico de niñas y niños bolivianos

**Observation:** Los indicadores son desagregados por sexo y culturalmente adecuados en cuanto a su instrumento de medición.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.0	Porcentaje de niños/as rezagados en desarrollo cognitivo (test psicomotor y de lenguaje) (en municipios intervenidos)	%	10.80	2014	P		
					P(a)	10.20	
					A	10.60	10.60

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales del ejecutor, con base en la evaluación de impacto del programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.2	Porcentaje de niños/as con desnutrición crónica (en municipios intervenidos)	%	21.00	2008	P		
					P(a)	17.00	
					A	15.70	15.70

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales del ejecutor, con base en las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición.

**Observations:** El valor indicado de línea de base proviene de la ENSA 2008 y se refiere a la población nacional de 6-24 meses. El endline a la ENSA 2016.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados	Beneficiaries (#)	0.00	2012	P	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00		23,600.00
					P(a)	0.00	0.00		14,600.00	14,600.00		23,600.00
					A	0.00	0.00	0.00	338.00	4,734.00	8,956.00	17,810.00

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

**Observations:** El indicador P/P(a) se basaba sobre el siguiente supuesto de cobertura: Salas de estimulación: 9000 (40 equipos\*225), diferentes niños/as atendidos cada año de ejecución. Visitas comunitarias: 5600 (140 educadores\*40), mismos niños/as atendidos cada año de ejecución, solo cuentan una vez.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.	Beneficiarios	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00		4,625.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00		4,625.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.00	11,060.00

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

**Observations:** El indicador se basa en el supuesto que los niños nacidos en instituciones de salud y al menos el 25% de los niños participantes en las modalidades DIT sean registrados.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados	Tasa	2012	P			40.00	40.00				40.00
				P(a)				40.00	40.00			40.00
				A			0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20

#### Details

**Means of verification:** informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

**Observations:** Costeo y dimensionamiento de brigadas prevé 40 niños/ educador y semana en brigada móvil

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles	Tasa	9.70	2012	P								
					P(a)								9.00
					A							8.80	8.80

#### Details

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	Porcentaje	0.00	2012	P	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00			75.00
					P(a)	0.00	0.00		25.00	50.00			75.00
					A	0.00	0.00	0.00	70.00	79.00	94.00	94.90	94.90

#### Details

**Means of verification:** informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

**Observations:** El indicador incluye personal existente actualmente (cuidadores comunitarios).

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	1.1.1 Personal de Centros Infantiles capacitado en currículo de centros infantiles (educadores comunitarios, facilitadores y nutricionistas).	Personas	P		520		368,000
			P(a)	79	743	0	563,916.96
			A	103	767	0	563,916.96
1.2	1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando ( facilitadores y nutricionistas)	Personas	P		250		5,395,140
			P(a)	22	110	297,254	2,430,419.67
			A	22	112	290,294.65	2,423,460.32
1.3	1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en Salas de Estimulación Temprana - rezago	Personas	P		60		1,620,000
			P(a)	75	75	301,030.57	2,293,351.93
			A	71	76	349,023	2,341,344.36
1.4	1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos	P		2		430,000
			P(a)	0	2	100,000	280,000
			A	0	2	8,593.1	188,593.1
1.5	1.3.2 Convenios intergubernativos suscritos (MS, GAD (SEDES y SEDEGES), GAM)	Convenios	P		1		30,000
			P(a)	3	36	7,662.44	35,379.64
			A	0	33	4,085.78	31,802.98
1.6	1.3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para SEDES y SEDEGES.	Sistema	P		1		292,286
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.7	1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Fondo	P		1		1,600,579
			P(a)	0	0	0	17,163.26
			A	0	0	0	17,163.26

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Personas	P		500		60,000
			P(a)	0	707	27,218.66	77,000
			A	0	707	2,829.15	52,610.49
2.2	2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando	Personas	P		140		2,956,461
			P(a)	180	180	513,011.14	3,057,766.76
			A	195	202	738,993.42	3,283,749.04
2.3	2.3.1 Normas y protocolos sectoriales de DIT revisados y/o complementados	Documentos	P		2		330,000
			P(a)	0	2	0	277,538.53
			A	0	2	12,135.57	289,674.1
2.4	2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Personas	P		500		68,000
			P(a)	0	1,079	10,000	10,000
			A	0	1,079	0	0
2.5	2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada e implementada	Estrategia	P		1		150,000
			P(a)	0	0	60,001	125,912.91
			A	0	0	0	65,911.91

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Mejoramiento de infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1	3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Diseños	P		90		303,837.18
			P(a)	0	30	0	251,926.07
			A	0	30	0	251,926.07
3.2	3.2 Centros infantiles readecuados y/o construidos según estándares	Centros	P		90		4,760,115.82
			P(a)	0	48	0	6,947,854.44
			A	0	48	0	6,947,854.44
3.3	3.3 Centros Infantiles equipados según estándares	Centros	P		0		0
			P(a)	0	50	0	815,177.77
			A	0	50	0	815,177.77
3.4	3.4 Pre-inversión de salas de rezago realizada y aprobada	Diseños	P		40		101,515.56
			P(a)	0	40	0	0.01
			A	0	40	0	0.01
3.5	3.5 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Salas	P		40		1,590,410.44
			P(a)	0	40	0	820,182.76
			A	0	40	0	820,182.76

## Component Nbr. 4 Seguimiento y evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
4.1	4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Sistema	P		1		218,000
			P(a)	1	1	142,523	142,523
			A	1	1	75,594.31	75,594.31
4.2	Evaluación final contratada	Consultoría	P		1		50,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
4.3	Evaluación de impacto y procesos contratada	Consultoría	P		1		450,000
			P(a)	1	1	502,463.82	560,845.67
			A	2	2	365,350.7	423,732.55

## Component Nbr. 5 Administración y Auditoría

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y personal departamental	P				770,081
		P(a)			345,802	1,335,489.77
		A			156,096.91	1,145,784.68
	Auditoría	P				100,000
		P(a)			52,629.49	149,999.9
		A			46,143.54	143,513.95
	Administración (7%) FPS	P				355,574
		P(a)			0	618,352.5

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administración (7%) FPS	A			0	618,352.5
--	-------------------------	---	--	--	---	-----------

Total Cost

	Total Cost	P				22,000,000
		P(a)			2,359,596.12	20,810,801.55
		A			2,049,140.13	20,500,345.56

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Contribuir a mejorar en forma sostenible y con pertinencia cultural, el desarrollo cognitivo, socio-emocional y físico de niñas y niños bolivianos	No se hizo ningún ajuste a la redacción del objetivo	Modify Impact	Modify Statement	CLUNSTEDT	03/21/2019
	Niñas menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	Se modificó el indicador por error, previo a su inactivacion. Se inactivó la version desagregada por genero para mantener la redacción original de la MR (un solo indicador agregado), en consistencia con lo acordado con el management de SPD/SDV en el taller de PCR en febrero 2019.	Modify Impact	Inactivate Impact	CLUNSTEDT	03/28/2019
			Modify Impact Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	CLUNSTEDT	03/21/2019
	Niñas menores de 4 años rezagadas en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje segun modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	Se inactivó la version desagregada por genero para mantener la redacción original de la MR (un solo indicador agregado), en consistencia con lo acordado con el management de SPD/SDV en el taller de PCR en febrero 2019.	Modify Impact	Inactivate Impact	CLUNSTEDT	03/28/2019
	Porcentaje de niños/as con desnutrición crónica (en municipios intervenidos)	Se volvió a la redacción original de este indicador segun la MR del POD (un solo indicador agregado para ambos sexos y con la referencia a los municipios intervenidos en parentesis, ya que el indicador reporta el proxy de desnutricion al nivel nacional, tal como en la MR del POD). Los means of verification fueron ajustados en consistencia con el indicador reportado en la MR del POD (con base en las encuestas nacionales de salud y nutricion). De acuerdo al POD, el año de línea de base es el 2008, por lo que se ajustó este dato.	Modify Impact Indicator	Modify Indicator name	JJOHANNSEN	04/16/2019
				Modify Means of Verification	JJOHANNSEN	04/16/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	CLUNSTEDT	04/17/2019
	Porcentaje de niños/as con desnutrición crónica en municipios intervenidos	Se volvió a la redacción original de este indicador segun la MR del POD (un solo indicador agregado para ambos sexos).	Modify Impact Indicator	Modify Indicator name	CLUNSTEDT	03/21/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	CLUNSTEDT	03/21/2019
	Porcentaje de niños/as rezagados en desarrollo cognitivo (test psicomotor y de lenguaje) (en municipios intervenidos)	Se volvió a la redacción original de este indicador segun la MR del POD (un solo indicador agregado para ambos sexos). Los means of verification fueron ajustados en consistencia con lo establecido en la MR del POD (con referencia a la evaluacion de impacto).	Modify Impact Indicator	Modify Indicator name	CLUNSTEDT	03/21/2019
				Modify Means of Verification	JJOHANNSEN	04/16/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	CLUNSTEDT	03/21/2019



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact Indicator	Niños menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	Se había desagregado el indicador de este impacto, pero se lo inactivó para mantener la redacción original de la MdR.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	CLUNSTEDT	03/21/2019
	Niños menores de 4 años rezagados en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje según módulo de comunicación del ASQ) en municipios intervenidos.	Se había desagregado el indicador de este impacto, pero se lo inactivó para mantener la redacción original de la MdR.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	CLUNSTEDT	03/21/2019
	Porcentaje de niños/as con desnutrición crónica en municipios intervenidos	Se eliminó el valor logrado 2017 que había sido ingresado erróneamente por el equipo como A 2017, siendo en realidad el valor P(a) 2018.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	JJOHANNSEN	04/11/2019
	Porcentaje de niños/as rezagados en desarrollo cognitivo (test psicomotor y de lenguaje) (en municipios intervenidos)	Se eliminó el valor logrado 2017 que había sido ingresado erróneamente por el equipo como A 2017, siendo en realidad el valor P(a) 2018.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	JJOHANNSEN	04/11/2019
Outcome	Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	No se realizó ningún ajuste.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	CLUNSTEDT	03/28/2019
	Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	La redacción de la MR del POD no era clara, ofreciendo la redacción del indicador de manera agregada para 0-4 años, con metas desagregadas para los grupos de 0-2 y 2-4 años. De acuerdo a lo acordado con el management de SPD en el taller de PCR en febrero 2019, se inactivaron los dos indicadores desagregados por grupo etéreo y se volvió a crear uno nuevo para mantener la redacción original de la MR de un solo grupo etéreo agregado, debido a que no es posible medir de manera separada por grupo etéreo.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	CLUNSTEDT	03/28/2019
	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles	La redacción de la MR del POD no era clara, ofreciendo la redacción del indicador de manera agregada para 0-4 años, con metas desagregadas para los grupos de 0-2 y 2-4 años. De acuerdo a lo acordado con el management de SPD en el taller de PCR en febrero 2019, se inactivaron los dos indicadores desagregados por grupo etéreo y se volvió a crear uno nuevo para mantener la redacción original de la MR de un solo grupo etéreo agregado, debido a que no es posible medir de manera separada por grupo etéreo.	Create Outcome Indicator	N/A	CLUNSTEDT	03/28/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify Unit of Measure	CLUNSTEDT	03/28/2019
	Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	La redacción de la MR del POD no era clara, ofreciendo la redacción del indicador de manera agregada para 0-4 años, con metas desagregadas para los grupos de 0-2 y 2-4 años. De acuerdo a lo acordado con el management de SPD en el taller de PCR en febrero 2019, se inactivaron los dos indicadores desagregados por grupo etéreo y se volvió a crear uno nuevo para mantener la redacción original de la MR de un solo grupo etéreo agregado, debido a que no es posible medir de manera separada por grupo etéreo.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	CLUNSTEDT	03/28/2019
Outcome indicator	Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.	Recién el la Ayuda Memoria de cierre de la operación, el ejecutor reportó los resultados logrados desde 2015 (EZSHARE-423336656-20).	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	CLUNSTEDT	04/12/2019
					JJOHANNSEN	04/12/2019
	Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados	Recién el la Ayuda Memoria de cierre de la operación, el ejecutor reportó los resultados logrados desde 2015 y se les ingresó al sistema (EZSHARE-423336656-20).	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	CLUNSTEDT	04/12/2019
	Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	Recién el la Ayuda Memoria de cierre de la operación, el ejecutor reportó los resultados logrados desde 2015 y se les ingresó al sistema (EZSHARE-423336656-20).	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	CLUNSTEDT	04/12/2019

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados	Recién el la Ayuda Memoria de cierre de la operación, el ejecutor reportó los resultados logrados desde 2015 y se les ingresó al sistema (EZSHARE-423336656-20).	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	CLUNSTEDT	04/12/2019
Output	1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando ( facilitadores y nutricionistas)	Se ingresaron los valores financieros de este producto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019
				Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en Salas de Estimulación Temprana - rezago	Se ingresaron los valores financieros de este producto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019
				Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Se ingresaron los valores financieros de este producto. (El producto no fue logrado. En 2014 se definió que, como faltaban recursos para otros productos prioritarios, este producto no se realizaría, reasignando los recursos destinados a otros productos.)	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019
				Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando	Se ingresaron los valores financieros de este producto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019
				Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	2.3.1 Normas y protocolos sectoriales de DIT revisados y/o complementados	Se ingresaron los valores financieros de este producto. Por ej., se complementó "cero" en 2018 para que no se generen observaciones del sistema en "verify content".	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019
				Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada e implementada	Se ingresaron los valores financieros de este producto. (No se logró el producto. En 2015 se había contratado a la empresa TRIGo para que desarrollara la estrategia de información, educación y difusión, la cual posteriormente sería implementada, sin embargo, el área técnica del Ministerio no estuvo de acuerdo con los productos que había entregado la firma, por lo que decidieron resolver el contrato. En su lugar, el BID apoyó con videos para la socialización, tanto para los beneficiarios como para las autoridades.)	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019
				Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	Evaluación de impacto y procesos contratada	Se ingresaron los valores financieros de las dos evaluaciones de impacto realizadas, la correspondiente a centros infantiles y la de brigadas móviles.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Evaluación de impacto y procesos contratada	Se ingresaron los valores financieros de las dos evaluaciones de impacto realizadas, la correspondiente a centros infantiles y la de brigadas móviles.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CLUNSTEDT	03/14/2019
	Paquete de especificaciones técnicas de equipamiento de centros infantiles elaborado	Se ingresaron los valores fisicos de este producto. (Se trata de un hito que no fue reportado en su momento en 2017)	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	CLUNSTEDT	03/14/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
