

PMR Operational Report

Operation Number	CH-L1082	Chief of Operations Validation Date	03/25/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/25/19
Last Update	03/25/19	Country Representative Validation Date	05/04/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Early Childhood Education Expansion and Improvement Program	Loan Number	3380/OC-CH
Executing Agency	La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ministerio de Educación de Chile	Sector/Subsector	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Team Leader	BOS, MARIA SOLEDAD	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	CHILE
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1082	75,000,000	69,590,000	69,770,000	0	144,770,000	69,590,000	68,845,082.15	98.93%	744,917.85
Aggregated	75,000,000	69,590,000	69,770,000	0	144,770,000	69,590,000	68,845,082.15	98.93%	744,917.85

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

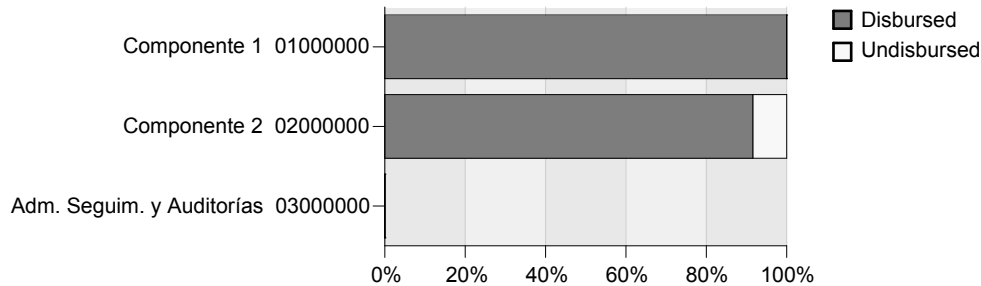

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Aumento en el puntaje de las escalas ITES y ECERS

Observation: Se medirá en términos de aumento logrado en el puntaje de ITES y ECERS. Escalas de evaluación de contextos educativos infantiles ITES y ECERS. El instrumento está compuesto por 7 áreas o dimensiones. Sus puntuaciones se suman proporcionando una valoración media de cada área evaluada, y la media total de ellas ofrece una media general que puede ser interpretada como nivel de calidad del aula en general. El aumento esperado en la meta final corresponde aproximadamente a 1 punto de las escalas.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Aumento en el promedio general de los puntajes de Iters y ECERS entre mediciones.	%	0.00	2015	P		15.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de Impacto del Programa

Observations: El aumento esperado en la meta final corresponde aproximadamente a 1 punto de las escalas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Impact Nbr. 1: Ampliación de cobertura de educación inicial en niños menores de 24 meses en las comunas beneficiarias del Programa.

Observation: Corresponde a la variación anual de la oferta de atención en salas cuna en las comunas de referencia. El cálculo se hará tomando como referencia el número de niños y niñas menores de 24 meses que asisten a las salas cuna , dividido por el número estimado de niños de esas edades en la comuna al momento de la medición de la línea de base y que representan la demanda potencial por servicio de salas cuna y multiplicado por 100.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.0	Aumento de la cobertura	%	21.20	2015	P		25.90
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informe del Ministerio

Observations: Corresponde a la variación anual de la oferta de atención en salas cuna en las comunas de referencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Ampliación de cobertura de educación inicial (nivel medio) en niños entre 24 y 48 meses en las comunas beneficiarias del Programa.

Observation: Corresponde a la variación anual de la oferta de educación inicial de nivel medio en las comunas de referencia. El cálculo se hará tomando como referencia el número de niños y niñas entre 24 y 48 meses que asisten a a educación inicial de nivel medio (en establecimientos de la red pública o que reciben este tipo de financiamiento) , dividido por el número estimado de niños de esas edades en la comuna al momento de la medición de la línea de base y que representan la demanda potencial por educación inicial en nivel medio multiplicado por 100.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.0	Aumento de Cobertura	%	41.10	2015	P		45.30
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe del Ministerio							
Observations: Corresponde a la variación anual de la oferta de atención en salascuna en las comunas de referencia.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Niños matriculados en las nuevas salas cuna

Observation: Fuente UCP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Número de niños matriculados en las nuevas salas cuna	Students (#)	0.00	2015	P		2,160.00	2,220.00			4,380.00
					P(a)			1,880.00	1,791.00	104.00	
					A	20.00	860.00	1,709.00	718.00		3,313.00

Details

Means of verification: Informe Organismo Ejecutor

Observations: Fuente de datos para verificación del cumplimiento de metas.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
	(a) girls				P		1,080.00	1,110.00			2,190.00
					P(a)						0.00
					A	10.00	430.00	855.00	363.00	0.00	1,601.00
	(b) boys				P		1,080.00	1,110.00			2,190.00
					P(a)						0.00
					A	10.00	430.00	854.00	355.00	0.00	1,712.00

Outcome Nbr. 1: Niños matriculados en niveles medios nuevos

Observation: Fuente UCP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.0	Número de niños matriculados en los nuevos jardines infantiles de nivel medio	Students (#)	0.00	2015	P		2,352.00	2,328.00			4,680.00
					P(a)			2,464.00	1,451.00	0.00	3,915.00
					A		1,148.00	2,081.00	826.00		4,055.00

Details

Means of verification: Informe del Organismo Ejecutor

Observations: Fuente de datos para verificación del cumplimiento de metas.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
	(a) girls				P		1,176.00	1,164.00			2,340.00
					P(a)						0.00
					A		574.00	840.00	524.00	236.00	2,145.00
	(b) boys				P		1,176.00	1,164.00			2,340.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	(b) boys				P(a)						0.00
					A		574.00	840.00	555.00	187.00	2,171.00

Outcome Nbr. 2: Propuesta de estrategia de reducción de las brechas en los establecimientos antiguos en relación con los nuevos estándares

Observation: Este resultado corresponde a la integración de información procedente del diagnóstico que se hará del universo de establecimientos de educación parvularia que reciben financiamiento público, en relación a los nuevos estándares para la obtención del reconocimiento oficial de contenidos en la Ley General de Educación. Esto permitirá identificar posibles alternativas de actuación para nivelar a los establecimientos que se encuentren por debajo de los estándares, y su planificación generará una estrategia de reducción de brechas. Fuente UCP.

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura parvularia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Salas cuna nuevas y equipadas	número	P		219		64,800,725
			P(a)	26	190		64,800,725
			A	26	190	1,369,293	68,929,980.94
1.2	Niveles medio nuevos y equipados	número	P		195		57,699,275
			P(a)	25	169		57,699,275.06
			A	14	169	1,379,293	61,578,568.06

Component Nbr. 2 Apoyo al aseguramiento de estándares de calidad en la educación parvularia y monitoreo y evaluación del Programa.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Supervisores Capacitados	Teachers (#)	P	135	270		890,000
			P(a)	97	483	217,801	1,063,013
			A	97	483	197,656	1,042,868
2.2	Educadores y técnicos capacitados	Teachers (#)	P	2,000	8,000	2,240,000	9,970,000
			P(a)	2,500	9,907	4,184,567	9,796,987
			A	3,211	9,907	2,890,618	8,503,038
2.3	Sistema gestión de párvulos	número	P	1	1		2,500,000
			P(a)	0	1	144,697	337,517
			A	0	0	38,918	126,187
2.4	Sistema de Gestión de RRHH	número	P	1	1		2,500,000
			P(a)	0	1	1,973,812	2,486,183.86
			A	0	0	247,884	1,961,890
2.5	Reporte de evaluación de la calidad de los contextos para el aprendizaje de los párvulos	número	P	1	1	0	1,000,000
			P(a)	1	1	806,653	193,347
			A	1	1	0	193,347

Other Cost

	Administración, seguimiento y auditorías	P			1,347,500	5,390,000
		P(a)			0	178,764
		A			0	178,764

Total Cost

	Total Cost	P			3,587,500	150,000,000
		P(a)			7,327,530	136,555,811.92
		A			6,123,662	142,514,643

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Levantamiento	El Contrato de Préstamo fue ajustado (Modificadorio N° 1, EZSHARE-971633946-66) eliminando tanto al Organismo Ejecutor MINEDUC como todas las actividades que tenía bajo su responsabilidad, a excepción de la evaluación. Por lo tanto, entre las actividades y productos se encuentra este indicador.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	PAOLAR	03/19/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	PAOLAR	03/14/2019 03/19/2019
	Número de niños matriculados en los nuevos jardines infantiles de nivel medio	Se reflejó el avance del indicador y reprogramó la meta.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	PAOLAR	03/19/2019
	Propuesta de plan de mejoramiento diseñado con recomendaciones de implementación de medidas de mejora	El Contrato de Préstamo fue ajustado (Modificadorio N° 1, EZSHARE-971633946-66) eliminando tanto al Organismo Ejecutor MINEDUC como todas las actividades que tenía bajo su responsabilidad, a excepción de la evaluación. Por lo tanto, entre las actividades y productos se encuentra este indicador.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	PAOLAR	03/19/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	PAOLAR	03/14/2019 03/19/2019
	base de datos disponible	El Contrato de Préstamo fue ajustado (Modificadorio N° 1, EZSHARE-971633946-66) eliminando tanto al Organismo Ejecutor MINEDUC como todas las actividades que tenía bajo su responsabilidad, a excepción de la evaluación. Por lo tanto, entre las actividades y productos se encuentra este indicador.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	PAOLAR	03/19/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	PAOLAR	03/14/2019 03/19/2019
	licitación del estudio	El Contrato de Préstamo fue ajustado (Modificadorio N° 1, EZSHARE-971633946-66) eliminando tanto al Organismo Ejecutor MINEDUC como todas las actividades que tenía bajo su responsabilidad, a excepción de la evaluación. Por lo tanto, entre las actividades y productos se encuentra este indicador.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	PAOLAR	03/19/2019
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	PAOLAR	03/19/2019
Output	Base de datos sobre estudio actual de jardines infantiles en Chile	El Contrato de Préstamo fue ajustado (Modificadorio N° 1, EZSHARE-971633946-66) eliminando tanto al Organismo Ejecutor MINEDUC como todas las actividades que tenía bajo su responsabilidad, a excepción de la evaluación. Por lo tanto, entre las actividades y productos se encuentra este indicador.	Modify Output	Inactivate Output	PAOLAR	03/19/2019
	Educadores y técnicos capacitados	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	PAOLAR	03/14/2019 03/14/2019
	Especificaciones Técnicas	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	PAOLAR	03/15/2019
	Niveles medio nuevos y equipados	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	PAOLAR	03/14/2019
	Reporte de evaluación de la calidad de los contextos para el aprendizaje de los párvulos	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	PAOLAR	03/14/2019
	Sistema de Gestión de RRHH	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	PAOLAR	03/14/2019 03/14/2019
	Sistema geo-referenciado de información de las instituciones de educación parvularia	El Contrato de Préstamo fue ajustado (Modificadorio N° 1, EZSHARE-971633946-66) eliminando tanto al Organismo Ejecutor MINEDUC como todas las actividades que tenía bajo su responsabilidad, a excepción de la evaluación. Por lo tanto, entre las actividades y productos se encuentra este indicador.	Modify Output	Inactivate Output	PAOLAR	03/19/2019
	Sistema gestión de párvulos	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Output	Modify Financial	PAOLAR	03/14/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema gestión de párvulos	Se registró el avance de estos productos y reprogramó metas para 2019.	Modify Output	P(a) value	PAOLAR	03/14/2019
	Supervisores Capacitados		Modify Output	Modify Physical P(a) value	PAOLAR	03/14/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes
