

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	EC-L1155	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/01/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/25/19
<b>Last Update</b>	03/25/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	SECTOR SUPPORT FOR QUALITY EDUCATION IN ECUADOR	<b>Loan Number</b>	3726/OC-EC
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	<b>Sector/Subsector</b>	ED-EVA - EDUCATION-EDUCATIONAL ASSESSMENT
<b>Team Leader</b>	OLSEN, ANNE SOFIE WESTH	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ECUADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE ECUADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1155	160,000,000	160,000,000	37,707,800	0	197,707,800	160,000,000	153,307,107.55	95.82%	6,692,892.45
<b>Aggregated</b>	<b>160,000,000</b>	<b>160,000,000</b>	<b>37,707,800</b>	<b>0</b>	<b>197,707,800</b>	<b>160,000,000</b>	<b>153,307,107.55</b>	<b>95.82%</b>	<b>6,692,892.45</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

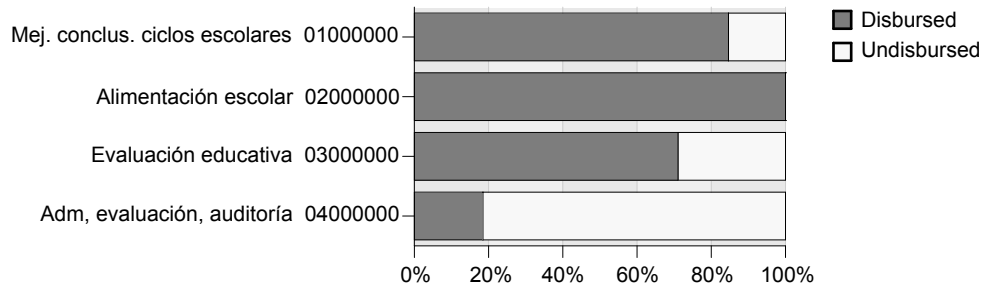

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** El objetivo de la operación es contribuir a consolidar las mejoras obtenidas por el país en cobertura y calidad educativa. Específicamente, esta operación contribuirá a financiar intervenciones claves para asegurar acceso a educación de calidad en el país.

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
0.0	Porcentaje de estudiantes en niveles de logros de aprendizaje insuficiente en 4° grado de EGB en Lengua y Literatura.	Puntos porcentuales (sin dimensión)	24.80	2015	P	20.80		20.80
					P(a)	20.80	20.80	20.80
					A	22.50		22.50

#### Details

**Means of verification:** Informes de la prueba Ser Estudiante

**Observations:** Responsable: INEVAL

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
0.1	Porcentaje de estudiantes en niveles de logros de aprendizaje insuficiente en 4° grado de EGB en Matemática.	Puntos porcentuales (sin dimensión)	21.60	2015	P	17.60		17.60
					P(a)	17.60	17.60	17.60
					A	27.00		27.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la prueba Ser Estudiante

**Observations:** Responsable: INEVAL

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2019
0.2	Porcentaje de jóvenes de 19-29 años con educación secundaria completa.	Puntos porcentuales (sin dimensión)	60.80	2014	P	63.00		63.00
					P(a)	63.00	63.00	63.00
					A	66.69		66.69

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

**Observations:** Responsable: MINEDUC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** El objetivo de la operación es contribuir a consolidar las mejoras obtenidas por el país en cobertura y calidad educativa. Específicamente, esta operación contribuirá a financiar intervenciones claves para asegurar acceso a educación de calidad en el país.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Estudiantes beneficiados por programas de Ciclo Básico acelerado	Students (#)	4,439.00	2015	P	110,000.00	57,500.00	0.00	171,939.00
					P(a)		57,500.00	41,678.00	171,939.00
					A	44,213.00	81,609.00	71,597.00	125,822.00

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de MINEDUC.

**Observations:** Cada programa se constituye de las clases que corresponden a un nivel del ciclo de Educación General Básica. Los beneficiarios son las personas que se registran en estos programas. El beneficio se define como probabilidad de graduarse, medido por la tasa de graduación. El programa se focaliza en personas mayores de 15 años, que no hayan completado Educación General Básica y se encuentren fuera del sistema educativo regular. Responsable: MINEDUC.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No						
	Girls				P	55,000.00	28,750.00	0.00	83,750.00
					P(a)		28,750.00	32,893.00	83,750.00
					A	22,107.00	40,805.00	35,799.00	62,912.00
	Boys				P	55,000.00	28,750.00	0.00	83,750.00
					P(a)		28,750.00	32,894.00	83,750.00
					A	22,106.00	40,804.00	35,798.00	62,910.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.1	Estudiantes beneficiados por programas de finalización de Bachillerato	Students (#)	186.00	2015	P	30,000.00	54,250.00	0.00	84,436.00
					P(a)		54,250.00	23,929.00	84,436.00
					A	23,976.00	36,345.00	31,405.00	60,321.00

#### Details

**Means of verification:** Informe SemestralInforme semestral de MINEDUC.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No						
	Girls				P	15,000.00	27,125.00	0.00	42,125.00
					P(a)		27,125.00	3,012.00	42,125.00
					A	11,988.00	18,173.00	15,703.00	30,161.00
	Boys				P	15,000.00	27,125.00	0.00	42,125.00
					P(a)		27,125.00	3,012.00	42,125.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Boys				A	11,988.00	18,172.00	15,702.00	0.00	30,160.00
--	------	--	--	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.2	Tasa de graduación de los estudiantes del ciclo de educación general básica acelerada	Puntos porcentuales (sin dimensión)	88.00	2015	P	90.00	90.00		90.00
					P(a)		90.00	0.00	90.00
					A	62.20	84.40	85.89	85.89

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de MINEDUC.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.3	Tasa de graduación de los estudiantes graduados de Bachillerato	Puntos porcentuales (sin dimensión)	86.40	2015	P	88.00	88.00		88.00
					P(a)		88.00	0.00	88.00
					A	65.50	87.30	87.48	87.48

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de MINEDUC.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.4	Docentes capacitados en formación disciplinar EGB	Teachers (#)	0.00	2015	P		2,934.00	1,257.00	4,191.00
					P(a)		2,934.00	0.00	1,013.00
					A		0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de MINEDUC.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.5	Docentes capacitados en buenas prácticas en aula	Teachers (#)	0.00	2015	P	0.00	666.00	0.00	666.00
					P(a)	0.00	666.00	0.00	0.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de MINEDUC.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.6	Mentores capacitados en enseñanza efectiva	Personas	0.00	2015	P	0.00	151.00	0.00		151.00
					P(a)		151.00	0.00	0.00	0.00
					A		0.00	0.00		0.00
Details										
Means of verification: Informe semestral de MINEDUC.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.7	Estudiantes de educación inicial beneficiados por alimentación escolar	Students (#)	0.00	2015	P	0.00	291,204.00	369,758.00		369,758.00
					P(a)		291,294.00	329,695.00		286,168.00
					A		0.00	286,168.00		286,168.00
Details										
Means of verification: Informe semestral de MINEDUC.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No				
	Girls				P	0.00	142,690.00	181,181.00		323,871.00
					P(a)		142,690.00	181,181.00	0.00	142,690.00
					A		0.00	140,223.00	0.00	140,223.00
	Boys				P	0.00	148,514.00	188,577.00		337,091.00
					P(a)		148,514.00	148,514.00	0.00	145,945.00
					A		0.00	145,945.00	0.00	145,945.00
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.8	Estudiantes de educación general básica beneficiados por alimentación escolar	Students (#)	0.00	2015	P	0.00	2,528,984.00	2,848,329.00		2,848,329.00
					P(a)		2,528,984.00	2,848,329.00	0.00	2,691,086.00
					A		2,709,556.00	2,691,086.00		2,691,086.00
Details										
Means of verification: Informe semestral de MINEDUC.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Girls				P	0.00	1,239,202.00	1,395,681.00		2,634,883.00
					P(a)		1,239,202.00	1,395,681.00	0.00	1,318,632.00
					A		1,318,632.00	0.00	0.00	1,318,632.00
	Boys				P	0.00	1,289,782.00	1,452,648.00		2,742,430.00
					P(a)		1,289,782.00	1,452,648.00	0.00	1,390,924.00
					A		1,390,924.00	0.00	0.00	1,390,924.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.9	Estudiantes de Bachillerato de las Unidades Educativas del Milenio beneficiados por alimentación Escolar	Students (#)	0.00	2015	P		19,385.00	46,317.00		46,317.00
					P(a)		19,385.00	46,317.00		20,408.00
					A		0.00	20,408.00		20,408.00

#### Details

**Means of verification:** Informe semestral de MINEDUC.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
	Girls					P		9,449.00	22,695.00	32,144.00
						P(a)		9,449.00	22,695.00	10,000.00
						A		10,000.00	0.00	10,000.00
	Boys					P		9,886.00	23,622.00	33,508.00
						P(a)		9,886.00	23,622.00	10,408.00
						A		10,408.00	0.00	10,408.00

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la conclusión de ciclos escolares y de la calidad educativa – MINEDUC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Programas ofertados de Ciclo Básico acelerado	Programas	P	0	1,980	0	24,315,099
			P(a)	0	2,735	0	13,441,585.09
			A	1,789	4,524	0	13,441,585.09
1.2	Programas ofertados de Bachillerato intensivo	Programas	P	0	590	0	20,543,240
			P(a)	0	585	0	15,336,112.32
			A	523	1,108	0	15,336,112.32
1.3	Módulo transversal de formación docente en buenas prácticas en aula	Programas	P	1	1	1,943,483	2,486,483
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	Curso de formación de mentores	Programas	P	1	1	1,756,178	2,363,178
			P(a)	0	0	530,875.2	530,875.2
			A	0	0	0	0
1.5	Curso de formación disciplinar de docentes de EGB, en áreas de Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua y Literatura implementado	Curso	P	0	1		0
			P(a)	0	1	0	720,000
			A	0	0	0	0

#### Component Nbr. 2 Componente 2: Alimentación escolar – UNA-EP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Raciones alimenticias entregadas en las escuelas	Raciones alimenticias	P	0	357,574,000	0	130,337,500
			P(a)	0	496,101,695	0	160,377,182.97
			A	0	496,101,695	0	160,377,182.97

#### Component Nbr. 3 Componente 3: Evaluación educativa - INEVAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Aplicación individual de pruebas para evaluaciones de aprendizaje y desempeño docente aplicadas	Pruebas	P	399,000	1,117,131	5,062,604	15,268,300
			P(a)	396,500	1,400,691	5,470,225.81	13,922,636.76
			A	182,448	1,095,691	3,177,427.39	11,052,697.76

#### Other Cost

Apoyos Tecnicos		P			235,000	570,000
		P(a)			273,458	483,833
		A			54,420	211,680
Evaluaciones		P			377,000	570,000
		P(a)			159,900	100,000
		A			0	0
Auditorias		P			58,700	570,000
		P(a)			60,719	30,590.5
		A			0	19,090.5

#### Total Cost

Total Cost		P			10,116,965	197,707,800
		P(a)			6,495,178.01	204,942,815.84
		A			3,231,847.39	200,438,348.64

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Docentes capacitados en buenas prácticas en aula	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor - MINEDUC ne puedo lograr ejecutar el proyecto antes de cierre del prestamo y esta programada al dentro de otro prestamo BID .	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	AOLSEN	03/14/2019 03/19/2019
	Docentes capacitados en formación disciplinar EGB	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	AOLSEN	03/14/2019 03/19/2019
	Estudiantes de Bachillerato de las Unidades Educativas del Milenio beneficiados por alimentación Escolar	Valores reales actualizados conforme datos EFA	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINAC	03/18/2019
	Estudiantes de educación general básica beneficiados por alimentación escolar	Valores reales actualizados conforme datos EFA	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINAC	03/18/2019
	Estudiantes de educación inicial beneficiados por alimentación escolar	Valores reales actualizados conforme datos EFA	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINAC	03/18/2019
	Mentores capacitados en enseñanza efectiva	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	AOLSEN	03/14/2019 03/19/2019
	Tasa de graduación de los estudiantes del ciclo de educación general básica acelerada	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINAC	03/18/2019
	Tasa de graduación de los estudiantes graduados de Bachillerato	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutores - Los valores correspondientes al MINEDUC fueron confirmados con Lily la semana anterior. Con respecto al EBJA, el año anterior quedó pendiente de reportar los matriculados en 2017, pero que se graduaron en 2018, por eso aunque el componente EBJA fue ejecutado hasta 2017, se reportaron esos valores	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	KARINAC	03/18/2019
Outcome indicator	Docentes capacitados en buenas prácticas en aula	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	KARINAC	03/18/2019 03/18/2019
	Docentes capacitados en formación disciplinar EGB	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	KARINAC	03/18/2019
	Estudiantes de Bachillerato de las Unidades Educativas del Milenio beneficiados por alimentación Escolar	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	KARINAC	03/18/2019
	Estudiantes de educación general básica beneficiados por alimentación escolar	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor -	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	KARINAC	03/18/2019
	Estudiantes de educación inicial beneficiados por alimentación escolar	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	KARINAC	03/18/2019
Output	Aplicación individual de pruebas para evaluaciones de aprendizaje y desempeño docente aplicadas	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor - INEVAL sigue evaluando a docentes hasta el fin del proyecto	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019 03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019 03/18/2019



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Curso de formación de mentores	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor - MINEDUC ne puedo lograr ejecutar el proyecto antes de cierre del prestamo y esta programada al dentro de otro prestamo BID .	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019
				Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019
	Curso de formación disciplinar de docentes de EGB, en áreas de Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua y Literatura implementado	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor - MINEDUC tiene planificado ejecutar un curso por regional, con 4 universidades regionales.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	KARINAC	03/18/2019
				Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019
				Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019
	Módulo transversal de formación docente en buenas prácticas en aula	alores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor - MINEDUC ne puedo lograr ejecutar el proyecto antes de cierre del prestamo y esta programada al dentro de otro prestamo BID .	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019
				Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019
	Programas ofertados de Bachillerato intensivo	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019
				Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019
	Programas ofertados de Ciclo Básico acelerado	Valores reales actualizados conforme datos EFA/Informe Semestral actualizado por ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019
				Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019
	Reportes de Resultado de Evaluación de impacto	Indicador inactivado ya que no precisa su continuidad conforme visión Técnica de TL - MINEDUC ne puedo lograr ejecutar el proyecto antes de cierre del prestamo y esta programada al dentro de otro prestamo BID .	Modify Output	Inactivate Output	KARINAC	03/18/2019
				Modify Financial P(a) value	KARINAC	03/17/2019

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Reportes de Resultado de Evaluación de impacto	Indicador inactivado ya que no precisa su continuidad conforme visión Técnica de TL - MINEDUC no puedo lograr ejecutar el proyecto antes de cierre del préstamo y esta programada al dentro de otro préstamo BID .	Modify Output	Modify Physical P(a) value	KARINAC	03/18/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions
