

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1105	Chief of Operations Validation Date	04/11/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/12/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/12/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Social Inclusion Network with Priority in Western Honduras	Loan Number	3723/BL-HO, 3723/BL-HO-1, 3723/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA, SECRETARIA DE SALUD	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	TEJERINA, LUIS R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1105	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	33,300,000	66.60%	16,700,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	33,300,000	66.60%	16,700,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

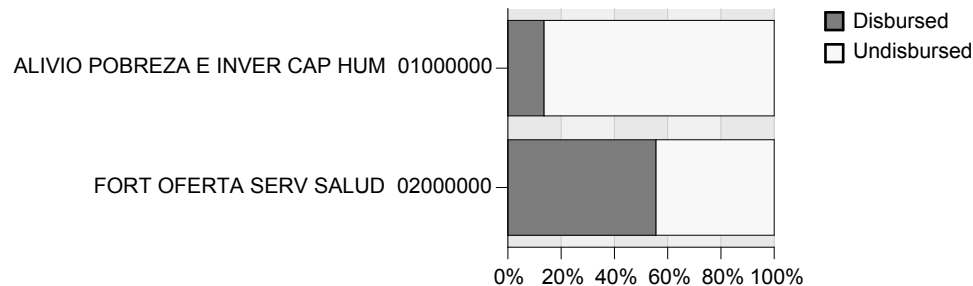

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Alivio de la Pobreza e Inversion en Capital Humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa de Pobreza extrema en beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor a nivel rural	%	61.20	2016	P		58.20
					P(a)	58.20	58.20
					A		

Details

Means of verification: Encuesta continua de Hogares

Observations: Contribuye al impacto que se mide a nivel de Programa BVM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Impact Nbr. 1: Salud Materna e Infantil

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de mortalidad neonatal en Hospitales financiados por el proyecto	%	12.00	2016	P		10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

Details

Means of verification: Registros Hospitalarios

Observations: Linea base obtenidos de la Unidad de Gestión de la Información de los Hospitales de Occidente. Para 2016 Intibuca, Lempira, Valle y San Pedro Sula. Para 2018 se espera añadir Copan, La Paz y Comayagua.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Nutricion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses en población de participantes del BVM	Tasa	23.10	2016	P		20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de Hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Observations: Datos del seguimiento (EDH 2013) anemia según clasificación de OMS							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matricula del tercer ciclo de educacion	Students (#)	24.00	2016	P		30.00
					P(a)	30.00	30.00
					A		

Details

Means of verification: Reporte de bases de datos SACE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

	Women				P		31.00
					P(a)		31.00
					A		
	Men				P		29.00
					P(a)		29.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en las modalidades alternas	Students (#)	27.90	2016	P		32.00
					P(a)	32.00	32.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de base de datos SACE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

	Women				P		31.00
					P(a)		31.00
					A		
	Men				P		33.00
					P(a)		33.00
					A		

Outcome Nbr. 1: Salud

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 SG en los últimos 12 meses.	%	44.30	2016	P		49.00
					P(a)	49.00	49.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	% de cobertura de parto institucional por en los últimos 12 meses.	%	64.00	2016	P		69.00
					P(a)	69.00	69.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	% de cobertura en atención puerperal en los primeros 7 días post parto* en hospitales, EAFs unidades de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.3	% de atención neonatal en los primeros tres días de nacido** en hospitales, EAFs y centros de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.4	Disponibilidad de Gineco-obstetras hospitalarios 24 horas al día / 7 días de la semana en los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	70.00	2016	P	80.00
					P(a)	80.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.5	Establecimientos de salud de primer y segundo nivel abastecidos con métodos de Planificación familiar en los 33 municipios priorizados y los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	86.40	2016	P	89.00
					P(a)	89.00
					A	

Details

Means of verification: Expedientes de los centros de salud

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.6	% de recursos humanos capacitados en el uso de la metodología de consejería en PF.	%	0.00	2016	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono Vida Mejor

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	P	70.00
					P(a)	70.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	A		
Details							
Means of verification: Informes del sistema gerencial de informacion							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares beneficiarios rurales que han recibido tres transferencias en el año en municipios priorizados	%	0.00	2015	P		80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de salud de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	17.00	2015	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de educación de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	74.00	2015	P		83.00
					P(a)	83.00	83.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.4	Incremento en nivel de consumo per capita	%	0.00	2016	P		8.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.4	mensual en Hogares participantes del Piloto de graduación.	%	0.00	2016	P(a)	8.00	8.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación Fundación Capital							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Alivio de la pobreza e inversión en capital Humano.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas	Beneficiaries (#)	P	311,231	311,231	10,475,320	16,200,000
			P(a)	256,752	256,752	7,179,444	16,200,000
			A	220,808	0	3,721,144	3,721,144
1.2	Numero de consultorias para el fortalecimiento de la operatividad de la SSIS	Consultorias	P	170	170	1,404,100	1,404,100
			P(a)	170	170	1,274,699	1,355,926
			A	199	0	1,175,860	1,175,860
1.3	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	hogares	P	672	672	800,000	1,300,000
			P(a)	672	1,640	616,136	1,300,000
			A	840	840	257,500	742,500
1.4	Número de fichas socioeconomicas unicas levantadas	Hogares	P	15,000	20,000	129,608	194,411
			P(a)	0	0	0	101,475
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	Beneficiaries (#)	P	543,863	543,863	9,034,744	17,290,000
			P(a)	543,863	543,863	9,034,744	17,290,000
			A	543,863	0	7,767,103	14,461,344
2.2	Municipios beneficiarios para estrategia de malaria	Municipios	P	0	20	200,000	2,400,000
			P(a)	0	20	200,000	2,400,000
			A	0	0	0	0
2.3	Convenios de Gestión firmados con Comités de Apoyo.	Convenios	P	4	5	283,192	784,177
			P(a)	4	5	283,192	1,141,202
			A	4	0	640,217	1,141,202
2.4	Número de convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel.	Convenios	P	4	8	2,518,246	6,660,262
			P(a)	4	8	2,518,246	6,179,117
			A	3	5	2,301,294	3,491,266
2.5	Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo.	Establecimientos de salud	P	75	75	420,000	420,000
			P(a)	75	75	420,000	417,018
			A	75	75	417,018	417,018
2.6	Consultorias para Fortalecimiento Hospitalario.	Consultorias	P	2	2	137,600	175,603
			P(a)	2	4	137,600	191,411
			A	2	2	121,693	121,693
2.7	Asistencia técnica para el fortalecimiento de certificación de gestores de primer y segundo nivel	consultoría	P	0	1	50,000	75,000
			P(a)	0	1	50,000	75,000
			A	0	0	47,497	47,497
2.8	Equipamiento para establecimientos de salud y hospitales	Equipo	P	2	3	384,270	584,270
			P(a)	2	3	384,270	568,462
			A	2	2	49,172	49,172
2.9	Taller de alto nivel para análisis del sistema de salud del Conjunto Garantizado de Servicios de Salud	Taller	P	1	1	60,000	60,000
			P(a)	1	1	60,000	34,123
			A	1	1	34,123	34,123
2.10	Consultorías para el fortalecimiento institucional de la SESAL.	Consultorias	P	15	20	444,202	669,958
			P(a)	15	20	444,202	822,937
			A	15	35	428,244	634,000
2.11	Talleres para el fortalecimiento de las intervenciones en salud en los gestores de la Iniciativa de Salud Mesoamérica	talleres	P	3	11	13,274	38,615
			P(a)	3	11	13,274	38,615
			A	3	3	13,127	13,127

Other Cost

Gestión del Programa SSIS	P			304,997	661,489
	P(a)			13,391	786,680
	A			0	0
Auditoria SSIS	P			56,250	240,000
	P(a)			56,250	255,919
	A			15,652	15,652
Gestión del Programa Salud	P			490,678	692,115
	P(a)			490,678	698,338
	A			398,507	443,405
Auditoria SESAL	P			50,000	150,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria SESAL	P(a)			50,000	143,777
		A			15,016	15,016

Total Cost

	Total Cost	P			27,256,481	50,000,000
		P(a)			23,226,126	50,000,000
		A			17,403,167	26,524,019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Consultorias para Fortalecimiento Hospitalario.	Se extienden a 6 meses mas las consultoría que han estado apoyando al fortalecimiento hospitalario, para este año 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
				Modify Physical P(a) value	HUGOG	02/25/2019
	Consultorías para el fortalecimiento institucional de la SESAL.	Se realizó extensión a las consultorias de la UGD para este año 2019, de los meses de Febrero a Junio, se utilizaron remanentes de viáticos y talleres que no fueron ejecutados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
	Convenios de Gestión firmados con Comités de Apoyo.	En el año 2018 se había programado que se pagarían solo un período de 6 meses estos convenios con comites de apoyo, en la espera que se aprobara la donación de la tercera operacion de la Iniciativa de Salud Mesoamerica, como la donación aun no era elegible hasta el año 2019, se tuvieron que extender por 6 meses mas el financiamiento para estos gestores, con el fin de mantener las metas alcanzadas .	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
	Equipamiento para establecimientos de salud y hospitales	Durante el año 2018 se realizó la licitación de compra de equipo médico para establecimientos de salud y hospitales dividiendo la compra en dos lotes, lote 1 que contenia la mayor cantidad de equipos (camillas, incubadoras, mesas de cirugia etc) y el lote 2 instrumental quirurgico. El BID ortogo solamente la No Objeción para la compra del lote 2 (Instrumental quirurgico) en vista que el Lote N°1 no ofrecia especificaciones tecnicas claras y los procedimientos no fueron los adecuados, por lo cual el banco recomendo a la SESAL , realizar revision de las especificaciones tecnicas que fueran mas generales y contar con mayor competitividad . por lo que se reprogramo para el año 2019 la compra de este equipo y se anexaron dentro del mismo la compra de unos ventiladores mecanicos para el area neonatal, por lo que el presupuesto se incrementa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
	Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo.	Se adquirieron micronutrientes en polvo para los 75 establecimientos de salud presupuestados, por diferencial cambiario hubo un ahorro en esta compra de U\$ 2,982.00	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
	Numero de consultorias para el fortalecimiento de la operatividad de la SSIS	Aumentó el número de consultorías porque se contrataron más gestores sociales de lo previsto, fortaleciendo el trabajo en territorio.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
						03/14/2019
	Número de convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel.	No se logró la meta de la firma de los cuatro (4) convenios de gestión descentralizada de segundo nivel en el año 2018, por lo que se reprogramo para el año 2019 la descentralizacion de 3 hospitales.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
	Número de fichas socioeconomicas unicas levantadas	El Gabinete Social decidió actualizar la Ficha Socioeconómica Única a nivel nacional; el programa contribuyó a dicho proceso, logrando actualizar la FSU de los 49506 hogares beneficiarios del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	BESSYR	03/14/2019
	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	Se solicitó cambio para que manualmente se incluyera la suma de los hogares a beneficiar, considerando que los hogares no deben cambiar año tras a, son los mismos hogares a intervenir.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
				Modify Output EOP to Not-Autocalculated	JUANZE	03/18/2019
				Modify	BESSYR	03/14/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	Se solicitó cambio para que manualmente se incluyera la suma de los hogares a beneficiar, considerando que los hogares no deben cambiar año tras a, son los mismos hogares a intervenir.	Modify Output	Physical P(a) value	HUGOG	02/25/2019
	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas		Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019
	Taller de alto nivel para análisis del sistema de salud del Conjunto Garantizado de Servicios de Salud	Se realizó el Taller de Alto nivel con gran éxito, se conto con la participacion de expertos internacionales y nacionales, durante 3 dias se realizaron varias exposiciones a diferentes sectores de la SESAL , en el cual hubo un ahorro en vista que el BID apoyo en apoyo logistico, en el uso de sus instalaciones.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	02/25/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions
