

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1159	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/10/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/03/19
<b>Last Update</b>	03/26/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/10/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement of Foreign Trade Facilitation Services Through the Single Window(VUC	<b>Loan Number</b>	3546/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	<b>Sector/Subsector</b>	TD-TFL - TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
<b>Team Leader</b>	MEJIA RIVAS, ISABEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PERU
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1159	20,000,000	20,000,000	41,900,000	0	61,900,000	20,000,000	2,600,000	13.00%	17,400,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	41,900,000	0	61,900,000	20,000,000	2,600,000	13.00%	17,400,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

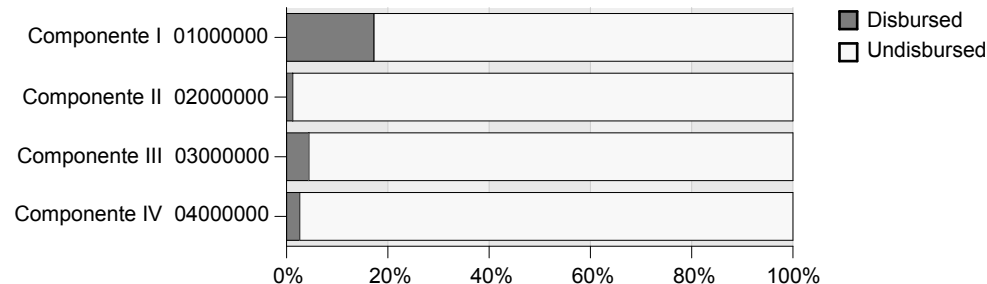

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejorar la competitividad del sector transable a través de la reducción de costos de transacción asociados al comercio exterior

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
0.0	Ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	Posición en el ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	88.00	2016	P		85.00	85.00
					P(a)		85.00	85.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Medición 2021 Doing Business

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Reducción del número de días promedio para la tramitación de las operaciones de comercio exterior

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
0.0	Número de días promedio para llevar a cabo los trámites y permisos en la VUCE	días promedio de tramitación	12.67	2016	P		10.67	10.67
					P(a)		10.67	10.67
					A			
Details								
Means of verification: Datos de extraídos de la VUCE								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

**Outcome Nbr. 1:** Reducción a los costos logísticos promedio en las operaciones de comercio exterior

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
1.0	Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	Posición en el ranking Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	80.00	2016	P		77.00	77.00
					P(a)		77.00	77.00
					A			
Details								
Means of verification: Estudio Banco Mundial								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Nuevo flujograma de procesos de comercio exterior consensuado con las entidades involucradas	Flujograma	P		1	2,694,500	3,170,000
			P(a)		1	2,015,563	3,170,000
			A		0	1,783,718.35	1,789,346.14
1.2	Reporte sobre Talleres de Trabajo	Talleres	P	2	3	30,000	30,000
			P(a)	2	4	20,000	30,000
			A	3	3	4,052.22	4,052.22
1.3	Reporte sobre Homologación de datos	Reporte	P		1	500,000	500,000
			P(a)		1	111,318	500,000
			A		0	102,874.91	103,772.22
1.4	Instrumentos de control y manejo de riesgos diseñados e implementados en las entidades de control	Entidades	P		6	400,000	400,000
			P(a)		6		400,000
			A		0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente II: Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Plataforma VUCE	P		1	6,789,225	19,152,000
			P(a)		1	669,169	19,152,000
			A		0	638,001.64	638,001.64
2.2	Reporte sobre infraestructura de hardware para la VUCE 2.0	Reporte	P		1	1,372,500	2,745,000
			P(a)		1	159,104	2,745,000
			A		0	329,692.66	329,692.66
2.3	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	Entidades	P		8	4,902,000	6,603,000
			P(a)		8	82,746	6,603,000
			A		0	27,987.98	27,987.98
2.4	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento	Países con los que se interope	P	2	3	175,000	500,000
			P(a)	2	3	8,358	500,000
			A	3	3	6,759.02	6,759.02
2.5	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento	Reporte	P		1	50,000	500,000
			P(a)		1	64,030	500,000
			A		0	9,043.79	9,043.79

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente III: Servicios de información para el comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento	Sistemas	P		5	851,667	6,900,000
			P(a)		5	148,915	6,900,000
			A		0	41,385.22	41,385.22
3.2	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	Plataforma	P		1	1,141,667	3,250,000
			P(a)		1	197,736	3,250,000
			A		0	102,967.08	102,967.08
3.3	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Reporte	P		1	1,941,667	5,250,000
			P(a)		1	206,134	5,250,000
			A		0	195,796.5	381,930.9
3.4	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Reporte	P		1		3,100,000
			P(a)		1	209,930	3,100,000
			A		0	51,382.59	60,017.95
3.5	Programas de e-learning de capacitación a usuarios privados y entidades de control implementados	Programas	P		5	37,500	1,200,000
			P(a)		5		1,200,000
			A		0	0	0

## Component Nbr. 4 Componente IV: Transferencia de conocimiento y gestión del cambio

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
4.1	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Estrategias	P	1	4	100,000	1,500,000
			P(a)	1	4	112,090	1,500,000
			A	1	2	95,450.65	100,036.56
4.2	Estrategias implementadas de gestión del cambio	Estrategias	P		3		1,900,000
			P(a)		3	172,000	1,900,000
			A		0	0	0

## Other Cost

Gestión del Proyecto: Unidad de Gestión	P			790,000	3,950,000
	P(a)			502,734	3,050,000
	A			508,628.02	762,747.28
Gestión del Proyecto: Adecuación física para la Unidad Ejecutora	P			60,000	300,000
	P(a)			331,363	1,200,000.01
	A			361,790.25	629,134.81
Gestión del Proyecto: Evaluaciones	P				600,000
	P(a)			11,940	600,000
	A			8,941.57	8,941.57
Gestión del Proyecto: Auditorías	P			70,000	350,000
	P(a)				349,999.99
	A			46,101.75	46,101.75

## Total Cost

Total Cost	P			21,905,726	61,900,000
	P(a)			5,023,130	61,900,000
	A			4,314,574.2	5,041,918.79

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
	Estrategias implementadas de gestión del cambio		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LUISMED	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	LUISMED	02/25/2019
						02/25/2019
	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
				Modify Physical	LUISMED	01/14/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento		Modify Output	P(a) value	LUISMED	01/14/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LUISMED	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
	Nuevo flujograma de procesos de comercio exterior consensuado con las entidades involucradas	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LUISMED	03/11/2019
				Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
	Reporte sobre Homologación de datos	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LUISMED	03/11/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Reporte sobre Homologación de datos	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LUISMED	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
						03/11/2019
	Reporte sobre Talleres de Trabajo	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	LUISMED	01/14/2019
						01/14/2019
						02/25/2019



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Reporte sobre Talleres de Trabajo	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	LUISMED	02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Se consigno por error un monto que ha sido corregido para que los datos estén de acuerdo a la información histórica del proyecto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LUISMED	03/11/2019
						03/11/2019
				Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
						03/11/2019
	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
	Reporte sobre infraestructura de hardware para la VUCE 2.0		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019
	Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento		Modify Output	Modify Financial P(a) value	LUISMED	02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/13/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						02/25/2019
						03/11/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
