

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1105	Chief of Operations Validation Date	04/22/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/23/19
Last Update	04/12/19	Country Representative Validation Date	05/16/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Inclusion and Development Program	Loan Number	3512/OC-PN, 3512/OC-PN-1, 3512/OC-PN-2
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PANAMA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Comisión E-Panamá		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1105	50,000,000	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	50,000,000	11,068,200	22.14%	38,931,800
Aggregated	50,000,000	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	50,000,000	11,068,200	22.14%	38,931,800

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

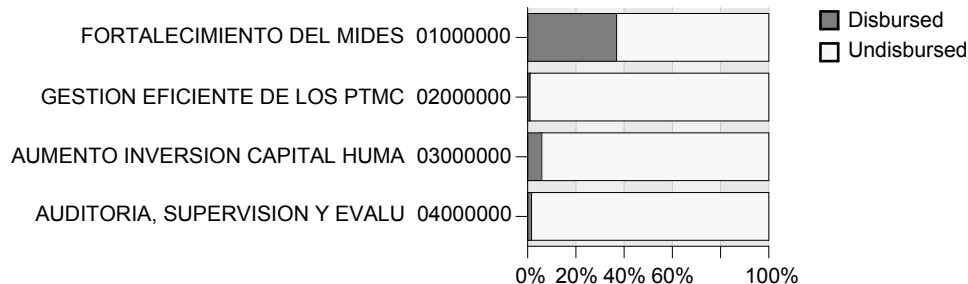

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Incidencia pobreza extrema	%	11.00	2015	P		6.50
					P(a)		6.50
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.

Observations: Los datos de la encuesta se utiliza para calcular (i) cobertura de los PTMC; (ii) pobreza y pobreza extrema.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.1	Incidencia pobreza general	%	25.80	2015	P		16.70
					P(a)		16.70
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.

Observations: Los datos de la encuesta se utiliza para calcular (i) cobertura de los PTMC; (ii) pobreza y pobreza extrema

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar la capacidad del sistema de protección social para promover la acumulación del capital humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.0	Niños en los COIF que tienen puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico	%	0.00	2015	P		-10.00
					P(a)		-10.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Independiente aplicadas en Centros de Orientación Infantil (COIF)

Observations: El instrumento de Edades y Etapas (ASQ-3 por su siglas en Inglés) es una herramienta de detección de rezagos en el desarrollo de niños de 1 y 66 meses de edad. Línea Base N/D.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.1	Niños en los COIF que tienen valor z talla para la edad por debajo de un umbral crítico	%	0.00	2015	P		-10.00
					P(a)		-10.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Independiente aplicadas en Centros de Orientación Infantil (COIF)

Observations: Mediciones antropométrica con tallímetro de acuerdo a estándares internacionales recomendados por la OMS y UNICEF.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema general

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Pobres extremos en hogares con menores de 18 años incluidos en el programa Red de Oportunidades (RdO) - cobertura	%	48.00	2015	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Ratio entre número de individuos que viven en hogares de la población objetivo que reciben beneficios del programa, y número total de individuos que viven en hogares de la población objetivo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.1	Beneficiarios de la RdO que no son pobres extremos (filtración)	%	42.00	2015	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema).

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.2	Beneficiarios del Programa 120 a los 65 que no son pobres (filtración)	%	53.00	2015	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.3	Beneficiarios de Ángel Guardián (AG) que no son	%	0.00	2015	P		-5.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	pobres extremos (filtración)	%	0.00	2015	P(a)		-5.00
					A		

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.4	Beneficiarios de la RdO recertificados	beneficiarios	0.00	2015	P	190,000.00
					P(a)	190,000.00
					A	

Details

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.5	Beneficiarios de 120 a los 65 recertificados	beneficiarios	0.00	2015	P	44,000.00
					P(a)	44,000.00
					A	

Details

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.6	Beneficiarios de ÁG recertificados	beneficiarios	0.00	2015	P	22,000.00
					P(a)	22,000.00
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.7	Beneficiarios de la RdO que tienen acceso a los servicios de salud y educación	%	0.00	2015	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

Means of verification: Datos administrativos del MINSA y del MEDUCA; Reportes SIG; Reportes RUB.

Observations: Se define acceso a servicios de salud y educación como población de una comunidad que accede a un proveedor de salud y escuela cuya comunidad esté a menos de una hora de distancia de dichas instalaciones. Línea de base a estimar en 2016 que fijara la meta en +5pp sobre la línea base..

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Aumentar la capacidad del Sistema de Protección Social para promover la acumulación del capital humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.0	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) que aplica los estándares de calidad aprobados por el MIDES	%	0.00	2015	P		60.00
					P(a)		60.00
					A		

Details

Means of verification: Datos administrativos del MIDES. Informe de la Dirección de Servicios Sociales.

Observations: No existen estándares de calidad definido para los CAIPI, por lo cual línea de base es 0. Los estándares de calidad para los CAIPI incluirán las siguientes áreas: infraestructura y equipamiento; salud y nutrición; gestión y administración, componente pedagógico y talento humano; y identidad, familia y comunidad. Se aplicará un checklist para medir dichas áreas de calidad.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.1	Calidad de CAIPI medida por ITES-R	%	0.00	2015	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

Details

Means of verification: Encuestas Independientes aplicadas en COIF

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: ITERS-R (Infant and Toddler Environment Rating Scale-Revised) instrumento de medición de la calidad en centros para niños. La calificación se realiza siguiendo una escala numérica del 1 al 7, donde 1 significa baja calidad y 7 excelente. Línea base N/D. La meta es de +20 pp de los COIF con puntaje mayor a 4.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del MIDES a nivel central y territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Personal de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) contratado	# funcionarios	P		0		0
			P(a)	0	18	146,309.1	1,287,634.1
			A	6	6	326,325	472,634.1
1.2	Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) y enlaces gubernamentales capacitados	# funcionarios	P	0	5	16,500	33,000
			P(a)	0	78	14,025	6,675
			A	0	78	1,725	6,675
1.3	Dirección de programas para la administración, supervisión y monitoreo de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) conformada	# direcciones	P	0	1	13,000	36,700
			P(a)	0	1	140,844	616,847
			A	0	1	136,003	276,847
1.4	Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC)	# funcionarios	P	20	40	80,000	177,150
			P(a)	35	251	134,250	177,150
			A	86	91	1,842	44,742
1.5	Funcionarios de las Direcciones Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formados	# funcionarios	P	35	70	15,500	51,200
			P(a)	35	135	18,800	51,200
			A	100	135	1,800	34,200
1.6	Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) institucionalizada	# funcionarios	P	0	4	0	160,500
			P(a)	0	22	364,086.73	1,648,758.73
			A	4	4	371,672	735,758.73
1.7	Esquema de promotor único del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) diseñado	# manual	P	0	1	20,000	64,000
			P(a)	1	1	24,450	86,710
			A	1	1	29,160	68,710
1.8	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pagados y capacitados en protocolos de servicios	# promotores	P	100	200	1,420,000	3,280,000
			P(a)	100	200	663,140.26	3,280,000.75
			A	131	672	7,386.75	77,136.75
1.9	Direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Central equipadas con mobiliario y equipo tecnológico	# oficinas	P	3	6	409,170	1,161,070
			P(a)	3	6	80,688.56	2,048,589.84
			A	2	2	368,208.4	1,448,589.84
1.10	Direcciones Regionales acondicionadas	# direcciones regionales	P	3	6	3,900,000	8,927,000
			P(a)	3	8	3,740,296.61	3,655,666.39
			A	2	2	1,223,646	1,971,849.39
1.11	Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento	# Sistema	P	1	1	143,750	297,833
			P(a)	1	4	249,960.13	606,275.59
			A	1	1	138,402.72	186,275.59

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Gestión Eficiente de los PTMC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados	Reglamento Operativo	P	0	3	107,000	242,782
			P(a)	0	3	107,000	10,700
			A	0	3	0	10,700
2.2	Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada	# programas	P	0	3	120,000	250,000
			P(a)	0	4	200,577.75	129,020.25
			A	0	3	79,598	129,020.25
2.3	Protocolo de recertificación de beneficiarios operativizado	# protocolos	P	2	3	2,568,000	4,755,718
			P(a)	2	3	2,578,000	0
			A	1	1	0	0
2.4	Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) diseñada, equipada y con servicio de alojamiento	# sistemas	P	0	1	4,353,000	7,898,500
			P(a)	0	1	4,353,000	7,898,500
			A	0	0	0	0
2.5	Funcionarios capacitados en el manejo de la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB)	# funcionarios	P	0	30	50,000	50,000
			P(a)	0	60	25,000	140,000
			A	0	0	0	0
2.6	Número de beneficiarios de programas anti-pobreza (Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián) registrados en el PIIB	Beneficiaries (#)	P	0	650,000	0	200
			P(a)	0	650,000	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Aumento de la Inversión en Capital Humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Acuerdos interinstitucionales con Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para la verificación de corresponsabilidades actualizados	# convenios	P	0	2	21,400	42,800
			P(a)	2	2	21,400	500
			A	1	1	0	0
3.2	Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados	# Instrumentos	P	3	3	509,500	1,040,750
			P(a)	3	3	0	23,284.85
			A	2	2	11,164.35	23,284.85
3.3	Número de beneficiarios de la Red de Oportunidades (RdO) que reciben transferencias monetarias en base a la verificación de corresponsabilidades a través del SIG	Beneficiaries (#)	P	12,500	25,000	4,016,700	8,033,400
			P(a)	12,500	87,300	4,016,700	49,897.05
			A	17,300	17,300	38,397.05	38,397.05
3.4	Estándares de calidad para aplicación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados	# estándares y guías	P	5	10	162,800	338,800
			P(a)	1	10	114,638.63	454,476.37
			A	1	10	52,315	276,476.37
3.5	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) construidos	# Centros	P	2	5	1,181,652	2,954,130
			P(a)	2	5	1,181,652	7,205,564.4
			A	2	2	1,525,564.4	1,525,564.4
3.6	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) rehabilitados	# Centros	P	22	44	4,642,588	8,341,690
			P(a)	44	44	4,642,588	22,239,831
			A	6	6	4,039,739	4,039,739
3.7	Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñada	# esquema	P	0	1	0	36,141
			P(a)	0	1	0	36,141
			A	0	1	0	36,141
3.8	Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño	# niños	P	13,000	40,000	0	250,000
			P(a)	13,000	54,000	120,000	250,677
			A	0	0	0	0
3.9	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado	# Centros	P	0	89	1,755,158	6,748,707
			P(a)	10	89	1,348,451	1,541,900.68
			A	10	10	61,986.37	61,986.37
3.10	Niños menores de cinco años atendidos en Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)	Beneficiaries (#)	P	2,373	3,449	909,700	2,409,687
			P(a)	2,373	3,449	1,111,300	0
			A	271	0	0	0
3.11	Niños menores de cinco años atendidos modalidad comunitaria	Beneficiaries (#)	P	3,900	11,700	175,516	695,542
			P(a)	5,400	5,500	315,516	4,842,000
			A	50	50	0	0

Other Cost

Auditoria Operativa y Financiera del Programa	P			267,500	785,000
	P(a)			517,500	785,000
	A			25,734	25,734
Supervisión del Programa	P			28,000	56,000
	P(a)			28,000	56,000
	A			0	0
Monitoreo y Evaluación del Programa	P			0	871,000
	P(a)			550,000	871,000
	A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			26,886,434	60,000,000
		P(a)			26,808,173.77	60,000,000
		A			8,440,669.04	11,490,461.69

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Acuerdos interinstitucionales con Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para la verificación de corresponsabilidades actualizados	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. Este producto no requiere inversión financiera ya que depende de negociación de acuerdos gubernamentales.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
					ILIAN	03/12/2019
	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						03/20/2019
						04/05/2019
						04/05/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						03/19/2019
03/20/2019						
04/05/2019						
ILIAN					03/12/2019	
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) construidos	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019	
					03/18/2019	
					04/05/2019	
					04/05/2019	
			Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019	
	03/20/2019					
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) rehabilitados	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019	
					03/18/2019	
					03/18/2019	
					04/05/2019	
			Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019	
						03/20/2019
				ILIAN	03/12/2019	
Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. Este producto no requiere inversión en 2019. Debido a la extensión del préstamo, solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobada por el BID, se agregaron los valores para Financial P(a) and Physical P(a) para los años 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019	
						03/18/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Direcciones Regionales acondicionadas	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/20/2019
						04/05/2019
						04/05/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
					ILIAN	04/05/2019
	Direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Central equipadas con mobiliario y equipo tecnológico	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/20/2019
						03/20/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
					ILIAN	03/18/2019
	Dirección de programas para la administración, supervisión y monitoreo de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) conformada	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						04/05/2019
	Esquema de promotor único del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) diseñado	Ha sido completado en 2018 por lo que no representará gastos excepto la impresión del material necesario para el financiamiento del piloto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ILIAN	03/12/2019
	Estándares de calidad para aplicación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados	Aunque los productos ya se han alcanzado, se estará contribuyendo con la impresión de los estándares de calidad y guías pedagógicas, motivo por el cual se actualizó el Progreso Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						04/05/2019
	Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. Debido a la extensión del préstamo, solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobada por el BID, se agregaron los valores para Financial P(a) and Physical P(a) para los años 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	04/05/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Funcionarios capacitados en el manejo de la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB)	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. Debido a las restricciones presupuestarias, esta actividad no se puede realizar ya que depende del producto anterior.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
	Funcionarios de las Direcciones Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formados	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
					ILIAN	03/12/2019
	Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC)	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
						03/18/2019
					ILIAN	03/12/2019
	Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. Debido a la extensión del préstamo, solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobada por el BID, se agregaron los valores para Financial P(a) and Physical P(a) para los años 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
	Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño	Según Reglamento Operativo de la Libreta del Niño aprobado por la Resolución Ministerial No 1077 de 14 de agosto de 2015 de Ministerio de Salud, se indica que la Libreta del Niño será entregada a mujeres embarazadas al momento de ingresar en su control prenatal. De no asistir a control prenatal, se entrega al momento del parto institucional. De no asistir a parto institucional, se entrega en control de crecimiento y desarrollo. La información de la entrega de la Libreta del Niño proviene de datos administrativos sobre ingresos a control prenatal de mujeres embarazadas por año, por ello se ha cambiado el medio de verificación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						04/05/2019
				Modify Means of Verification	CAROLINAF	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	CAROLINAF	03/19/2019
						04/10/2019
						04/10/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/19/2019
						04/05/2019
						04/10/2019
					ILIAN	03/12/2019
	Niños menores de cinco años atendidos en Centros de Atención Integral a la	Se modificó el EOP P para reflejar la cifra correcta como está en la matriz de resultados del contrato de préstamo	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/20/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Primera Infancia (CAIPI)	Se modificó el EOP P para reflejar la cifra correcta como está en la matriz de resultados del contrato de préstamo	Modify Output	Modify Physical EOP P	JUANZE	04/10/2019
				Modify Physical EOP P(a)	JUANZE	04/10/2019
	Niños menores de cinco años atendidos modalidad comunitaria	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						04/05/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
						03/18/2019
						04/05/2019
					ILIAN	03/12/2019
	Número de beneficiarios de la Red de Oportunidades (RdO) que reciben transferencias monetarias en base a la verificación de corresponsabilidades a través del SIG	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
						03/20/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/15/2019
						04/05/2019
					ILIAN	03/12/2019
	Número de beneficiarios de programas anti-pobreza (Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián) registrados en el PIIB	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. Debido a las restricciones presupuestarias, esta actividad no se puede realizar ya que depende del producto anterior. Debido a la extensión del préstamo, solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobada por el BID, se agregaron los valores para Financial P(a) and Physical P(a) para los años 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
	Personal de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) contratado	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						04/05/2019
				Modify Output EOP to Not-Autocalculated	JUANZE	04/10/2019
					Modify Physical P(a) value	CAROLINAF
	ILIAN	03/12/2019				
	Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) y enlaces gubernamentales capacitados	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
Plataforma Integrada de	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están	Modify	Modify	CAROLINAF	03/18/2019	

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Información de Beneficiarios (PIIB) diseñada, equipada y con servicio de alojamiento	ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019. El contrato para el diseño del PIIB inició en noviembre de 2018 y no se ejecutará en su totalidad en 2019.	Output	Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	04/05/2019
	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pagados y capacitados en protocolos de servicios	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						04/05/2019
						04/05/2019
	Protocolo de recertificación de beneficiarios operativizado	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ILIAN	03/12/2019
	Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019, los cuales están ajustados a la asignación presupuestaria dada al proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						03/20/2019
						04/05/2019
				Modify Output EOP to Not-Autocalculated	JUANZE	04/10/2019
				Modify Physical P(a) value	CAROLINAF	03/20/2019
						04/05/2019
	Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) institucionalizada	Se actualizaron el Progreso Físico y Financiero para 2019 según el POA y Plan Financiero 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CAROLINAF	03/18/2019
						04/05/2019
				Modify Output EOP to Not-Autocalculated	JUANZE	04/10/2019
						03/18/2019
						04/05/2019
				Modify Physical P(a) value	ILIAN	03/12/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Legal aspects and public processes
Project Management Capacity
