

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1051	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/13/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/19
<b>Last Update</b>	03/22/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/15/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support to Early Childhood Development	<b>Loan Number</b>	2667/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PARAGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1051	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	9,659,783.71	35.78%	17,340,216.29
<b>Aggregated</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>9,659,783.71</b>	<b>35.78%</b>	<b>17,340,216.29</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

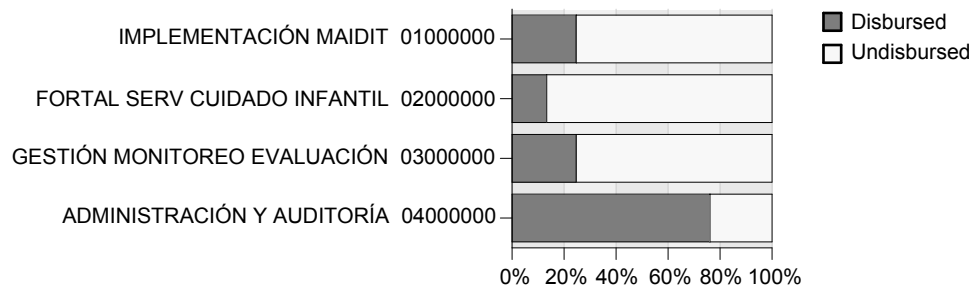

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2019	EOP 2020
1.1	Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.	% niños y niñas	10.00	2011	P			7.00
					P(a)			7.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Exámenes psicomotores y de lenguaje

**Observations:** Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** 1. Los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano, ampliados.

**Observation:** Observaciones de indicador 1.1 Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado; 1.2 El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.3 El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.4, 1.5 y 1.6 Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas - porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as	0.00	2011	P							10.00
					P(a)							10.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	1.2 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas	0.00	2011	P	5.00						10.00
					P(a)	5.00						10.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

**Observations:** El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	1.3 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.	% niños/ñas	0.00	2011	P	20.00	30.00	40.00				50.00
					P(a)	20.00	30.00	0.00	10.00	50.00		50.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.

**Observations:** El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	1.4 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00	0.00	10.00	70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa hospitales.

**Observations:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas  
Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.  
Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	1.5 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00			70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa hospitales.

**Observations:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas  
Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.  
Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	1.6 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00		10.00	70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa hospitales.

**Observations:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas  
Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.  
Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** 2. Los servicios de los centros de desarrollo infantil articulados y fortalecidos.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	2.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00				30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Encuesta específica al final de ejecución.

**Observations:** La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	2.2 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00				30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta específica al final de ejecución.

**Observations:** Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimient

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Persona	P		0		0
			P(a)	0	50	0	107,000
			A		0		0
1.2	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P		10		8,475,235
			P(a)	0	4	0	665,500
			A	0	0	0	0
1.3	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P		1		2,255,221
			P(a)	1	1	919,086	1,087,746.38
			A	0	0	506,206.38	634,529.38
1.4	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P		12		3,226,174
			P(a)	0	0	0	0
			A		0	0	0
1.5	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P		11		2,639,848
			P(a)	0	15	0	174,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P		167		3,678,615
			P(a)	4	11	101,359	1,512,408.05
			A	4	4	320,704.91	452,356.91
1.7	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P		0		0
			P(a)	0	3	0	941,402
			A	0	0	0	0
1.8	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P		0		0
			P(a)	0	5	598,578	1,561,101.21
			A	0	5	465,930.78	798,661.21
1.9	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	174	1,917	194,381	359,849.26
			A	502	1,017	83,140.67	198,987.26
1.10	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P		0		0
			P(a)	0	1	0	492,590.08
			A	0	1	0	492,590.08
1.11	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	0	30	0	75,000
			A		0		0
1.12	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agentes comunitarios	P		0		0
			P(a)	137	137	1,728,132	3,967,184.78
			A	86		977,567.37	2,069,630.78
1.13	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	10	44	1,132,539	6,031,434.29
			A	10	10	801,762.27	882,614.46
1.14	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	7	23	1,003,099	3,005,137.62
			A	7	7	561,233.59	582,163.59

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P		1		388,000
			P(a)	1	1	10,000	15,057.67
			A	1	1	2,761	8,474.67
2.2	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P		31		1,188,519
			P(a)	29	31	200,000	901,628.8
			A	0	0	170,877.79	187,265.8

Component Nbr. 3 3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P		20		61,000
			P(a)	0	20	0	400,000
			A	0	0	0	0
3.2	3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	sistema	P		1		168,998
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	sistema	P		1		130,000
			P(a)	1	1	265,786	512,023.83
			A	0.7	0.7	105,175.58	368,038.83
3.4	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	evaluaciones	P		2		640,000
			P(a)	1	2	20,000	246,200.57
			A	1	1	10,139.57	10,139.57

### Other Cost

	Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Administración y Auditoría	P				1,318,258
		P(a)			316,996	1,691,614.68
		A			243,926.3	622,960.68
	Imprevistos	P				63,900
		P(a)			0	150,000
		A			0	0

### Total Cost

	Total Cost	P				30,000,000
		P(a)			6,489,956	23,896,879.22
		A			4,249,426.21	7,308,413.22

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se han modificado las metas físicas y financieras de este producto, incrementando el número de agentes comunitarios a ser contratados en 2019 para ampliar el MAIDIT en 275 USFs. Estos agentes comunitarios serán absorbidos por el MSPBS al finalizar el programa. Cabe notar que el numero de agentes comunitarios se redujo de 2017 a 2018, dado que fueron absorbidos por el MSBPS anticipando el cierre del programa en 2018, previa su ampliación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019 03/15/2019
	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se han modificado las metas físicas y financieras de este producto, incrementando el número de USFs de ser fortalecidas, aprovechando los avances que hubo en la preparación de los diseños ejecutivos y permisos de uso de suelo en años anteriores, viabilizando la ejecución de las obras en el periodo ampliado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019 03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se han modificado las metas físicas y financieras de este producto, incrementando el número de USFs de ser fortalecidas, aprovechando los avances que hubo en la preparación de los diseños ejecutivos y permisos de uso de suelo en años anteriores, viabilizando la ejecución de las obras en el periodo ampliado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019 03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se han modificado las metas físicas y financieras de este producto, incrementando el número de USFs de ser fortalecidas, aprovechando los avances que hubo en la preparación de los diseños ejecutivos y permisos de uso de suelo en años anteriores, viabilizando la ejecución de las obras en el periodo ampliado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019 03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este producto, modificando las metas físicas y financieras, aprovechando los avances que hubo en la preparación de los diseños ejecutivos y permisos de uso de suelo en años anteriores de las 3 USFA, viabilizando la ejecución de las obras en el periodo ampliado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019
	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. La meta física y financiera del producto fue modificada para que refleje el desarrollo del modelo, la implementación de módulos, que incluyen adicionalmente en 2019 y 2020 la estrategia de comunicación, el equipo técnico responsable para el MAIDIT, y la implementación del piloto de microrredes RISS/MAIDIT en las 6 regiones sanitarias.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019 03/15/2019 03/15/2019
	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas físicas y financieras para ser ejecutadas durante este periodo (FEB/2020). El MPSBS ha presentado un Plan de Capacitación, incorporando al Instituto Nacional de Salud (INS), dependencia rectora de la capacitación al personal de salud, como vía de las capacitaciones a ser desarrolladas.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019 03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019 03/15/2019



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas físicas y financieras para ser ejecutadas durante este periodo (FEB/2020). El MPSBS ha presentado un Plan de Capacitación, incorporando al Instituto Nacional de Salud (INS), dependencia rectora de la capacitación al personal de salud, como vía de las capacitaciones a ser desarrolladas.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/20/2019
	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas físicas y financieras para ser ejecutadas durante este periodo (FEB/2020).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019
	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas físicas y financieras para ser ejecutadas durante este periodo (FEB/2020). El MPSBS ha presentado un Plan de Capacitación, incorporando al Instituto Nacional de Salud (INS), dependencia rectora de la capacitación al personal de salud, como vía de las capacitaciones a ser desarrolladas.	Modify Output	Activate Output	MARTAMA	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/20/2019
						03/19/2019
						03/20/2019
	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Hubo desfases en la implantación y problemas en la cimentación de la fundación, desfasando la obra por la cual se reprogramó el producto para 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019
						03/15/2019
	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas físicas y financieras para ser ejecutadas durante este periodo (FEB/2020).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019
						03/15/2019
	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas físicas y financieras para ser ejecutadas durante este periodo (FEB/2020). El MPSBS ha presentado un Plan de Capacitación, incorporando al Instituto Nacional de Salud (INS), dependencia rectora de la capacitación al personal de salud, como vía de las capacitaciones a ser desarrolladas.	Modify Output	Activate Output	MARTAMA	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	MARTAMA	03/20/2019
						03/20/2019
						03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/19/2019
						03/20/2019
	2.1. Normativas estandarizadas	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo	Modify Output	Modify Financial	MARTAMA	03/11/2019

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas fisicas y financieras para ser ejecutadas durante este period (FEB/2020).	Modify Output	P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se han modificado las metas físicas y financieras del producto, dado que en el periodo ampliado se dotarán a los CEBINFAs con material didáctico y mobiliario. En 2018, se finalizó la formación de los cuidadores de los 29 CEBINFAs existentes en este momento.	Modify Output	Modify Finacial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019
						03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019
						03/12/2019
	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. En acuerdo con el Ministerio de Ninez y Adolescencia, se ha reactivado este producto estableciendo nuevas metas fisicas y financieras para ser ejecutadas durante el periodo ampliado (FEB/2020). Fortalecimiento de los Consejos Municipales mediante la capacitación de los funcionarios de 20 CODENIS en las regiones del PDIT , así como equipamiento informático y mobiliario.	Modify Output	Modify Finacial P(a) value	MARTAMA	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value		MARTAMA
	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha reactivado este output estableciendo nuevas metas fisicas y financieras para ser ejecutadas durante este period (FEB/2020). La capacitacion de las actualizaciones de los indicadores del PDIT contenido en el Sistema Informático Georeferenciado (SIG) en las 6 Regiones Sanitarias (6 microrredes).	Modify Output	Modify Finacial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019
						03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019
	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Con base en el cumplimiento de las condiciones acordadas con la Gerencia del Banco para fortalecer el marco de ejecución y gobernanza del Programa, mitigando los riesgos de su implementación, el Banco tramitó una prórroga adicional de 12 meses al plazo de desembolso. Se ha modificado la meta física para incluir otra evaluación a finalizar el programa en 2020.	Modify Output	Modify Finacial P(a) value	MARTAMA	03/11/2019
						03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	MARTAMA	03/12/2019
				03/12/2019		

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Legal aspects and public processes
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design
