

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1066	Chief of Operations Validation Date	04/22/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/02/19
Last Update	04/16/19	Country Representative Validation Date	05/08/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Job Placement	Loan Number	2660/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	Sector/Subsector	IS-EMP - SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
Team Leader	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1066	5,000,000	5,000,000	5,082,165	0	10,082,165	5,000,000	1,845,579.74	36.91%	3,154,420.26
Aggregated	5,000,000	5,000,000	5,082,165	0	10,082,165	5,000,000	1,845,579.74	36.91%	3,154,420.26

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

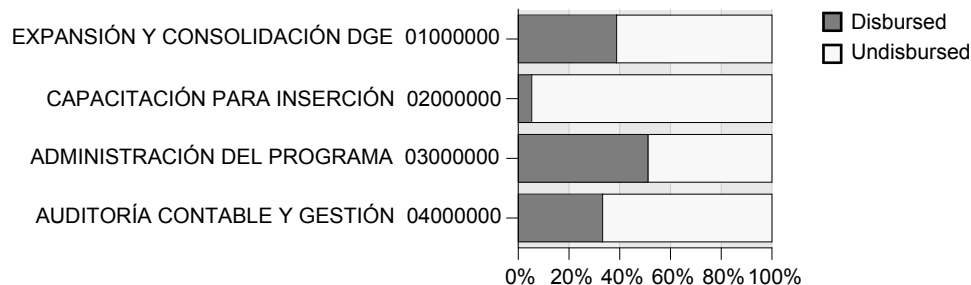

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a mejorar la inserción laboral de jóvenes participantes de las nuevas modalidades de capacitación.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
1.1	Beneficiarios de las nuevas modalidades de capacitación insertados que son mujeres.	Porcentaje	0.00	2011	P	50.00		50.00
					P(a)	50.00		50.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Evaluación de impacto de la intervención en formación para la inserción laboral.

Observations: La evaluación se realizará luego de tres años de implementado el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
1.2	Jóvenes beneficiarios del programa que tienen un empleo formal en comparación al grupo de control	Diferencia porcentual	0.00	2011	P	10.00		10.00
					P(a)	10.00		10.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Evaluación de impacto de la intervención en formación para la inserción laboral.

Observations: La evaluación se realizará luego de tres años de implementado el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
1.3	Ingreso horario promedio de jóvenes beneficiarios del programa en comparación al ingreso horario promedio del grupo de control	Porcentaje	0.00	2011	P	7.00		7.00
					P(a)	7.00		7.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Evaluación de impacto de la intervención en formación para la inserción laboral.

Observations: La evaluación se realizará luego de tres años de implementado el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Capacidad de la Dirección General de Empleo (DGE) de articular servicios a través de la ventanilla única mejorada.

Observation: El Servicio Nacional de Empleo (SENADE) se convirtió en la Dirección General de Empleo (DGE) en septiembre de 2011 mediante un Decreto. Para todas las líneas base se utilizan datos del SENADE para el periodo anterior a la creación de la DGE, y de la DGE p

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Personas atendidas por año la Dirección General de Empleo.	Personas	500.00	2011	P		1,000.00	1,500.00	2,800.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00
					P(a)		1,000.00	3,000.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
					A		2,269.00	15,203.00	17,866.00	29,672.00		0.00

Details

Means of verification: LB: Software de intermediacion laboral. Meta: Base de datos del sistema informático de la ventanilla única

Observations: Para la línea base se utiliza información del Servicio Nacional de Empleo (SENADE) que por Decreto se convirtió en la Dirección General de Empleo en septiembre de 2011.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.2	Tiempo necesario para el registro de cada persona.	Minuto	90.00	2011	P		30.00	30.00	30.00	30.00		30.00
					P(a)		30.00	30.00	30.00	30.00		30.00
					A		30.00	15.00	15.00	15.00		15.00

Details

Means of verification: Informes del Proyecto y Base de datos del sistema informático de la ventanilla única

Observations: Actualmente una persona debe registrarse en cada una de las instituciones, Dirección General de Empleo (ex Servicio Nacional de Empleo), Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL, Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP. La v

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.3	Vacantes registradas por la Dirección General de Empleo (DGE) por año.	Número	80.00	2011	P		200.00	300.00	600.00			1,100.00
					P(a)		200.00	300.00	600.00	900.00		9,931.00
					A		200.00	6,347.00	2,484.00	1,259.00		9,031.00

Details

Means of verification: Línea de Base: Software de intermediacion laboral. Meta: Base de datos del sistema informático de la ventanilla única

Observations: Para la línea base se utiliza información del Servicio Nacional de Empleo que se convirtió en la Dirección General de Empleo en septiembre de 2011.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Personas capacitadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción.	Beneficiaries (#)	0.00	2011	P				2,900.00				2,900.00
					P(a)				500.00	2,130.00	200.00		2,900.00
					A			270.00	1,287.00	1,307.00			2,864.00

Details

Means of verification: Actas de aprobación de los cursos. Base de datos del sistema de ventanilla única.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
	Women				P								
					P(a)								
					A			112.00	0.00	784.00			
	Men				P								
					P(a)								
					A			158.00	0.00	559.00			
	Youth				P								
					P(a)								
					A			180.00	0.00	1,307.00			
	Non-Youth				P								
					P(a)								
					A			90.00	0.00	0.00			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.5	Mujeres capacitadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción.	Número	0.00	2011	P				1,450.00				1,450.00
					P(a)				1,450.00	540.00			1,450.00
					A			112.00	798.00	784.00			1,694.00

Details

Means of verification: Actas de aprobación de los cursos. Base de datos del sistema de ventanilla única.

Observations: Corresponde a una proporción del 50% del total de los capacitados.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Expansión y consolidación de la Dirección General de Empleo y de la Red de Oficinas de Empleo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Oficina de Asunción de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionada, equipada y funcionando.	Oficina	P		1		292,300
			P(a)	0	1	386,019.59	2,294,841.04
			A	0	0	588,488.08	1,579,841.04
1.2	Personal de la Dirección General de Empleo DGE y del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL capacitado	Personas	P	50	200	30,000	158,000
			P(a)	41	200		83,924.49
			A	19	128	9,783.12	54,924.49
1.3	Estrategia de vinculación con los beneficiarios (buscadores de empleo) implementada	Estrategia	P		1	19,000	115,000
			P(a)		1	0	15,165.66
			A	0	1	0	15,165.66
1.4	Estrategia de comunicación de resultados de la ventanilla única implementada	Estrategia	P		1	18,000	100,000
			P(a)		1	24,000	30,000
			A	0	0	0	0
1.5	Portal de empleo implementado.	Portal	P		1	9,600	50,000
			P(a)		1	7,125	42,182.55
			A	0	1	0	35,057.55
1.6	Oficinas del Departamento Central de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionadas, equipadas y funcionando.	Oficina	P	1	3	120,000	741,250
			P(a)	1	3	0	632,120.77
			A	0	0	0	88,808.51
1.7	Calidad de procesos de la Dirección General de Empleo certificada	Certificado	P		1	9,300	226,500
			P(a)	0	1	0	5,000
			A	0	0	0	0
1.8	Modelo de información de la Dirección General de Empleo diseñado.	Estudio	P		1		5,000
			P(a)		1	0	96,801.99
			A	0	1	0	96,801.99
1.9	Sistema informático de la ventanilla única funcionando.	Sistema	P		1		195,000
			P(a)		1	625,135	1,064,591.18
			A	0	1	325,252.23	764,708.41
1.10	Sistema de monitoreo y seguimiento de inserción de las personas atendidas por la ventanilla única implementado	Sistema	P		1	24,000	200,000
			P(a)		1	25,837.5	113,351.23
			A	0	1	0	87,513.73
1.11	Sistema integrado de información sobre el mercado laboral implementado.	Sistema	P		1	35,000	218,000
			P(a)		1	0	200,000
			A	0	1	0	0
1.12	Oficinas Regionales de la Dirección General de Empleo (DGE) construidas, equipadas y funcionando	Oficina	P	1	4	572,800	1,177,600
			P(a)	1	4	0	890,000
			A	0	0	0	0
1.13	Informes de medición de calidad y relevancia de la capacitación publicados	Informe	P	1	4	24,500	115,000
			P(a)	1	4	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.14	Sistema de gestión de los servicios de intermediación implementado.	Sistema	P		1	30,000	150,000
			P(a)		1	0	0
			A	0	1	46,942.85	46,942.85
1.15	Plan de vinculación de la Dirección General de Empleo con el sector privado implementado.	Plan	P		1	40,000	195,000
			P(a)		1	0	198,738.57

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.15	Plan de vinculación de la Dirección General de Empleo con el sector privado implementado.	Plan	A	0	1	0	18,738.57

Component Nbr. 2 Capacitación para la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Personas formadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción	Beneficiaries (#)	P	800	2,900	473,684	1,844,590
			P(a)	750	3,184	404,000	1,844,590
			A	1,307	2,890	586,377.87	701,102.92
2.2	Personas identificadas mediante el instrumento de diagnóstico de habilidades.	Personas	P	1,600	5,900	639,384	2,393,000
			P(a)	800	5,900	316,250	850,197.52
			A	457	4,967	0	50,197.52

Component Nbr. 3 Administración, Auditorías e Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

Administración		P			132,000	660,960
		P(a)			110,257	660,960
		A			85,717.99	325,164.98
Auditorías		P			20,000	100,000
		P(a)			8,663	100,000
		A			8,465	32,825.63
Imprevistos		P			101,228	337,450
		P(a)			0	337,450
		A			0	0
Evaluaciones del programa		P			120,000	250,000
		P(a)			0	250,000
		A			0	0
Evaluaciones de la capacitación para la inserción.		P			100,800	322,000
		P(a)			0	322,000
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P			2,533,402	10,081,915
		P(a)			1,921,287.09	10,081,915
		A			1,651,027.14	3,897,793.85

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Calidad de procesos de la Dirección General de Empleo certificada	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
	Estrategia de comunicación de resultados de la ventanilla única implementada	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
	Informes de medición de calidad y relevancia de la capacitación publicados	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
				Modify Physical P(a) value	ENZOH	03/09/2019
					MANUEL U	04/01/2019
	Oficina de Asunción de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionada, equipada y funcionando.	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	03/09/2019
						04/02/2019
						04/02/2019
						04/02/2019
	Oficina móvil de la Dirección General de Empleo (DGE) implementada y funcionando	El Ministerio recibió una unidad móvil de AECID como donación, por lo cual no se requiere la compra de la misma por el proyecto.	Modify Output	Inactivate Output	MANUEL U	04/03/2019
	Oficinas Regionales de la Dirección General de Empleo (DGE) construidas, equipadas y funcionando	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
				Modify Physical P(a) value	ENZOH	03/09/2019
	Oficinas del Departamento Central de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionadas, equipadas y funcionando.	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
						04/02/2019
				Modify Physical P(a) value	ENZOH	03/09/2019
						04/02/2019
	Personal de la Dirección General de Empleo DGE y del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL capacitado	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
					MANUEL U	04/03/2019
				Modify Physical P(a) value	ENZOH	03/09/2019
						04/02/2019
	Personas formadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	03/09/2019
						04/02/2019
				Modify Physical P(a)	ENZOH	03/09/2019
						03/09/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Personas formadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	value	ENZOH	04/02/2019
	Personas identificadas mediante el instrumento de diagnóstico de habilidades.	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	03/09/2019
						04/02/2019
				Modify Physical P(a) value	ENZOH	03/09/2019
	Plan de vinculación de la Dirección General de Empleo con el sector privado implementado.	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019
						04/02/2019
	Sistema integrado de información sobre el mercado laboral implementado.	Replanificado de acuerdo a la prorroga de proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ENZOH	04/02/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
