

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1110	Chief of Operations Validation Date	04/15/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/15/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the National Integrated Care System	Loan Number	3706/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	22,913,664.23	45.83%	27,086,335.77
Aggregated	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	22,913,664.23	45.83%	27,086,335.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

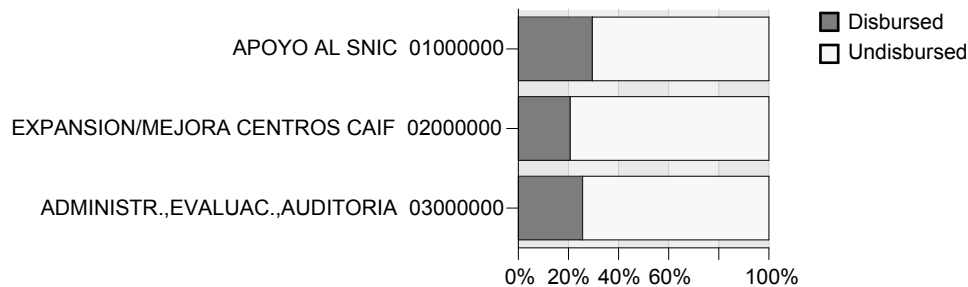

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Observation: Específicamente se apoyará el fortalecimiento del SNIC y la expansión de servicios de calidad para menores de tres años.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14.00	2016	P	10.00	10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

Details

Means of verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITES-R entre 5 y 7.	% centros CAIF	0.00	2016	P	80.00	80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		

Details

Means of verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ITES-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.00	2016	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		

Details

Means of verification: EUT 2013 y 2019

Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado	hs semanales	21.20	2016	P	20.00	20.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	infantil.	de cuidado infantil	21.20	2016	P(a)		20.00	20.00
					A			
Details								
Means of verification: EUT 2013 y 2019								
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)								
Pro-Gender	Yes			Pro-Ethnicity	No			
	Mujeres				P		20.00	20.00
					P(a)		20.00	20.00
					A			
	Varones				P		16.00	16.00
					P(a)		16.00	16.00
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00	50.00
					P(a)	25.00	50.00	50.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	75.00	100.00	100.00
					P(a)	75.00	100.00	100.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00
					P(a)	50.00	100.00	100.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P(a)	50.00	100.00	100.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0.00	2016	P	3,500.00	5,000.00
					P(a)	3,500.00	5,000.00
					A		

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00
					P(a)	25.00	50.00
					A		

Details

Means of verification: Informes SNIC

Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0.00	2016	P	50.00	80.00
					P(a)	50.00	80.00
					A		

Details

Means of verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del PI.	%	60.00	2016	P	80.00	90.00
					P(a)	80.00	90.00
					A		

Details

Means of verification: Informes semestrales de avances del programa.

Observations: Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64.00	2016	P	68.00	72.00
					P(a)	68.00	72.00
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos y visita de inspección in loco.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)	tasa niños/cupos	0.00	2016	P	85.00	95.00
					P(a)	85.00	95.00
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos INAU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	0	1	182,945	561,645
			P(a)	0	1	26,444	588,087
			A	0	1	32,853	59,295
1.2	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	3	5	887,592	4,036,083
			P(a)	4	5	1,145,288	4,680,408
			A	4	4	849,307	1,796,899
1.3	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - diseño RNC	P	0	1	39,528	150,898
			P(a)	1	0	0	150,898
			A	0	0	0	0
1.4	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	3	5	284,702	878,722
			P(a)	3	5	352,430	1,632,179
			A	0	0	467,029	598,393
1.5	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	2,000	10,500	369,938	1,544,144
			P(a)	3,000	18,278	307,700	1,559,497
			A	4,132	9,278	160,187	175,542
1.6	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	1	4	923,540	3,318,400
			P(a)	1	5	1,478,138	3,466,082.5
			A	1	3	14,677	650,363
1.7	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	1	5	42,700	85,400
			P(a)	1	5	47,117	85,400
			A	1	2	17,765	17,765
1.8	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de	P	30	120	375,000	1,046,875
			P(a)	30	81	396,290	1,616,603
			A	33	68	93,222	662,951
1.9	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	3	15	118,035	1,007,573
			P(a)	3	16	419,874	1,185,430
			A	4	7	359,641	563,416
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	2	12	437,911	1,197,186
			P(a)	2	12	388,597	5,733,972
			A	1	4	13,342	132,120
1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resulta	P	1	3	71,370	339,484
			P(a)	1	5	87,450	426,507
			A	1	2	87,957	192,823
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	8	28	315,739	880,418
			P(a)	8	25	240,066	1,039,589
			A	5	15	122,879	316,668
1.13	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	# instrumentos de medición de	P	2	3	0	36,600
			P(a)	2	1	0	36,600
			A	0	0	0	0
1.14	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Documento - diseño de instrume	P	0	1	116,029	133,379
			P(a)	0	1	95,210	145,938
			A	0	0	51,076	70,627
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	0	1	261,149	608,653
			P(a)	0	1	96,915	612,499

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	A	0	1	66,237	70,089
1.16	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervis	P	0	1	24,400	442,491
			P(a)	1	1	100,518	442,490
			A	0	0	45,310	45,310
1.17	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cu	P	580	980	228,227	851,717
			P(a)	580	980	195,679	987,560
			A	0	0	149,249	307,739
1.18	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento	P	1	1	19,905	61,000
			P(a)	1	1	23,707	60,982
			A	0	0	12,777	12,777
1.19	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuida	P	130	980	51,850	91,500
			P(a)	130	980	51,850	91,500
			A	0	0	0	0
1.20	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	3	5	336,237	1,039,311
			P(a)	4	5	361,469	1,105,464
			A	5	5	171,289	249,103

Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	55	142	34,047	122,001
			P(a)	55	142	0	122,001
			A	55	55	0	0
2.2	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	7	50	11,381,793	37,939,310
			P(a)	7	50	18,917,552	38,808,874
			A	3	0	6,696,393	7,565,958
2.3	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Positivas.	# centros CAIF	P	30	70	251,345	592,787
			P(a)	30	70	354,823	626,785
			A	20	0	232,270	266,267
2.4	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuida	P	480	600	160,401	666,270
			P(a)	480	600	251,605	678,858
			A	0	0	87,123	99,713

Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	1	3	0	915,000
			P(a)	1	2	105,172	915,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración y ejecución del proyecto	P			1,633,660	6,393,153
		P(a)			1,392,575	7,276,845
		A			628,697	1,548,573
	Evaluación y Auditoría	P			10,000	60,000
		P(a)			11,034	148,056
		A			99,090	99,090

Total Cost

	Total Cost	P			18,558,043	65,000,000
		P(a)			26,847,503	74,224,104.5
		A			10,458,370	15,501,481

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Campañas de comunicación implementadas.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/19/2019
				Modify Physical P(a) value		03/21/2019
	Centros CAIF construidos.	El costo de la construcción de los centros fue superior al planificado en la fase de diseño.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Positivas.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	Sólo se evaluará centros Inau	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
						03/21/2019
	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
	Centros de educación y cuidado infantil supervisados bajo el nuevo modelo.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	El modelo que solo aplica a los centros MEC	Modify Output	Modify Output name	MICHELU	03/20/2019
	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	El cambio está en línea con el cambio en el producto 1.13 ya que se propone realizar los censos	Modify Output	Modify Output name	MICHELU	03/20/2019
	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
						03/21/2019
	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/19/2019
	Diseño de instrumento común de medición de DIT en centros de educación y cuidado infantil validado por la Comisión Interinstitucional de Infancia (CII).	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa. El producto fue ajustado en su definición.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a)	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	value	MICHELU	
	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	No se implementará el DIT porque los organismos continúan trabajando con sus instrumentos de evaluación de desarrollo. Sí se realizará un censo en centros privados porque el único se hizo en 2007, en éste censo, además, se le incorporarían dimensiones como la de desarrollo infantil	Modify Output	Modify Output name	MICHELU	03/20/2019
	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
	Encuestas de opinión realizadas.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/19/2019
	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
						03/21/2019
	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/20/2019
	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/20/2019
						03/21/2019
	Instrumentos de medición de DIT piloteados.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/19/2019
	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/20/2019
	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a)	MICHELU	03/19/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	value		
				Modify Physical P(a) value	MICHELU	03/19/2019
	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Sólo se trabajará con centros supervisados por MEC dado que INAU esta trabajando en la reestructura de su modelo de supervisión	Modify Output	Modify Output name	MICHELU	03/20/2019
	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/19/2019
						03/20/2019
						03/21/2019
	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/19/2019
						03/21/2019
	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value		03/19/2019
	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
						03/20/2019
	Prestaciones reguladas.	Ajuste en la planificación de acuerdo al informe semestral que no afectará el logro de objetivos del programa	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MICHELU	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value		03/20/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
