

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1135	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Agricultural Public Management II	Loan Number	3800/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	Sector/Subsector	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	HINTZE, LUIS HERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	2,562,239.35	33.71%	5,037,760.65
Aggregated	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	2,562,239.35	33.71%	5,037,760.65

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

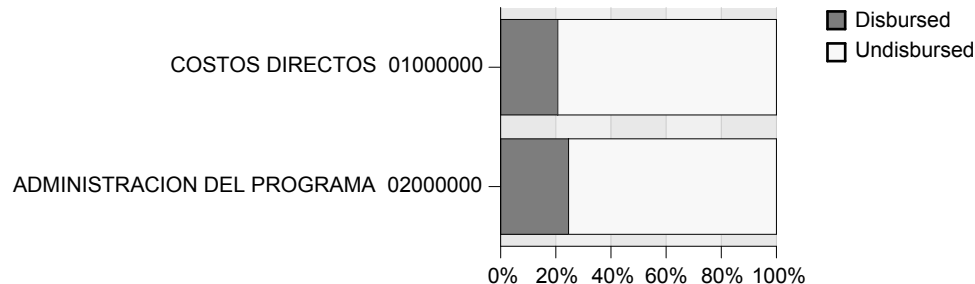

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

Observation: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4,060.00	2015	P	4,400.00
					P(a)	4,400.00
					A	

Details

Means of verification: Uruguay XXI

Observations: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 1: Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

Observation: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.00	2015	P	312.00
					P(a)	312.00
					A	

Details

Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

Observation: Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P		2.78
					P(a)		2.78
					A		

Details

Means of verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P		1.07
					P(a)		1.07
					A		

Details

Means of verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

Observation: El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.00	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

Details

Means of verification: VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

Observations: El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.00	2013	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)							
Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Mejora en la eficiencia del laboratorio

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.00	2015	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.00	2015	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones ele	P	0	32,400	77,018	236,327
			P(a)	0	32,400	50,294.29	228,242.47
			A	0	0	59,225.2	133,511.14
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos consti	P	1,000	10,000	57,734	178,305
			P(a)	1,000	10,000	44,294.29	141,744.9
			A	0	0	35,794.86	81,013.57
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados p	P	0	100	129,511	538,379
			P(a)	0	100	102,787.42	480,518.72
			A	0	0	69,431.63	212,606.11
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	0	9	220,894	359,168
			P(a)	0	9	206,454.43	160,587.88
			A	0	0	31,684.52	64,856.55
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión tota	P	10	83	264,019	935,309
			P(a)	34	179	181,073.92	901,950.99
			A	72	86	71,364.08	208,753.33
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	0	1	454,542	710,471
			P(a)	0	1	49,542.11	973,742.73
			A	0	0	44,599.24	106,918.16
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	1	4	94,288	348,033
			P(a)	1	4	89,287.87	336,072.91
			A	0	0	70,438.24	196,684.66
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por e	P	5	25	72,032	320,535
			P(a)	5	31	67,032.43	257,822.27
			A	13	18	29,090.48	56,090.94

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e im	P	20	100	205,541	925,743
			P(a)	20	100	145,974.23	938,344.59
			A	25	45	222,427.41	402,585.26
2.2	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIG	P	0	10	199,565	899,030
			P(a)	0	18	141,005.87	752,151.94
			A	0	0	91,274.41	224,772.27
2.3	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equi	P	20	100	281,565	724,030
			P(a)	10	100	574,005.87	363,832.54
			A	10	10	59,332.31	161,959.16
2.4	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	4	23	43,565	119,030
			P(a)	4	23	16,005.87	69,554.85
			A	3	6	9,491.15	61,175.18
2.5	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	2	8	30,976	76,713
			P(a)	0	10	29,968.36	44,358.11
			A	2	2	4,970.38	10,978.44
2.6	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	250	1,200	39,576	273,713
			P(a)	250	1,619	38,568.36	258,826.98
			A	669	719	33,439.25	39,447.31
2.7	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	3	24	65,976	226,713
			P(a)	6	54	29,968.36	194,853.61
			A	21	24	15,465.88	21,473.94
2.8	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistem	P	2	3	266,794	598,758
			P(a)	2	10	265,786.18	367,800.76
			A	0	0	42,186.29	48,194.35

Other Cost

	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			106,315	529,743
		P(a)			68,119.13	378,205.09
		A			58,565	135,789.65

Total Cost

	Total Cost	P			2,609,911	8,000,000
		P(a)			2,100,168.99	6,848,611.34
		A			948,780.33	2,166,810.02

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
						03/21/2019
	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
						03/21/2019
	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
						03/19/2019
	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a)	FBACHINO	03/19/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	value	FBACHINO	03/19/2019
	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
						03/21/2019
	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
						03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	Los ajustes surgen de la actualización de la planificación realizada por el Organismo Ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/19/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation
