

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1145	Chief of Operations Validation Date	10/16/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	MSME Competitiveness Support Program	Loan Number	2923/OC-AR
Executing Agency	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	CASABURI, GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1145	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	31,084,859	62.17%	18,915,141
Aggregated	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	31,084,859	62.17%	18,915,141

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

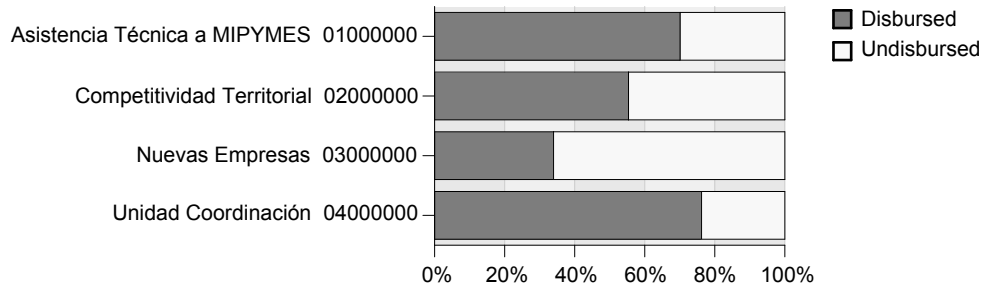

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Productividad de las MIPYMES mejorada

Observation: Valor línea de base: a construir. Ver Anexo II del POD. Medios de verificación: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Bases de datos del sistema de monitoreo y evaluación del Programa. Encuesta a empresas participantes y al grupo de control.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		

Details

Means of verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

Observations: Línea de base a construir

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.2	Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P		2.00
					P(a)		2.00
					A		

Details

Means of verification: Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros

Observations: Línea de base a construir

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.3	Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.

Observations: Línea de base a construir

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

Observation: Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC. Evaluación final del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70.00	2012	P				55.00
					P(a)				55.00
					A				

Details

Means of verification: Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final

Observations: Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES beneficiarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

Observation: Informes de avance del Programa. Evaluaciones del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2020
2.1	Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión colectiva territorial	Numero de acciones	0.00	2013	P	4.00			10.00
					P(a)	4.00			10.00
					A	0.00			

Details

Means of verification: Informes de avance del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

Observation: Reportes del sistema de monitoreo y evaluación. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Informes semestrales de ejecución. Evaluaciones del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2020
3.1	Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %	0.00	2012	P				15.00
					P(a)				15.00
					A				

Details

Means of verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

Observations: Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervivencia entre las empresas del programa y las del grupo control

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 4: Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

Observation: Reportes del sistema de monitoreo y evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2020
4.1	Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18.00	2012	P	2.00			5.00
					P(a)	2.00			5.00
					A	0.00			

Details

Means of verification: Informes de avance del programa

Observations: Línea de base: Empresas existentes 18% - Emprendedores: 27%

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 5: Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

Observation: Reportes del sistema de monitoreo y evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2020
5.1	Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5.00	2012	P				6.50
					P(a)				6.50
					A				

Details

Means of verification: Informes de avance del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Asistencia Técnica a MIPYMES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Micro / small / medium enterpr	P	80	1,500	5,300,000	37,600,000
			P(a)	80	2,062	4,829,992	33,450,000
			A	149	2,131	2,223,702	24,267,634

Component Nbr. 2 Articulación Productiva y Competitividad Territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Número de aglomerados	P		7	600,000	11,100,000
			P(a)	0	4		2,546,356
			A	0	4	49,983	2,596,339
2.2	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Número de aglomerados	P		9	200,000	3,600,000
			P(a)		25	1,315,769	9,383,644
			A	0	25	734,106	2,930,812
2.3	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P		20		1,640,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Apoyo a Nuevas Empresas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Número de emprendedores y empr	P	60	400	1,200,000	12,000,000
			P(a)	60	480	890,916	7,980,645
			A	31	451	174,587	7,264,316
3.2	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Número de acciones	P	3	30	160,000	1,710,000
			P(a)	3	22	69,908	1,030,684
			A	0	19	35,898	996,674
3.3	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P		25		3,900,000
			P(a)	0	41	37,800	382,480
			A	0	41	9,687	301,447
3.4	Talleres y otras acciones de fomento del rol de la mujer emprendedora realizadas	Número de actividades	P	1	9	50,000	450,000
			P(a)	1	1	150,000	150,000
			A	0	0	0	0
3.5	Proyecto de transformación digital del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) iniciado	Proyecto	P		0		0
			P(a)	1	1	5,976,200	16,359,191
			A	1	1	102,409	102,409

Component Nbr. 4 Administración

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración	P			1,600,000	8,000,000
--	----------------	---	--	--	-----------	-----------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administración	P(a)			524,127	8,850,000
		A			145,000	2,014,724

Total Cost

	Total Cost	P			9,110,000	80,000,000
		P(a)			13,794,712	80,133,000
		A			3,475,372	40,474,355

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Se ajusta la planificación financiera para el 2019 y el 2020 pues, por error, no se había incorporado este último año en la matriz. De esta manera, todos los costos habían quedado concentrados en 2019 cuando el plazo para desembolsos del Programa vence en marzo de 2020. Esto puede verificarse en los reportes semestrales 2018-II y 2019-I presentados por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	MCORAGGIO	09/20/2019
	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Se ajusta la planificación financiera para el 2019 y el 2020 pues, por error, no se había incorporado este último año en la matriz. De esta manera, todos los costos habían quedado concentrados en 2019 cuando el plazo para desembolsos del Programa vence en marzo de 2020. Esto puede verificarse en los reportes semestrales 2018-II y 2019-I presentados por el Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JUANZE	09/24/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
