

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1157	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/16/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	<b>Loan Number</b>	3169/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	<b>Sector/Subsector</b>	PS-PYM - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
<b>Team Leader</b>	CASABURI, GABRIEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	PROVINCIA DE MENDOZA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1157	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	31,653,098.36	63.31%	18,346,901.64
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>29,000,000</b>	<b>0</b>	<b>79,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>31,653,098.36</b>	<b>63.31%</b>	<b>18,346,901.64</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

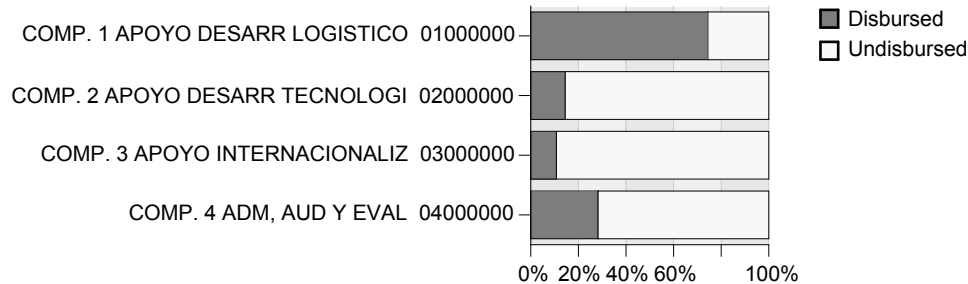

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Aumento de la competitividad de la economía mendocina

**Observation:** Índice Provincial de Competitividad (IPC). El IPC es un algoritmo que agrupa en siete dimensiones o factores los determinantes claves para definir el grado de competitividad de una provincia: personas, empresas, infraestructura, gobierno, recursos naturales, innovación, ciencia y tecnología y resultados económicos. El IPC es elaborado en forma bianual por la Bolsa de Comercio de Córdoba

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Aumento de la competitividad de la economía mendocina	Indice	2,589.00	2013	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa	US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013	P		0.65
					P(a)		0.65
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.	Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013	P		41.10
					P(a)		41.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.2	Ingreso de camiones a la zona residencial	% de camiones ingresados a Godoy Cruz	100.00	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.3	Número de productos que pueden ser atendidos en la ZPA.	Capítulos del NCM	58.00	2013	P		83.00
					P(a)		83.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.4	Tiempo promedio de espera de camiones en la ZPA	Horas	48.00	2013	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.0	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Empresas	0.00	2013	P		11.00
					P(a)		10.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.1	Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.	Porcentaje	0.00	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.2	Entidades nacionales o provinciales de apoyo al sector productivo con presencia en el polo del conocimiento.	Entidades radicadas	0.00	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.3	Profesionales radicados en el Polo del Conocimiento que trabajan en plataformas que	Profesionales	0.00	2013	P		80.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.3	proveen servicios para las empresas localizadas	Profesionales	0.00	2013	P(a)		80.00
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.3	Diferencia en la tasa de supervivencia de los emprendedores asistidos/apoyados por el Programa y los emprendedores del grupo de control	Porcentaje	0.00	2017	P	
				P(a)		15.00
				A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.4	Empresas de base tecnológica con compromiso de radicación en el Polo del Conocimiento	Empresas radicadas	0.00	2013	P	20.00
				P(a)		20.00
				A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.5	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P	10.00
				P(a)		10.00
				A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones

#### Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2016	P	15.00
				P(a)		15.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2016	A		
Details							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.2	Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones	Micro / small / medium enterprises (#)	1,000.00	2013	P		1,400.00
					P(a)		1,400.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.3	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo al desarrollo logístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P		1		51,400,000
			P(a)	0	1	5,645,208	50,405,500.64
			A	0	1	192,744	44,947,536.64
1.2	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Unidad	P		0		0
			P(a)	1	1	5,025,623	7,050,000
			A	0	0	1,034	25,411
1.3	RPN82 Túnel 1: obra terminada	Unidad	P		0		0
			P(a)		1		5,165,452
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P		200		450,000
			P(a)	4	60	466,731	750,001
			A	12	68	2,360	285,630
2.2	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	546,613	750,001.2
			A	0	1	28,172	231,560.2
2.3	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Unidad	P		0		0
			P(a)	19	40	3,239,127	3,749,999.75
			A	42	63	120,507	631,379.75
2.4	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Contratos de Mutuo suscriptos	P		0		0
			P(a)	15	15	250,000	6,256,009
			A	1	1	0	6,006,009
2.5	Obra acueducto finalizada	Obra finalizada	P		0		0
			P(a)		1		15,050,000
			A	0	0	0	0
2.6	Cursos de capacitación en habilidades digitales - Programa Mendoza TEC	Cursos	P		0		0
			P(a)		15		2,853,878
			A	0	0	23,238	23,238

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente III: Apoyo a la internacionalización

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Sistema	P		1		380,000
			P(a)	1	1	345,000	345,000
			A	0	0	1,919	1,919
3.2	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P		1		256,000
			P(a)	0	1	161,982	256,000
			A	0	1	0	94,018
3.3	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Estudios	P		5		725,000
			P(a)	2	2	605,000	655,000
			A	1	1	44,500	44,500
3.4	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P		1		220,000
			P(a)	0	0	161,000	165,360
			A	0	0	804	5,164
3.5	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Funcionarios	P		15		619,000
			P(a)	7	10	320,875	472,800
			A	15	18	0	151,925
3.6	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P	5	25	340,000	1,700,000
			P(a)	5	25	920,280	1,699,992
			A	3	23	34,958	518,164
3.7	Espacios logísticos asignados	Empresas asistidas	P		0		0
			P(a)		30		100,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación.	P			730,000	3,650,000
		P(a)			1,829,140	3,336,000
		A			32,530	989,569
	Imprevistos	P				1,000,000
		P(a)			500,000	500,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			8,095,000	79,000,000
		P(a)			24,221,449	103,883,389.59
		A			482,766	54,073,549.59



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Cursos de capacitación en habilidades digitales - Programa Mendoza TEC	Se agrega el producto correspondiente a una de las actividades del Proyecto Mendoza TEC, aprobado mediante nota CSC/CAR 3010/2018 (ver pág. 26 del documento #EZSHARE-1832790573-593).	Create Output	N/A	MCORAGGIO	09/18/2019
	Espacios logísticos asignados	Se incorpora el producto a fin de reflejar la meta esperada en relación a la iniciativa "Plataformas logísticos-comerciales en China", actividad aprobada mediante nota CSC/CAR 3076/2018.	Create Output	N/A	MCORAGGIO	09/18/2019
	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Se ajustaron los valores de acuerdo a lo consignado por el Ejecutor en su informe semestral 2019-I.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	09/18/2019
	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Se ajustaron los valores de acuerdo a lo consignado por el Ejecutor en su informe semestral 2019-I.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	09/18/2019
	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Se ajustaron los valores de acuerdo a lo consignado por el Ejecutor en su informe semestral 2019-I.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	09/18/2019
	Obra acueducto finalizada	Se añade el producto que corresponde a una obra que demandará una suma importante de recursos de la operación y que forma parte de varias actividades que se financiarán en el marco del Programa de Mejora Competitiva (PMC) para el sector Ganadero de la Provincia. Todo esto fue aprobado mediante nota CSC/CAR 3374/2018.	Create Output	N/A	MCORAGGIO	09/18/2019
	Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Se inactivó el producto debido a que el Ejecutor decidió no avanzar con esta iniciativa y canalizar los fondos hacia otras intervenciones como el apoyo al Plan de Mejora Competitiva (PMC) ganadero de la provincia y el Proyecto Mendoza TEC.	Modify Output	Inactivate Output	MCORAGGIO	09/18/2019
	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Se ajustaron los valores de acuerdo a lo consignado por el Ejecutor en su informe semestral 2019-I.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MCORAGGIO	09/18/2019
				Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	09/18/2019
	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Se inactivó el producto debido a que el Ejecutor decidió no avanzar con esta iniciativa y canalizar los fondos hacia otras intervenciones como el apoyo al Plan de Mejora Competitiva (PMC) ganadero de la provincia y el Proyecto Mendoza TEC.	Modify Output	Inactivate Output	MCORAGGIO	09/18/2019
	RPN82 Túnel 1: obra terminada	Se incorpora el producto dado que esta obra forma parte de las intervenciones viales menores que se acordaron realizar para aprovechar los ahorros obtenidos en el componente. Mediante nota CSC/CAR 2095/2019 se otorgó la no objeción al informe de evaluación y recomendación de preadjudicación de la obra.	Create Output	N/A	MCORAGGIO	09/18/2019
			Modify Output	Modify Unit of Measure	MCORAGGIO	09/18/2019
	RPN82 terminada y habilitada	Se ajustaron los valores de acuerdo a lo consignado por el Ejecutor en su informe semestral 2019-I.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	09/18/2019
	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Se ajustaron los valores de acuerdo a lo consignado por el Ejecutor en su informe semestral 2019-I.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	MCORAGGIO	09/18/2019

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
