

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1302	Chief of Operations Validation Date	10/22/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to support the equity and effectiveness of the social safety net in Argentina	Loan Number	4648/OC-AR, 4648/OC-AR-1, 4648/OC-AR-2, 4648/OC-AR-3, 4648/OC-AR-4, 4648/OC-AR-5
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION, Ministerio del Interior y Transporte, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	TRISTAO, IGNEZ M.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1302	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	891,950,000	99.11%	8,050,000
Aggregated	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	891,950,000	99.11%	8,050,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

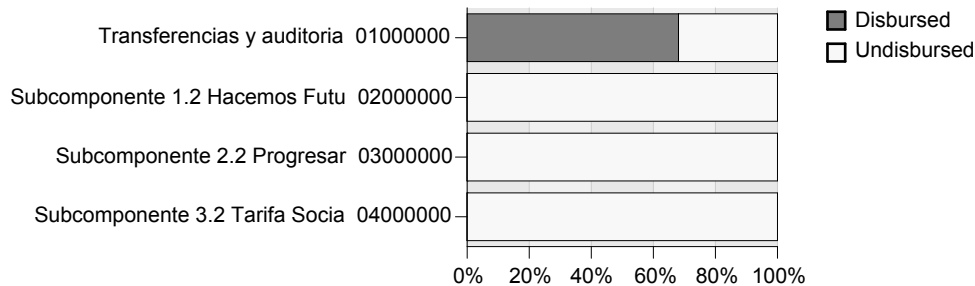

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Aumento del empleo registrado en el sector formal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acceden a un empleo registrado en el sector formal	%	3.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) en base a datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino.							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		

Impact Nbr. 1: Aumento del porcentaje de jóvenes que aprueban las materias según el plan de estudios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.0	Beneficiarios de Becas Progresar en el nivel superior que aprueban al menos 50% de las materias requeridas según su plan de estudios	%	20.00	2017	P	35.00	35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología (MECCT) en base a datos administrativos de las universidades y las instituciones de educación terciaria.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 2: Mayor ahorro en transporte como porcentaje del gasto no alimentario

Observation:

Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.0	Ahorro promedio en gastos de transporte debido a la Tarifa Social como porcentaje del gasto no alimentario de los hogares de menores ingresos	%	4.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012-2013 y datos del Ministerio de Transporte (MTR)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Empleabilidad de población vulnerable mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acreditaron la finalización de cursos de formación laboral integral.	%	3.00	2017	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Reporte del MSDS con base en datos administrativos de las instituciones homologadas y/o los certificados presentados por los titulares en ANSES.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Titulares de Hacemos Futuro con secundario incompleto que asisten a un establecimiento educativo.	%	31.00	2017	P	45.00	45.00
					P(a)	45.00	45.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Reporte del MSDS en base a los certificados presentados por los titulares en ANSES.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Regularidad educativa entre jóvenes de 18 a 24 años mantenida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Beneficiarios de las Becas Progresar en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo	%	49.00	2017	P	50.00	50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A	50.77	

Details

Means of verification: Reporte del MECCT en base a información administrativa de las universidades e instituciones de educación terciaria a nivel nacional.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Acceso al servicio de transporte público por parte de la población vulnerable aumentado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Cobertura a nivel nacional del subsidio social a la tarifa de transporte	%	27.30	2017	P	29.30		29.30
					P(a)	29.30		29.30
					A	0.00		

Details

Means of verification: Reporte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos administrativos del universo de beneficiarios potenciales.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Empleabilidad de beneficiarios de programas de protección social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Personas por año que recibieron una transferencia de ingreso con contraprestación de formación	Número de personas por año	P	174,266	285,602	291,228,571	438,200,000
			P(a)	174,266	285,602	291,228,571	438,200,000
			A	129,755	241,091	274,343,688	421,315,117
1.2	Instrumento de relevamiento de competencias y trayectorias laborales validado en terreno	Instrumento	P	1	1	68,000	68,000
			P(a)	1	1	68,000	68,000
			A	1	1	0	0
1.3	Sistema predictivo de demanda laboral local en funcionamiento	Sistema	P	0	1	327,000	1,932,000
			P(a)	0	1	327,000	1,932,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Jóvenes de 18 a 30 años que recibieron transferencia de ingreso con una contraprestación educativa	Número de personas por año	P	138,211	360,621	84,703,348	185,535,000
			P(a)	138,211	360,621	84,703,348	185,535,000
			A	265,514	487,924	98,750,115	199,581,767
2.2	Sistema de Gestión Integral de Progresar en funcionamiento	Plataforma informática	P	0	1	1,300,000	2,300,000
			P(a)	0	1	1,300,000	2,300,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3: Accesibilidad al transporte público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	Número de usos	P	1,100,000,000	1,627,000,000	185,401,775	267,800,000
			P(a)	1,100,000,000	1,627,000,000	185,401,775	267,800,000
			A	83,063,869	610,063,869	156,830,930	239,229,155
3.2	Encuesta de movilidad en troncales de transporte público finalizada	Encuesta	P	0	1	540,000	950,000
			P(a)	0	1	540,000	950,000
			A	0	0	0	0
3.3	Sistema de gestión de flota en funcionamiento	Plataforma informática	P	0	1	440,000	1,050,000
			P(a)	0	1	440,000	1,050,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4: Apoyo al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Sistema Integrado de Información Social desarrollado	Sistema	P	0	1	0	893,920
			P(a)	0	1	0	893,920
			A	0	0	0	0
4.2	Modelo de Gestión de la Información desarrollado	Modelo	P	0	1	0	355,560
			P(a)	0	1	0	355,560
			A	0	0	0	0
4.3	Plan de evaluación del programa finalizado	Plan	P	0	1	100,520	700,520
			P(a)	0	1	100,520	700,520
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoría externa	P			155,000	215,000
		P(a)			155,000	215,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			564,264,214	900,000,000
		P(a)			564,264,214	900,000,000
		A			529,924,733	860,126,039

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Project Management Capacity
