

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1064	Chief of Operations Validation Date	10/23/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program	Loan Number	2719/BL-BO, 2719/BL-BO-1, 2719/BL-BO-2
Executing Agency	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	JOHANNSEN, JULIA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Estado Plurinacional de Bolivia		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1064	20,000,000	19,342,993.75	2,000,000	0	22,000,000	19,342,993.75	19,103,970.01	98.76%	239,023.74
Aggregated	20,000,000	19,342,993.75	2,000,000	0	22,000,000	19,342,993.75	19,103,970.01	98.76%	239,023.74

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

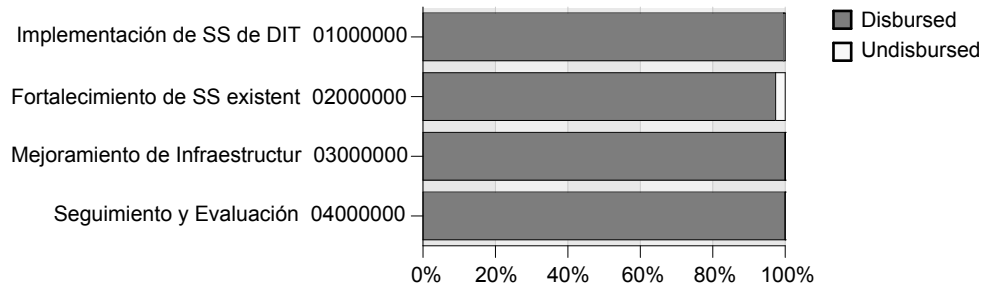

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a mejorar en forma sostenible y con pertinencia cultural, el desarrollo cognitivo, socio-emocional y físico de niñas y niños bolivianos

Observation: Los indicadores son desagregados por sexo y culturalmente adecuados en cuanto a su instrumento de medición.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.0	Porcentaje de niños/as rezagados en desarrollo cognitivo (test psicomotor y de lenguaje) (en municipios intervenidos)	%	10.80	2014	P		
					P(a)	10.20	
					A	10.60	10.60

Details

Means of verification: Informes semestrales del ejecutor, con base en la evaluación de impacto del programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
0.1	Niñas menores de 4 años rezagadas en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje según módulo de comunicación del ASQ) en municipios intervenidos.	%		2014	P			
					P(a)			
					A			

Details

Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervención.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.2	Porcentaje de niños/as con desnutrición crónica (en municipios intervenidos)	%	21.00	2008	P		
					P(a)	17.00	
					A	15.70	15.70

Details

Means of verification: Informes semestrales del ejecutor, con base en las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición.

Observations: El valor indicado de línea de base proviene de la ENDSA 2008 y se refiere a la población nacional de 6-24 meses. El endline a la ENSA 2016.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
0.3	Niñas menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	%		2014	P			
					P(a)			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	Niñas menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	%		2014	A			
Details								
Means of verification: Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamente para las áreas de intervencion.								
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados	Beneficiaries (#)	0.00	2012	P	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00		23,600.00
					P(a)	0.00	0.00		14,600.00	14,600.00		23,600.00
					A	0.00	0.00	0.00	338.00	4,734.00	8,956.00	17,810.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador P/P(a) se basaba sobre el siguiente supuesto de cobertura: Salas de estimulación: 9000 (40 equipos*225), diferentes niños/as atendidos cada año de ejecución. Visitas comunitarias: 5600 (140 educadores*40), mismos niños/as atendidos cada año de ejecución, solo cuentan una vez.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.	Beneficiarios	0.00	2012	P	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00		4,625.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00		4,625.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.00	11,060.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador se basa en el supuesto que los niños nacidos en instituciones de salud y al menos el 25% de los niños participantes en las modalidades DIT sean registrados.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados	Tasa	2012	P			40.00	40.00				40.00
				P(a)				40.00	40.00			40.00
				A			0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Costeo y dimensionamiento de brigadas prevé 40 niños/ educador y semana en brigada móvil

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Tasa de niños/as de 0 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles	Tasa	9.70	2012	P								
					P(a)								9.00
					A							8.80	8.80

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa		2012	P			7.00	7.00	7.00			7.00
					P(a)				7.00	7.00			7.00
					A			0.00	0.00				

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Número de niños/as menores de 2 años por educador/a en centros infantiles. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles actuales en Bo

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	Porcentaje	0.00	2012	P	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00			75.00
					P(a)	0.00	0.00		25.00	50.00			75.00
					A	0.00	0.00	0.00	70.00	79.00	94.00	94.90	94.90

Details

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: El indicador incluye personal existente actualmente (cuidadores comunitarios).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.3	Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa		2012	P			11.00	11.00	11.00			11.00
					P(a)				11.00	11.00			11.00
					A			0.00	0.00				

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental

Observations: Número de niños/as de 2 a 4 años por educador/a en centros infantiles. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles actuales en Bolivi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2018	EOP 2018
Output	Unit of Measure				
1.1	1.1.1 Personal de Centros Infantiles capacitado en currículo de centros infantiles (educadores comunitarios, facilitadores y nutricionistas).	Personas	P	520	368,000
			P(a)	743	563,916.96
			A	767	563,916.96
1.2	1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando (facilitadores y nutricionistas)	Personas	P	250	5,395,140
			P(a)	110	2,430,419.67
			A	112	2,423,460.32
1.3	1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en Salas de Estimulación Temprana - rezago	Personas	P	60	1,620,000
			P(a)	75	2,293,351.93
			A	76	2,341,344.36
1.4	1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos	P	2	430,000
			P(a)	2	280,000
			A	2	188,593.1
1.5	1.3.2 Convenios intergubernativos suscritos (MS, GAD (SEDES y SEDEGES), GAM)	Convenios	P	1	30,000
			P(a)	36	35,379.64
			A	33	31,802.98
1.6	1.3.3 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo para SEDES y SEDEGES.	Sistema	P	1	292,286
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.7	1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Fondo	P	1	1,600,579
			P(a)	0	17,163.26
			A	0	17,163.26

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2018	EOP 2018
Output	Unit of Measure				
2.1	2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Personas	P	500	60,000
			P(a)	707	77,000
			A	707	52,610.49
2.2	2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando	Personas	P	140	2,956,461
			P(a)	180	3,057,766.76
			A	202	3,283,749.04
2.3	2.3.1 Normas y protocolos sectoriales de DIT revisados y/o complementados	Documentos	P	2	330,000
			P(a)	2	277,538.53
			A	2	289,674.1
2.4	2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Personas	P	500	68,000
			P(a)	1,079	10,000
			A	1,079	0
2.5	2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada e implementada	Estrategia	P	1	150,000
			P(a)	0	125,912.91
			A	0	65,911.91

Component Nbr. 3 Mejoramiento de infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2018	EOP 2018
Output	Unit of Measure				
3.1	3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Diseños	P	90	303,837.18
			P(a)	30	251,926.07
			A	30	251,926.07
3.2	3.2 Centros infantiles readecuados y/o construidos según estándares	Centros	P	90	4,760,115.82
			P(a)	48	6,947,854.44
			A	48	6,947,854.44
3.3	3.3 Centros Infantiles equipados según estándares	Centros	P	0	0
			P(a)	50	815,177.77
			A	50	815,177.77
3.4	3.4 Pre-inversión de salas de rezago realizada y aprobada	Diseños	P	40	101,515.56
			P(a)	40	0.01
			A	40	0.01
3.5	3.5 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Salas	P	40	1,590,410.44
			P(a)	40	820,182.76
			A	40	820,182.76

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Seguimiento y evaluación

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2018	EOP 2018
Output	Unit of Measure				
4.1	4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Sistema	P	1	218,000
			P(a)	1	142,523
			A	1	75,594.31
4.2	Evaluación final contratada	Consultoría	P	1	50,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
4.3	Evaluación de impacto y procesos contratada	Consultoría	P	1	450,000
			P(a)	1	560,845.67
			A	2	423,732.55

Component Nbr. 5 Administración y Auditoría

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
Output	Unit of Measure				
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y personal departamental	P		770,081
	P(a)		1,335,489.77
	A		1,145,784.68
Auditoría	P		100,000
	P(a)		149,999.9
	A		143,513.95
Administración (7%) FPS	P		355,574
	P(a)		618,352.5
	A		618,352.5

Total Cost

Total Cost	P		22,000,000
	P(a)		20,810,801.55
	A		20,500,345.56

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
