

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1067	Chief of Operations Validation Date	10/23/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/10/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi	Loan Number	2614/BL-BO, 2614/BL-BO-1, 2614/BL-BO-2
Executing Agency	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	BUSCARONS CUESTA, LUIS	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Debido a las importantes incumplimientos en las áreas de derechos de propiedad, licencias ambientales e interacción con una comunidad indígena vecina, se desarrolló un plan de acción correctiva por primera vez en 2016. La segunda misión de supervisión del año 2019 mostró muy pocos avances en estas áreas identificadas, se ha realizado un esfuerzo común entre el líder del equipo, la consultora SIMBIOSIS y ESG que han resuelto varios de los problemas pendientes, en particular los mas importantes. Por lo tanto, la clasificación se mantiene.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1067	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	35,000,000	100.00%	0
Aggregated	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	35,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

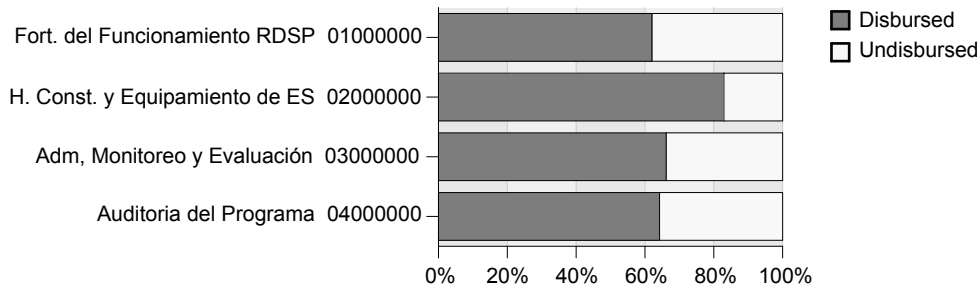

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mortalidad materno infantil en el Departamento de Potosi reducida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.1	Tasa de mortalidad infantil por 1000 NV	por 1000 NV	50.00	2003	P							30.00
					P(a)							30.00
					A				0.00		30.00	

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.2	Razon de Mortalidad materna en el Departamento de Potosi	Razon	310.00	2008	P							100.00
					P(a)							100.00
					A				0.00		100.00	

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Observations: Existe discrepancias entre las cifras de fuentes nacionales (Ministerio de Salud) e internacionales (OMS/OPS) para este indicador, siendo los internacionales en el rango de 350 - 400 para Potosí. Adicionalmente, es probable que en los primeros años de ejecución, se registrarán más muertes por mejoras en el registro.(2015, esta por publicarse un estudio específico sobre mortalidad materna a partir del levantamiento de información en puestos "Centinela")

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.3	Tasa de Mortalidad neonatal	por 1000 NV	27.00	2003	P							0.00
					P(a)							11.18
					A				0.00		11.18	

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.1	Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36.00	2010	P							55.00
					P(a)							55.00
					A				0.00	50.00	64.40	

Details

Means of verification: SNIS Departamental (Potosí)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.2	Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P							80.00
					P(a)							80.00
					A				0.00		20.10	

Details

Means of verification: Registros hospitalarios

Observations: El proyecto deberá establecer un sistema de monitoreo específico para este indicador.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.3	Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P							50.00
					P(a)							50.00
					A				0.00		0.00	

Details

Means of verification: Informes específicos del proyecto.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.4	Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número	0.00	2011	P							200.00
					P(a)							13.00
					A				0.00		13.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details												
Means of verification: Informes de Servicio Departamental de Salud, al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas												
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.5	Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50.00	2011	P							200.00
					P(a)							200.00
					A				0.00		0.00	
Details												
Means of verification: Informe específico del proyecto.												
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.6	Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Beneficiaries (#)	1,902.00	2013	P	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
					P(a)	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00		5,000.00
					A		0.00	0.00	0.00		20,271.00	
Details												
Means of verification: Registro del Bono Juana Azurduy												
Observations: Se considerará al binomio Madre - Hijo que ha recibido atención al parto y atención post-parto												
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No				
	Indigenous					P						
						P(a)						5,000.00
						A					20,271.00	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	P		3		100,000
			P(a)		3	0	128,305.14
			A		3	0	128,305.14
1.2	Plan de promoción de salud implementado	Plan	P		1		1,018,000
			P(a)	1	1	166,239	285,179.79
			A	0	0	76,387	195,327.79
1.3	Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas	P		30		210,000
			P(a)		30	0	535,612
			A		30	0	535,612
1.4	Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas	P		200		200,000
			P(a)	200	200	200,350	278,296.15
			A	0	0	0	77,946.15
1.5	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema	P		1		500,000
			P(a)	1	1	708,099	1,499,014.77
			A	0	0	0	790,915.77
1.6	Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento	P		1		75,000
			P(a)		1	0	5,002.48
			A		1	0	5,002.48
1.7	Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad	P		1		450,000
			P(a)		1	0	311,867
			A		1	0	311,867
1.8	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia	P		1		1,314,000
			P(a)	1	1	182,259	1,485,205.3
			A	0	0	69,192	1,372,138.3
1.9	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas	P		90		280,000
			P(a)	90	90	90,971	364,711.02
			A	0	0	14,992	288,732.02
1.10	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema	P		1		68,000
			P(a)	1	1	14,452	51,946.76
			A	0	0	0	37,494.76

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Inversiones en infraestructura y equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua diseñado	Hospital	P		1		310,000
			P(a)		1	0	452,429.71
			A		1	0	452,429.71
2.2	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua construido	Hospital	P		1		6,730,000
			P(a)	1	1	2,638,862.96	12,584,451.52
			A	0	0	1,360,982.87	11,306,571.43
2.3	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua equipado	Hospital	P		1		2,106,000
			P(a)	1	1	984,418.51	1,224,358.27
			A	0	0	427,756.55	667,696.31
2.4	Hospital Ocuri construido	Hospital	P		1		4,200,000
			P(a)	1	1	2,709,753.43	6,725,617.16
			A	0	0	1,855,088.35	5,870,952.08
2.5	Hospital de Ocuri equipado	Hospital	P		1		1,180,000
			P(a)	1	1	417,900.07	516,210.22
			A	0	0	196,620.31	294,930.46
2.6	Hospitales de Ocuri y Llalagua operando	Hospital	P		2		4,220,000
			P(a)	2	2	4,220,000	4,220,000
			A	0	0	0	0
2.7	Centro de coordinación de urgencias construido	Centro	P		1		450,000
			P(a)		1	0	1,049,893.47
			A		1	0	1,049,893.47
2.8	Establecimientos de salud ampliados y/o remodelados	Establecimiento	P		1		2,800,000
			P(a)		7	0	2,732,912.87
			A		7	0	2,732,912.87
2.9	Establecimientos de salud construidos	Establecimiento	P		2		1,800,000
			P(a)	1	2	295,352.7	2,032,558.57
			A	0	1	149,705.8	1,886,911.67
2.10	Establecimientos de salud equipados	Establecimiento	P		8		8,549,185
			P(a)	1	11	223,868.11	2,106,427.52
			A	0	10	0	1,882,559.41

Component Nbr. 3 Administracion y Monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	P			740,000
		P(a)		357,064.01	1,446,524.01
		A		167,519	1,256,979
	Auditorías	P			200,000
		P(a)		71,529	200,000.03
		A		35,630	164,101.03

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P				995,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Monitoreo y evaluación	P				1,100,000
		P(a)			51,020	168,336.06
		A			0	117,316.06
	Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	P				2,674,815
		P(a)			109,647.12	1,865,140.18
		A			93,525.82	1,849,018.88

Total Cost

	Total Cost	P				42,270,000
		P(a)			13,441,785.91	42,270,000
		A			4,447,399.7	33,275,613.79

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions
