

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1343	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Programs of Opportunities and Rights in the state of Rio Grande do Sul	Loan Number	3241/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1343	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	37,142,731	74.29%	12,857,269
Aggregated	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	37,142,731	74.29%	12,857,269

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

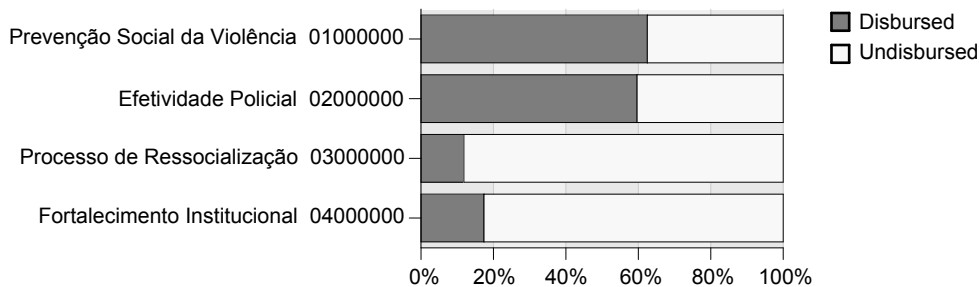

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	0.00	2010	P				
					P(a)	3.00			3.00
					A		3.00		3.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Municipal				P				
					P(a)	3.00			
					A				
	Subnational				P				
					P(a)	3.00			
					A				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Homicídios de jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	taxa anual pcmh	88.80	2010	P	84.00			75.50
					P(a)	84.00			75.50
					A		29.99		29.99

Details

Means of verification: Ministério da Saúde: Datasus; Ministério da Justiça: Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública (SINESP)

Observations: O monitoramento deste e outros indicadores será realizado como parte da execução do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.3	Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	porcentagem	62.00	2010	P	56.00			50.00
					P(a)	56.00			50.00
					A		80.00		80.00

Details

Means of verification: SSP-RS, por meio de relatórios da DEC/DGEO

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Observations: A proporção se refere aos roubos cometido por jovens de 15 a 24 anos e que tiveram sua autoria esclarecida. Em 2010, houve um total de 1602 roubos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Melhorar a inserção de jovens em situação de risco ao sistema educacional e ao mercado de trabalho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
0.1	Jovens cursando o Ensino Médio que não abandonam a escola, nos territórios onde os professores são capacitados	Número	0.00	2010	P	8,900.00		13,500.00
					P(a)			
					A		3,270.00	3,270.00

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Este indicador refere-se aos jovens que ainda não abandonaram a escola. A meta será alcançada por meio da capacitação de 216 professores por ano. Cada professor trabalhará com a média de 30 alunos por ano, com a meta de que nenhum deles abandone a escola.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
0.2	Jovens que completam o Ensino Fundamental por meio do programa de aceleração	Número	0.00	2010	P	1,200.00		4,800.00
					P(a)			
					A		436.00	436.00

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Este indicador se refere aos jovens que já abandonaram a escola. Participarão 1.000 jovens por centro a partir do segundo ano.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
0.3	Jovens participantes do Programa em sua primeira experiência de trabalho formal	Número	0.00	2010	P	800.00		3,200.00
					P(a)			
					A		324.00	

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Os beneficiários são jovens em situações de risco para os quais a experiência de trabalho reduzirá a possibilidade de se vincularem a atividades criminosas. Para facilitar a inserção ao mercado de trabalho, 2.000 jovens dos Centros POD Juventude por ano r

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Incrementar a efetividade da polícia no âmbito local

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.1	Cumprimento das recomendações das reuniões comunitárias sobre o desempenho da polícia nos territórios atendidos pelo Programa	%	0.00	2010	P	100.00		100.00
					P(a)			
					A			

Details

Means of verification: Escritório de Projetos (SJDH-RS)

Observations: Este indicador é evidência da efetividade do cumprimento, por parte da polícia, das recomendações registradas nas atas das reuniões mensais de coordenação com a comunidade.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Reduzir a taxa de reincidência da população jovem em conflito com a lei

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.0	Reincidência de adolescentes egressos da FASE que completaram um ano e meio de atendimento	Taxa	36.00	2010	P	32.00		25.00
					P(a)			
					A			

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.1	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE durante pelo menos um ano e meio e que completaram o Ensino Fundamental	%	15.00	2010	P	70.00		100.00
					P(a)			
					A			

Details

Means of verification: FASE

Observations: Em 2010 existiam 880 adolescentes na FASE, dos quais 15% tinham o Ensino Fundamental concluído. Jovens só podem entrar na FASE até os 18 anos, mas podem cumprir medidas até os 21 anos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.2	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE e completaram o curso de capacitação de jovem aprendiz	%	0.00	2010	P	60.00		80.00
					P(a)			
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: FASE			
Observations: Ainda não existe o programa de jovem aprendiz na FASE.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 3: Melhorar a articulação dos serviços de prevenção e controle do crime destinados aos jovens em situação de alto risco

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
3.1	Formulação por parte da SJDH-RS de políticas públicas de prevenção da violência juvenil usando dados do sistema integrado de distintos serviços de prevenção e controle do crime	número	0.00	2012	P			2.00
					P(a)			
					A			
Details								
Means of verification: SJDH-RS								
Observations: As novas políticas serão formuladas tendo em conta os resultados do trabalho multidisciplinário, coordenado e articulado pelas distintas entidades que desenvolvem atividades nos territórios do Programa e que compartilham informação num sistema integrado. O P								
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Prevenção social e situacional da violência

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	centros	P		6		9,000,000
			P(a)	4	6	7,824,978.62	13,900,000
			A	0	2	5,376,547.2	9,778,781.74
1.2	Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	professores	P	356	1,780	175,000	1,000,000
			P(a)	129	1,780	33,000	700,000
			A	107	1,758	0	667,000
1.3	Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	programas	P	7	21	600,000	1,600,000
			P(a)	6	27	100,000	1,300,000
			A	6	21	0	1,100,000
1.4	Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	programas	P	7	21	1,300,000	3,300,000
			P(a)	7	28	50,000	1,200,000
			A	7	21	0	1,100,000
1.5	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	bolsas	P	600	1,700	500,000	1,800,000
			P(a)	500	1,700	514,031.04	1,300,000
			A	279	1,009	71,848.56	357,817.52
1.6	Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	foros	P		6	215,000	900,000
			P(a)	0	6	300,000	900,000
			A	1	7	16,997.06	418,467.91
1.7	Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	espaços	P	2	6		1,000,000
			P(a)	3	6	150,000	300,000
			A	0	0	0	150,000

Component Nbr. 2 Eficácia policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	efetivos	P	300	1,200	180,000	850,000
			P(a)	0	1,356	100,229.71	850,000
			A	0	1,356	0	749,770.29
2.2	Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	sistema	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	793,978.35	1,330,000
			A	0	1	14,678.59	550,700.24
2.3	Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	bases	P		6		3,500,000
			P(a)	3	6	2,081,950.85	3,500,000
			A	2	5	251,501.81	1,669,550.96
2.4	Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	certificação	P	2	9	50,000	250,000
			P(a)	2	9	35,009.78	320,000
			A	0	7	0	284,990.22

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Modernização do processo de ressocialização

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	centros	P		4		21,700,000
			P(a)	1	5	10,691,625.84	21,773,018.36
			A	0	1	0	1,463,875.15
3.2	Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	sistema	P		1		500,000
			P(a)	0	1	0	426,981.64
			A	0	1	0	426,981.64
3.3	Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	servidores	P	300	1,200	250,000	1,100,000
			P(a)	300	1,200	100,000	600,000
			A	0	647	0	413,621.53
3.4	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	processo	P		1		700,000
			P(a)	1	2	200,000	1,200,000
			A	0	1	0	916,451.38
3.5	Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE	sistema	P		1		1,000,000
			P(a)	0	2		1,000,000
			A	0	2	0	1,000,000

Component Nbr. 4 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
4.1	Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	planos	P	1	5		650,000
			P(a)	5	5	250,000	500,000
			A	0	0	0	218,499
4.2	Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	sistema	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	712,613.12	1,050,000
			A	0	1	0	287,386.88
4.3	Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	sistema	P		1		650,000
			P(a)	1	1	476,044.18	650,000
			A	0	0	94,441.76	218,397.58
4.4	Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	seminários	P	4	17	160,000	500,000
			P(a)	2	19	102,007.22	500,000
			A	0	15	0	297,992.78

Component Nbr. 5 Gestão do Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
5.1	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Relatório	P	4	10	640,000	3,200,000
			P(a)	1	10	396,720.45	2,700,000
			A	0	7	0	2,103,279.55

Total Cost

Total Cost		P			4,070,000	56,000,000
		P(a)			24,912,189.16	56,000,000
		A			5,826,014.98	24,173,564.37

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
