

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | AR-L1067 | Chief of Operations Validation Date | 04/16/20 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2019 | Division Chief Validation Date | 04/17/20 |
| Last Update | 04/16/20 | Country Representative Validation Date | 04/23/20 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| Operation Name | Forest Sustainability and Competitiveness Program | Loan Number | 2853/OC-AR |
| Executing Agency | SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS | Sector/Subsector | PA-FOR - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-FOREST RESOURCES MANAGEMENT |
| Team Leader | MILEWSKI, JOSEPH CHRISTOFER | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Argentina |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | Republica Argentina | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | B | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | Partially Satisfactory | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | La unidad ejecutora demuestra tener capacidad de gestión de los aspectos ambientales y sociales. Se han observado falencias en la comunicación con las partes interesadas, en la gestión de quejas y reclamos y en la implementación de medidas de higiene y seguridad por parte de las instituciones adjudicatarias de las obras que no han elaborado los PGAS para la etapa operativa. La gestión de documentación ambiental y social por parte de estas entidades requiere ser fortalecida | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| AR-L1067 | 60,000,000 | 60,000,000 | 14,800,000 | 0 | 74,800,000 | 60,000,000 | 40,050,000 | 66.75% | 19,950,000 |
| Aggregated | 60,000,000 | 60,000,000 | 14,800,000 | 0 | 74,800,000 | 60,000,000 | 40,050,000 | 66.75% | 19,950,000 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

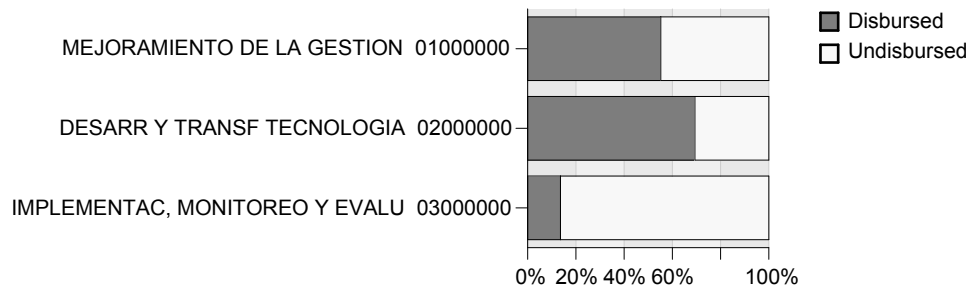

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar el valor agregado de la producción forestal

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 1.1 | Participación del sector forestal en el PIB total (%) | % | 1.50 | 2009 | P | | | | 2.10 |
| | | | | | P(a) | | | | 2.10 |
| | | | | | A | | | | |
| Details | | | | | | | | | |
| Means of verification: Fuente: FAO | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | | | |

Impact Nbr. 2: Aumentar las exportaciones forestales

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|--|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 2.1 | Valor de las exportaciones (millones US\$) | Millones US\$ | 960.00 | 2012 | P | | | | 1,307.00 |
| | | | | | P(a) | | | | 1,307.00 |
| | | | | | A | | | | |
| Details | | | | | | | | | |
| Means of verification: Fuente: TRADE.NOSIS | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Disminuir la dependencia del país en la utilización de bosque nativo manteniendo el crecimiento del sector

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 3.1 | Porcentaje de utilización por parte del sector foresto industrial de madera de bosques plantados | % | 89.00 | 2012 | P | | | | 95.00 |
| | | | | | P(a) | | | | 95.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Estadísticas de la Administración Nacional de Bosques, Servicio Forestal Nacional, IFONA, SAGPyA, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Humano

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 3.2 | Tasa de crecimiento anual de la producción | % | 2.40 | 2012 | P | | | | 2.40 |
| | | | | | P(a) | | | | 2.40 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: PEA, SIIA y MAGyP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumentar la superficie forestada con especies de alto valor y con prácticas de buen manejo para la producción de madera de calidad

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 1.1 | Superficie manejada para la producción de madera de calidad | Area (Hectares) | 600,000.00 | 2012 | P | | | | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Encuestas ad hoc a productores forestales en año base 2013 y el año meta 2017, inventarios forestales, reportes del INTA y Estadísticas de la DPF.

Observations: El total de hectáreas que se encuentran plantadas actualmente es de 1.200.000. Se espera que con el Programa se alcance la meta de mejor manejo para ese número de has.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|----------|---------------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1.2 | Superficie forestada con especies de alto valor | Has. | 50,000.00 | 2012 | P | | | | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Encuestas ad hoc a productores forestales en año base 2013 y el año meta 2017, inventarios forestales, reportes del INTA y Estadísticas de la DPF.

Observations: Se considera madera de calidad aquella que puede ser dedicada a usos para productos decorativos, de apariencia o estructurales que cumple standards entre otros. Especies de alto valor son especies que comandan precios superiores al promedio por las caract

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

Outcome Nbr. 2: Mejorar el acceso a cadenas de alto valor por parte de las MiPyMEs foresto y foresto industriales

Observation: Como cadenas de alto valor se entenderán todas aquellas que involucran la comercialización de productos donde se requiere madera seca.

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 2.1 | Diferencia en el porcentaje de nuevas MiPyMEs que se encuentran en zonas beneficiarias y no beneficiarias que se integran a nuevas cadenas de valor. | % | 0.00 | 2012 | P | | | | 30.00 | | | 30.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Como zonas beneficiarias se identifica el área de influencia de los programas de viveros y primera transformación.

Observations: La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones. Las categorías de MiPyMES foresto industriales se definen con base en la producción mensual promedio de madera aserrada, según las siguientes categorías: (1) Micropymes: hasta 25 metros cúbicos; (2) Pequeñas: hasta 75 metros cúbicos; (3) Medianas: hasta 150 metros cúbicos; (4) Se excluye a las sociedades anónimas. Como cadenas de alto valor se entenderán todas aquellas que involucran la comercialización de productos donde se requiere madera seca.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

Outcome Nbr. 3: Aumentar la disponibilidad y el acceso de información para las MiPyMEs forestales y forestoindustriales

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|----------|---------------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 3.1 | MiPyMEs forestales y forestoindustriales que declaran utilizar el sistema de información para la toma de decisiones | MiPyMEs | 2012 | P | | | | | 14,000.00 | | | 14,000.00 |
| | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |

Details

Means of verification: Encuestas de línea de base y registros online

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

Outcome Nbr. 4: Incrementar el nivel de formalidad de las MiPyMEs forestales y forestoindustriales

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|----------|---------------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|----------|
| 4.1 | MiPyMEs forestales y foresto industriales que completaron el Programa de Verificación Independiente de la "Legalidad de la Madera" (1era y 2da Verificación in situ del cumplimiento legal) | MiPyMEs | 2012 | P | | | 200.00 | 200.00 | 350.00 | | | 750.00 |
| | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |

Details

Means of verification: Registros del CERFOAR

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|----------|
| 4.2 | Porcentaje de madera legal, con certificado de verificación, procesada en los centros de servicios financiados por el Programa | % | 2012 | P | | | 5.00 | 25.00 | | | | 30.00 |
| | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | | 30.00 | 30.00 |
| | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |

Details

Means of verification: Registros de los centros de servicios

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

Outcome Nbr. 5: Incrementar la sostenibilidad de la gestión forestal de las MiPyMEs y la cadena de custodia

Observation:

| Indicator | Unit of | Baseline | Baseline | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---------|----------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|-----------|---------|----------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | Measure | | Year | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|--|-------|-------|
| 5.1 | MiPyMEs forestales y foresto industriales que certificaron su gestión forestal sostenible y su cadena de custodia con el CERFOAR | MiPyMEs | 0.00 | 2012 | P | | | | 40.00 | 40.00 | | | 80.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Registros de certificación forestal del CERFOAR | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | | |

Outcome Nbr. 6: Incrementar la disponibilidad de especies de alto valor para los productores forestales en regiones prioritarias (Chaco, NOA, Valles Irrigados, Pampeana)

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|--|--|---------------------------|----------|---------------|---------------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 6.1 | Especies difundidas en plantaciones forestales comerciales | Número de nuevas especies | 0.00 | 2012 | P | | | | | 12.00 | | | 12.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Informes del INTA, publicaciones, visitas a campo y encuestas a productores | | | | | | | | | | | | | |
| Observations: 8 especies exóticas y 4 nativas | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | | No | | | | | |

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|--|--|-------------------------|----------|---------------|---------------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 6.2 | Clones difundidos en plantaciones forestales comerciales | Número de nuevos clones | 0.00 | 2012 | P | | | | | 20.00 | | | 20.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Informes del INTA, publicaciones, visitas a campo y encuestas a productores | | | | | | | | | | | | | |
| Observations: 20 clones intra e interespecíficos | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | | Pro-Ethnicity | | | No | | | | | |

Outcome Nbr. 7: Disminuir el riesgo de arribo y establecimiento de nuevas plagas y enfermedades forestales y mitigar los daños asociados con plagas y enfermedades presentes

Observation:

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 7.1 | Plagas y/o enfermedades cuarentenarias | Número de | 0.00 | 2012 | P | | | | | 0.00 | | | 0.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7.1 | detectadas en la Argentina sin que logren altos niveles de prevalencia | plagas y/o enfermedades | 0.00 | 2012 | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: FAO, SENASA | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | | | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | |

Outcome Nbr. 8: Incrementar la disponibilidad y la adopción de material vegetativo de calidad

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 8.1 | Material de propagación disponible en viveros | Nº de plantines | 22,500,000.00 | 2012 | P | | | | 27,500,000.00 | | | 27,500,000.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes de producción de los viveros, datos del SIIF y encuestas a productores.

Observations: La zona de influencia se refiere al área en el que el vivero tiene mayor poder de acción. Es de esperarse que los productores localizados en esta zona sean más propensos a la adopción de plantines generados en los viveros. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|----|---------------|--|--|--|----|--|--|--|--|
| Pro-Gender | | | | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | |
|------------|--|--|--|----|---------------|--|--|--|----|--|--|--|--|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 8.2 | Viveristas produciendo con tecnologías promovidas por el proyecto | Nº de viveristas | 0.00 | 2012 | P | | | | 61.00 | | | 61.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Informes de producción de los viveros, datos del SIIF y encuestas a productores.

Observations: La zona de influencia se refiere al área en el que el vivero tiene mayor poder de acción. Es de esperarse que los productores localizados en esta zona sean más propensos a la adopción de plantines generados en los viveros. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|----|---------------|--|--|--|----|--|--|--|--|
| Pro-Gender | | | | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | |
|------------|--|--|--|----|---------------|--|--|--|----|--|--|--|--|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 8.3 | Diferencia en la probabilidad de adopción de material de propagación disponible en viveros entre productores en zona de influencia y productores en otras zonas | % | 0.00 | 2012 | P | | | | 30.00 | | | 30.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Informes de producción de los viveros, datos del SIIF y encuestas a productores.

Observations: La zona de influencia se refiere al área en el que el vivero tiene mayor poder de acción. Es de esperarse que los productores localizados en esta zona sean más propensos a la adopción de plantines generados en los viveros. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 9: Mejorar el acceso a tecnologías de producción y capacitación por parte de las MiPyMEs para facilitar su vinculación a cadenas de valor y promover la incorporación de nuevos productos con mayor valor agregado

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 9.1 | Diferencia en la probabilidad de adopción de tecnologías de secado en horno, aserrado y/o debobinado entre MiPyMEs participantes y no participantes | % | 0.00 | 2012 | P | | | | 25.00 | | | 25.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Encuestas a MiPyMEs y productores, registros de los centros de capacitación y transformación de la madera

Observations: Se define como MiPyMEs participantes aquellas cuyos empleados o empleadores reciban entrenamiento en los centros de capacitación y transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 9.2 | Diferencia en el aprovechamiento de rollizos en la primera transformación entre MiPyMEs participantes y no participantes | % | 0.00 | 2012 | P | | | | 15.00 | | | 15.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: Encuestas a MiPyMEs y productores, registros de los centros de capacitación y transformación de la madera.

Observations: Se define como MiPyMEs participantes aquellas cuyos empleados o empleadores reciban entrenamiento en los centros de capacitación y transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 9.3 | Diferencia en la proporción de madera seca producida entre participantes y no participantes | % | 0.00 | 2012 | P | | | | 15.00 | | | 15.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |
| | | | | | A | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Encuestas a MiPyMEs y productores, registros de los centros de capacitación y transformación de la madera.

Observations: Se define como MiPyMEs participantes aquellas cuyos empleados o empleadores reciban entrenamiento en los centros de capacitación y transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1.1 Información Forestal

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 1.1 | Inventario Forestal Permanente relevado (parcelas medidas) | Inventario | P | | 1 | | 1,903,700 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 414,751.2 | 2,417,767 |
| | | | A | 0 | 0 | 128,902.91 | 1,232,127 |
| 1.2 | Infraestructuras de datos espaciales (IDE) disponible | IDE | P | | 1 | | 776,850 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 32,569 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 32,569 |
| 1.3 | Plataforma de Servicios de Información para las MiPyMEs operativa | Plataforma | P | | 1 | | 2,250,200 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 195,018 |
| | | | A | 0 | 0 | 0.37 | 195,018 |
| 1.4 | Organismos públicos nacionales y provinciales fortalecidos a través de equipamiento, vehículos, servicios y difusión | Organismo | P | | 5 | | 1,035,300 |
| | | | P(a) | 0 | 5 | 0 | 159,710 |
| | | | A | 0 | 4 | 0 | 114,709.93 |

Component Nbr. 2 1.2 Promoción de la Certificación

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 2.1 | Protocolos de Verificación y Acreditación del Programa de Verificación Independiente de la Legalidad de la Madera aprobados por el CERFOAR | Protocolo | P | | 18 | | 6,092,000 |
| | | | P(a) | 0 | 18 | 62,971 | 179,869 |
| | | | A | 0 | 18 | 27,271.87 | 179,869 |
| 2.2 | Planes de comunicación y difusión implementados | campana | P | | 1 | | 573,300 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 2,453 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 2,453 |
| 2.3 | Grupos de MiPyMEs regionales certificados en gestión forestal sostenible y/o cadena de custodia | Grupos MiPymes | P | | 8 | | 461,000 |
| | | | P(a) | 2 | 8 | 3,000 | 415,839 |
| | | | A | 1 | 1 | 0 | 114,131 |
| 2.4 | CERFOAR fortalecida a través de asistencia técnica, estudios de apoyo y adquisición de seguimiento | CERFOAR | P | | 1 | | 53,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 12,057 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 12,057 |

Component Nbr. 3 2.1 Investigación y Desarrollo Forestal

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 3.1 | Proyectos de Investigación ejecutados (Fondos concursables) | Proyectos | P | | 15 | | 850,000 |
| | | | P(a) | 0 | 34 | 7,000 | 1,785,242 |
| | | | A | 0 | 34 | 0 | 1,085,242 |
| 3.2 | Informes de avance semestrales presentados por el INTA aprobados | Informe | P | | 8 | | 13,064,600 |
| | | | P(a) | 2 | 11 | 0 | 4,808,566 |
| | | | A | 2 | 7 | 0 | 410,566 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 2.2 Sanidad Forestal

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 4.1 | Encuentros técnicos realizados | Eventos | P | | 109 | | 443,000 |
| | | | P(a) | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | | | A | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 4.2 | Instalaciones readecuadas y/o equipadas (ANR) | Instalaciones | P | | 6 | | 390,000 |
| | | | P(a) | 0 | 6 | 30,000 | 469,652 |
| | | | A | 0 | 6 | 1,445.68 | 272,671 |
| 4.3 | Técnicos, docentes y profesionales especialistas capacitados en manejo de plagas y enfermedades, y detección precoz | Personas | P | | 240 | | 176,400 |
| | | | P(a) | 0 | 490 | 15,650 | 236,229 |
| | | | A | 0 | 490 | 30,520.6 | 236,229 |
| 4.4 | Tableros para consulta de SENASA | Informe | P | | 2 | | 20,000 |
| | | | P(a) | 0 | 2 | | 10,293 |
| | | | A | 0 | 2 | 0 | 10,293 |

Component Nbr. 5 2.3 Apoyo a la instalación y puesta en marcha de viveros forestales

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 5.1 | Viveros demostrativos instalados y/o mejorados en funcionamiento | Viveros | P | | 11 | | 10,749,000 |
| | | | P(a) | 0 | 11 | 1,314,375 | 8,351,105 |
| | | | A | 0 | 8 | 779,925 | 7,151,104 |
| 5.2 | Viveristas financiados para producir con tecnologías promovidas por el proyecto | ANRs | P | | 61 | | 2,592,500 |
| | | | P(a) | 0 | 16 | | 1,087,027 |
| | | | A | 0 | 12 | 0 | 1,087,027 |
| 5.3 | Personal técnico de viveros públicos y privados y viveristas capacitados | Personas | P | | 600 | | 2,260,600 |
| | | | P(a) | 0 | 625 | | 13,349 |
| | | | A | 0 | 625 | 2,103 | 13,349 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 6 2.4 Mejora primera transformación mecánica

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 6.1 | Centros de calidad, de capacitación y de producción construidos o ampliados, equipados y en funcionamiento | Centros | P | | 10 | | 16,390,500 |
| | | | P(a) | 1 | 12 | 4,827,484 | 41,311,757 |
| | | | A | 1 | 6 | 1,644,496 | 25,862,742 |
| 6.2 | Productores asociados a los Centros asistidos financieramente para la adopción de tecnologías | ANRs | P | | 87 | | 9,503,500 |
| | | | P(a) | 0 | 54 | 300,000 | 7,846,134 |
| | | | A | 0 | 45 | 22,388 | 2,716,961 |
| 6.3 | Giras de productores MIPYMES para conocer experiencias exitosas y centros de demandas realizadas | Giras | P | | 2 | | 85,000 |
| | | | P(a) | 0 | 2 | | 7,000 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.4 | Operarios, Mandos Medios y Responsables Técnicos de empresas capacitados | Personas | P | | 1,400 | | 1,288,000 |
| | | | P(a) | 1,510 | 3,691 | 122,866 | 643,444 |
| | | | A | 1,066 | 2,897 | 82,480 | 492,710 |
| 6.5 | Estudios para el diseño de canales de distribución y comercialización | Informes | P | | 10 | | 211,000 |
| | | | P(a) | 4 | 10 | | 47,920 |
| | | | A | 2 | 5 | 4,642 | 38,074 |
| 6.6 | Pequeños Productores financiados a traves de ANRs en Misiones | ANRs | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|-------------------|------|--|--|---------|-----------|
| | Costos operativos | P | | | | 3,630,550 |
| | | P(a) | | | 160,099 | 4,767,000 |
| | | A | | | 164,488 | 3,516,358 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | | 74,800,000 |
| | | P(a) | | | 7,258,196.2 | 74,800,000 |
| | | A | | | 2,888,663.43 | 44,776,259.93 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|----------------|---|-------------|-----------------------|
| Output | Centros de calidad, de capacitación y de producción construidos o ampliados, equipados y en funcionamiento | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | MSGOMEZ | 03/18/2020 |
| | Encuentros técnicos realizados | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Estudios para el diseño de canales de distribución y comercialización | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | MSGOMEZ | 03/18/2020 |
| | | | | | | |
| | Grupos de MiPyMEs regionales certificados en gestión forestal sostenible y/o cadena de custodia | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Informes de avance semestrales presentados por el INTA aprobados | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | MSGOMEZ | 03/18/2020 |
| | Infraestructuras de datos espaciales (IDE) disponible | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Instalaciones readecuadas y/o equipadas (ANR) | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Inventario Forestal Permanente relevado (parcelas medidas) | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/19/2020 |
| | Organismos públicos nacionales y provinciales fortalecidos a través de equipamiento, vehículos, servicios y difusión | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | Personal técnico de viveros públicos y privados y viveristas capacitados | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Plataforma de Servicios de Información para las MiPyMEs operativa | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/26/2020 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|----------------|---|-------------|-----------------------|
| Output | Productores asociados a los Centros asistidos financieramente para la adopción de tecnologías | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/19/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | MSGOMEZ | 03/18/2020 |
| | Protocolos de Verificación y Acreditación del Programa de Verificación Independiente de la Legalidad de la Madera aprobados por el CERFOAR | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Proyectos de Investigación ejecutados (Fondos concursables) | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/20/2020 |
| | Tableros para consulta de SENASA | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | | | | Modify Financial Historical Actual | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | Técnicos, docentes y profesionales especialistas capacitados en manejo de plagas y enfermedades, y detección precoz | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |
| | Viveristas financiados para producir con tecnologías promovidas por el proyecto | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio del cambio. Segun lo reportado en el mismo, se informa que en el ano 2017se dio de baja el producto que se habia reportado. | Modify Output | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | MSGOMEZ | 03/18/2020 |
| | Viveros demostrativos instalados y/o mejorados en funcionamiento | Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el Informe Semestral de Progreso correspondiente al segundo semestres de 2019. Se adjunta documento respaldatorio | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | MSGOMEZ | 03/26/2020 |

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| |
