

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1068	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/09/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/20
<b>Last Update</b>	04/03/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Rural Development and Family Agriculture, PRODAF	<b>Loan Number</b>	2740/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	<b>Sector/Subsector</b>	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	MILEWSKI, JOSEPH CHRISTOFER	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1068	30,000,000	23,870,000	11,000,000	0	41,000,000	23,870,000	23,870,000	100.00%	0
Aggregated	30,000,000	23,870,000	11,000,000	0	41,000,000	23,870,000	23,870,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

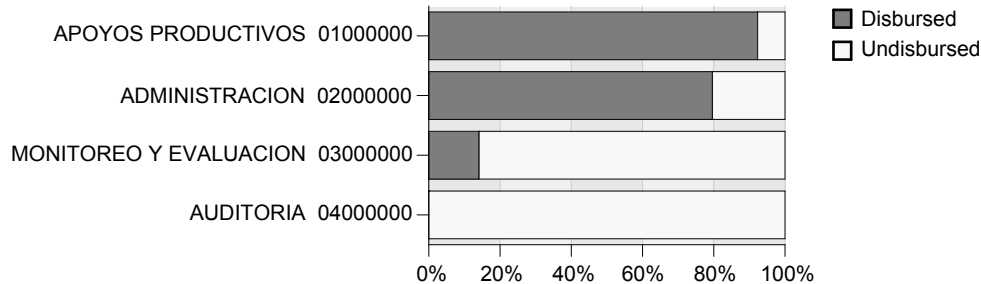

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incremento de los ingresos netos agropecuarios promedio de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios en el Chaco y Entre Ríos.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P				15.00
					P(a)			15.00	15.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

**Observations:** El indicador es 0 en la LB por construcción. El grupo de control será construido de manera que tenga características observables claves iguales al grupo de beneficiarios en la LB (ver plan monitoreo y evaluación). Supuestos:a) Situación económica nacional

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
1.1	Diferencia entre el cambio porcentual entre los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje (%)	0.00	2013	P				15.00
					P(a)			15.00	15.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017

**Observations:** Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
2.1	Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje (%)	0.00	2013	P				50.00
					P(a)			50.00	50.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

**Observations:** Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
3.1	Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje (%)	0.00	2013	P				20.00
					P(a)			20.00	20.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.

**Observations:** Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### OUTCOMES

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes	P		2		792,000
			P(a)	0	2	0	1,111,262
			A	0	2	23,000	1,134,262
1.2	Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas	P		71		126,000
			P(a)	0	109		45,000
			A	0	109	0	45,000
1.3	Planes de difusión ejecutados	Planes	P		4		282,000
			P(a)	0	4	0	36,000
			A	0	4	0	36,000
1.4	Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos	P		100		190,000
			P(a)	21	100	0	0
			A	2	81	0	0
1.5	Planes de Negocio individuales formulados	Planes	P		0		0
			P(a)	42	2,145	0	92,000
			A	166	2,269	0	92,000
1.6	Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios	P		8		528,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo	P		1		9,950,000
			P(a)	0	1	0	21,000
			A	0	1	0	21,000
2.2	Planes de Negocio individuales para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes	P		0		0
			P(a)	42	1,867	390,000	18,624,957
			A	180	2,005	306,849	18,541,806
2.3	Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Farmers (#)	P		2,060		3,350,000
			P(a)	45	2,235	80,000	1,681,057
			A	185	2,375	417,629	2,018,686

## Component Nbr. 3 Coordinación y administración del proyecto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Coordinación y administración del proyecto	P				1,800,000
		P(a)			20,000	2,397,000
		A			158,000	2,535,000
	Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	P				500,000
		P(a)			0	228,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	A			28,000	256,000
--	---	---	--	--	--------	---------

Total Cost

	Total Cost	P				40,800,000
		P(a)			490,000	24,236,276
		A			933,478	24,679,754

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Diferencia entre el cambio porcentual entre los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	El cambio se realizó para corregir un tipo y regresar al indicador original de la propuesta de prestamo	Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	LEONARDOC	03/23/2020
Output	Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VANINAD	03/19/2020
				Modify Financial Historical Actual	VANINAD	03/19/2020
	Fondo de garantía constituido y transferido	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. Como asi tambien via e-mail indicando lo siguiente: al momento de constituir los fondos de garantía se informa la ejecución financiera (2do trimestre del 2014) pero al no haberse ejecutado estos fondos, durante el ultimo semestre se produjo la devolución del mismo por parte de SGR Garantizar.Se adjunta el Informe como documento soporte como asi tambien el email aclaratorio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	03/19/2020
				Modify Financial Historical Actual	MSGOMEZ	03/19/2020
	Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2016. Se adjunta el Informe como documento soporte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	03/19/2020
				Modify Financial Historical Actual	MSGOMEZ	03/19/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	financiero	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2016. Se adjunta el Informe como documento soporte.	Modify Output			
	Planes de Negocio individuales formulados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte. Ademias, se incuye la siguiente aclaracion por parte del ejecutor: En principio la diferencia entre metas fisicas (incremento de 6 veces aproximadamente del plan original al plan vigente), es debida a que originalmente se plantearon ejecutar más planes de negocios de tipo asociativo que luego en la práctica no se dieron. La realidad es que la mayoría de los planes ejecutados fueron individuales, haciendo incrementar notoriamente las metas fisicas. Adicionalmente el monto de ANR entregado por productor, fue menor al previsto al iniciarse el Programa, permitiendo la formulación y ejecución de un mayor numero de PN. En cuanto a la diferencia en la metas financieras, el POA de este producto para el año 2019 fue de US\$ 0 ya que se encontraba sujeto al presupuesto otorgado a través de la Ley 27.467, Artículo 1° y Anexos ("sin sobretecho"), generando que el plan financiero vigente del producto 1,5 sea inferior al plan original. Por otro lado el avance financiero de la "formulación"(1,5), se ve reflejado en el producto 2,2 "ANRs entregados". Ahi se contemplan las dos instancias del Plan de Negocio (formulación y ejecución) es difícil distinguir que costo corresponde a cada actividad, por lo que se está incluyendo la ejecución financiera en otro producto de la matriz.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	MSGOMEZ	04/03/2020
	Planes de Negocio individuales para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte.	Create Output	N/A	MAJAS	03/25/2020
			Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MAJAS	03/25/2020
				Modify Physical Historical Actual	MAJAS	03/25/2020
	Planes de Negocios formulados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte. Ademias, se incuye la siguiente aclaracion por parte del ejecutor: En principio la diferencia entre metas fisicas (incremento de 6 veces aproximadamente del plan original al plan vigente), es debida a que originalmente se plantearon ejecutar más planes de negocios de tipo asociativo que luego en la práctica no se dieron. La realidad es que la mayoría de los planes ejecutados fueron individuales, haciendo incrementar notoriamente las metas fisicas. Adicionalmente el monto de ANR entregado por productor, fue menor al previsto al iniciarse el Programa, permitiendo la formulación y ejecución de un mayor numero de PN. En cuanto a la diferencia en la metas financieras, el POA de este producto para el año 2019 fue de US\$ 0 ya que se encontraba sujeto al presupuesto otorgado a través de la Ley 27.467, Artículo 1° y Anexos ("sin sobretecho"), generando que el plan financiero vigente del producto 1,5 sea inferior al plan original. Por otro lado el avance financiero de la "formulación"(1,5), se ve reflejado en el producto 2,2 "ANRs entregados". Ahi se contemplan las dos instancias del Plan de Negocio (formulación y ejecución) es difícil distinguir que costo corresponde a cada actividad, por lo que se está incluyendo la ejecución financiera en otro producto de la matriz.	Modify Output	Inactivate Output	DIMITRAS	03/25/2020
				Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	03/25/2020
				Modify Financial Historical Actual	MAJAS	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	03/25/2020
				Modify Physical	MAJAS	03/24/2020



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Planes de Negocios formulados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte. Ademas, se incluye la siguiente aclaracion por parte del ejecutor: En principio la diferencia entre metas físicas (incremento de 6 veces aproximadamente del plan original al plan vigente), es debida a que originalmente se plantearon ejecutar más planes de negocios de tipo asociativo que luego en la práctica no se dieron. La realidad es que la mayoría de los planes ejecutados fueron individuales, haciendo incrementar notoriamente las metas físicas. Adicionalmente el monto de ANR entregado por productor, fue menor al previsto al iniciarse el Programa, permitiendo la formulación y ejecución de un mayor numero de PN. En cuanto a la diferencia en la metas financieras, el POA de este producto para el año 2019 fue de US\$ 0 ya que se encontraba sujeto al presupuesto otorgado a través de la Ley 27.467, Artículo 1° y Anexos ("sin sobretecho"), generando que el plan financiero vigente del producto 1,5 sea inferior al plan original. Por otro lado el avance financiero de la "formulación"(1,5), se ve reflejado en el producto 2,2 "ANRs entregados". Ahi se contemplan las dos instancias del Plan de Negocio (formulación y ejecución) es difícil distinguir que costo corresponde a cada actividad, por lo que se está incluyendo la ejecución financiera en otro producto de la matriz.	Modify Output	Historical Actual		
	Planes de Negocios individuales formulados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte. Ademas, se incluye la siguiente aclaracion por parte del ejecutor: En principio la diferencia entre metas físicas (incremento de 6 veces aproximadamente del plan original al plan vigente), es debida a que originalmente se plantearon ejecutar más planes de negocios de tipo asociativo que luego en la práctica no se dieron. La realidad es que la mayoría de los planes ejecutados fueron individuales, haciendo incrementar notoriamente las metas físicas. Adicionalmente el monto de ANR entregado por productor, fue menor al previsto al iniciarse el Programa, permitiendo la formulación y ejecución de un mayor numero de PN. En cuanto a la diferencia en la metas financieras, el POA de este producto para el año 2019 fue de US\$ 0 ya que se encontraba sujeto al presupuesto otorgado a través de la Ley 27.467, Artículo 1° y Anexos ("sin sobretecho"), generando que el plan financiero vigente del producto 1,5 sea inferior al plan original. Por otro lado el avance financiero de la "formulación"(1,5), se ve reflejado en el producto 2,2 "ANRs entregados". Ahi se contemplan las dos instancias del Plan de Negocio (formulación y ejecución) es difícil distinguir que costo corresponde a cada actividad, por lo que se está incluyendo la ejecución financiera en otro producto de la matriz.	Create Output	N/A	MSGOMEZ	03/20/2020
			Modify Output	Modify Financial Historical Actual	MAJAS	03/24/2020
	Planes de difusión ejecutados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2016. Se adjunta el Informe como documento soporte	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VANINAD	03/19/2020
				Modify Financial Historical Actual	VANINAD	03/19/2020
	Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte.	Modify Output	Inactivate Output	DIMITRAS	03/25/2020
				Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	03/25/2020
				Modify Financial Historical Actual	MAJAS	03/25/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. En el informe se reporta en el ejecutado, una desafectacion para el ano de 2019, por lo que se procede a restarlo del ano 2017. Se adjunta el Informe como documento soporte.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	03/25/2020
				Modify Physical Historical Actual	MAJAS	03/25/2020
				Modify Unit of Measure	MAJAS	03/25/2020
	Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Se ajusta segun lo reportado por la Unidad Ejecutora en el informe Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019. Se adjunta el Informe como documento soporte	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	VANINAD	03/19/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation
