

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1196	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/14/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/20
<b>Last Update</b>	04/14/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	MULTIPHASE PRIMARY HEALTH CARE PROGRAM FOR MANAGING CHRONIC NONCOMMUNICABLE DISEASES	<b>Loan Number</b>	3772/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	SA-DPC - HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL
<b>Team Leader</b>	TRISTAO, IGNEZ M.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1196	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	20,284,850.97	20.28%	79,715,149.03
Aggregated	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	20,284,850.97	20.28%	79,715,149.03

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

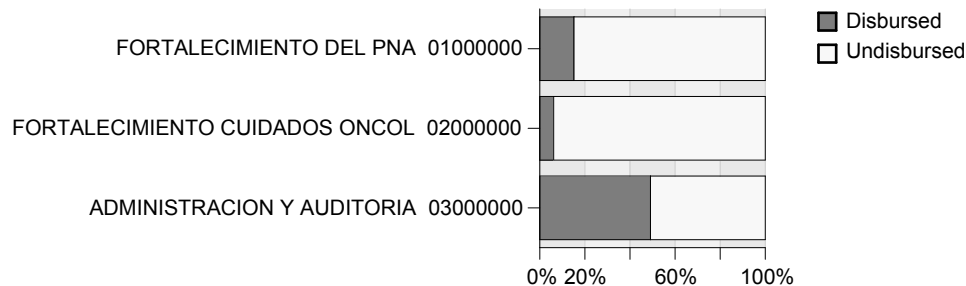

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, con énfasis en la población con cobertura pública exclusiva

**Observation:** Los indicadores de impacto se refieren a la población con cobertura pública exclusiva

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Hipertensos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de hipertensos del mismo rango etario	Porcentaje	62.30	2013	P	67.20		67.20
					P(a)	67.20		67.20
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

**Observations:** Con base en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo. La próxima está prevista para 2018

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Diabéticos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de diabéticos del mismo rango etario.	Porcentaje	47.50	2013	P	52.10		52.10
					P(a)	52.10		52.10
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Mujeres entre 50 y 69 años con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano, sobre el total de mujeres registradas del mismo rango etario con diagnóstico de cáncer de mama.	Porcentaje	43.20	2015	P		49.40	49.40
					P(a)		49.40	49.40
					A			

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información de Tamizaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Mujeres entre 30 y 64 años con diagnóstico de lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino en estadio temprano, sobre el estimado del total de mujeres del mismo rango	Porcentaje	10.00	2015	P		18.00	18.00
					P(a)		18.00	18.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

0.4	etario con lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino .	Porcentaje	10.00	2015	A				
Details									
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.5	Personas entre 50 y 75 años con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal estadio temprano , sobre el total de personas tamizadas del mismo rango etario con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal .	Porcentaje	51.00	2015	P		60.00		60.00
					P(a)		60.00		60.00
					A				
Details									
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.6	Tiempo promedio que transcurre desde la sospecha diagnóstica de cáncer hasta el inicio del tratamiento definitivo.	Días	150.00	2015	P	100.00			100.00
					P(a)	100.00			100.00
					A	0.00			
Details									
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Personas de entre 40 y 65 años que utilizaron servicios de salud en el último mes, sobre el total de personas en el mismo rango etario y periodo de tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo hicieron habiendo tenido síntomas o problemas de salud	Porcentaje	75.00	2013	P	79.30			79.30
					P(a)	79.30			79.30
					A	0.00			
Details									
Means of verification: Este indicador se mide a través del estudio de impacto de Redes, sobre la base de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005, 2009, 2013 y 2018.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incrementar el acceso efectivo de la población con cobertura pública exclusiva a servicios de tamizaje para la detección oportuna de enfermedades crónicas o del riesgo de contraerlas

**Observation:** Los indicadores de resultado se refieren a la población con cobertura pública exclusiva

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de personas mayores de 40 años con CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron consultas de seguimiento en el último año	Porcentaje	16.00	2016	P	19.00		25.00	25.00
					P(a)	19.00	0.00	25.00	25.00
					A	7.50	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa	Beneficiaries (#)	0.00	2015	P	250,000.00	200,000.00		450,000.00
					P(a)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					A	231,574.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Personas entre 40 y 65 años que reportan haber tenido al menos una medición de presión arterial en los últimos dos años sobre el total de personas del mismo grupo etario	Porcentaje	72.00	2013	P	0.00	76.50		76.50
					P(a)	0.00	76.50	0.00	76.50
					A	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Personas entre 40 y 65 años que alguna vez tuvieron una medición de glucemia sobre el total de personas del mismo grupo etario.	Porcentaje	74.00	2013	P	0.00	78.40		78.40
					P(a)	0.00	78.40	0.00	78.40
					A	0.00	0.00		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details										
Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Mujeres entre 50 y 69 años con al menos una mamografía en los últimos 24 meses, sobre el total de mujeres del mismo grupo etario	Porcentaje	8.12	2015	P	0.00		10.00		10.00
					P(a)	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
					A	0.00	0.00			
Details										
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.5	Mujeres entre 30 y 64 años con al menos un tamizaje de cáncer cervicouterino según guías de práctica clínica , sobre el total de mujeres del mismo rango etario	Porcentaje	15.00	2015	P	0.00		18.00		18.00
					P(a)	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
					A	0.00	0.00			
Details										
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.6	Personas entre 50 y 75 años con al menos un tamizaje de cáncer colorrectal en los últimos dos años, sobre el total de personas del mismo rango etario en las provincias	Porcentaje	5.00	2015	P	0.00		6.60		6.60
					P(a)	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60
					A	0.00	0.00			
Details										
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar las competencias de los efectores del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna o el tratamiento de enfermedades crónicas

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	0.00	2016	P	1,890.00		3,780.00		3,780.00
					P(a)	1,890.00	2,880.00	3,780.00	0.00	3,780.00
					A	1,970.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de capacitaciones

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Médicos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en Terapéutica Racional de Medicamentos	Personas	1,800.00	2015	P	4,034.00	5,800.00	7,600.00		7,600.00
					P(a)	1,165.00	4,965.00	7,600.00	0.00	7,600.00
					A	733.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de Evaluación de Capacitaciones

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	0.00	2015	P	1,900.00				3,645.00
					P(a)	300.00	1,600.00	3,645.00	0.00	3,645.00
					A	590.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes de evaluación de capacitaciones

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Proyectos Jurisdiccionales de Inversión bajo la modalidad REDES 3 ejecutados	Jurisdicciones por año	P	0	24	32,695,140	66,966,965
			P(a)	0	24	6,558,017	66,966,965
			A	0	0	5,958,023	14,824,560
1.2	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	P	2,100	4,200	956,748	2,468,490
			P(a)	1,222	4,028	167,651	2,468,490
			A	1,050	4,028	90,357	183,686
1.3	Proyectos Innovadores de REDES finalizados	Proyectos	P	5	10	75,051	186,000
			P(a)	5	10	75,000	186,000
			A	0	0	0	1,049
1.4	Proyectos de Implementación-Acción de REDES III finalizados	Proyectos	P	0	10	720,000	2,000,000
			P(a)	0	4	402,279	2,000,000
			A	0	0	3,907	3,907
1.5	Evaluación de resultados de los procesos en red finalizada.	Informe	P	0	1	0	140,000
			P(a)	0	1	0	140,000
			A	0	0	0	0
1.6	Evaluación del instrumento de certificación de procesos en red finalizada.	Informe	P	0	1	133,000	190,000
			P(a)	0	1	0	190,000
			A	0	0	0	0
1.7	Evaluación de esquema alternativo de clasificación y tratamiento del riesgo cardiovascular finalizada	Informe	P	0	1	24,000	120,000
			P(a)	0	1	0	120,000
			A	0	0	0	0
1.8	Evaluación de la efectividad de las capacitaciones de REDES para promover estrategias de mejora de los cuidados de salud finalizada.	Informe	P	0	1	0	140,000
			P(a)	0	1	0	140,000
			A	0	0	0	0
1.9	Estudio sobre la aplicación de TICs en los servicios de salud en red finalizado.	Estudio	P	0	1	18,000	120,000
			P(a)	0	1	0	120,000
			A	0	0	0	0
1.10	Plan de equipamiento centralizado de efectores para la mejora del diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Crónicas ejecutado.	Plan	P	0	1	11,000,000	11,000,000
			P(a)	0	1	0	11,000,000
			A	0	0	0	0
1.11	Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora de la gestión farmacológica	Centros del Primer Nivel de At	P	780	1,300	1,311,375	2,185,625
			P(a)	0	1,300	0	2,185,625
			A	0	0	0	0
1.12	Depósitos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejora en la gestión de medicamentos.	Unidades de gestión de medicam	P	96	240	0	10,549,860
			P(a)	0	240	0	10,549,860
			A	0	0	0	0
1.13	Informes de carga de recetas finalizados	Informes	P	1	2	204,546	1,450,000
			P(a)	1	2	277,942	1,450,000
			A	0	1	155,150	287,946
1.14	Evaluación del cambio en práctica clínica de las capacitaciones en uso racional de medicamentos finalizada	Informe	P	1	1	75,540	75,540
			P(a)	1	1	104,904	75,540
			A	0	0	0	0
1.15	Estudio comparativo sobre experiencias provinciales en relación con la dispensa nominal y digital en el Primer Nivel de Atención	Informe	P	0	1	9,139	27,416
			P(a)	1	1	22,499	27,416

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.15	Estudio comparativo sobre experiencias provinciales en relación con la dispensa nominal y digital en el Primer Nivel de Atención	Informe	A	0	0	0	0
1.16	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	Personas	P	5,000	15,000	1,741,042	5,424,129
			P(a)	3,515	15,000	362,889	5,424,129
			A	3,767	7,238	286,595	488,536
1.17	Evaluación del Curso de Cuidados de Medicamentos en el PNA (CUMAPS)	Informe	P	1	1	31,128	31,128
			P(a)	0	1	43,579	31,128
			A	0	0	0	0
1.18	Estudio de acceso de medicamentos crónicos y su alcance en la planificación de CUS Medicamentos para asegurar su disponibilidad	Informe	P	1	1	250,000	250,000
			P(a)	0	1	0	250,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la línea de cuidados oncológicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	Hospitales	P	18	46	2,215,278	7,033,274
			P(a)	18	46	687,698	7,033,274
			A	18	30	649,146	1,833,688
2.2	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Hospitales	P	24	50	1,618,826	4,464,594
			P(a)	16	50	239,706	4,464,594
			A	1	13	207,584	559,224
2.3	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Hospitales	P	14	39	150,077	434,935
			P(a)	8	39	55,437	434,935
			A	7	18	42,891	108,895
2.4	Evaluación de costo-efectividad del Sistema de Información de Tamizaje y del uso de navegadoras finalizado	Informe	P	1	1	90,000	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A	0	0	0	0
2.5	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Kits	P	105,270	326,070	5,931,606	13,113,481
			P(a)	60,626	326,070	3,156,057	13,113,481
			A	71,896	162,834	3,051,151	3,268,346
2.6	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Kits	P	90,000	435,000	705,443	2,467,324
			P(a)	120,000	435,000	122,139	2,467,324
			A	70,050	130,925	81,524	199,010
2.7	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	P	1,565	5,115	174,619	616,857
			P(a)	1,200	5,115	32,370	616,857
			A	927	2,415	9,094	15,971
2.8	Evaluación de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna de cáncer finalizado	Informe	P	1	1	60,000	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	0	0	0
2.9	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	Informe	P	1	1	513,246	794,498
			P(a)	0	1	85,873	794,498
			A	1	1	59,235	109,428

## Other Cost

	Administración y auditoría	P			1,449,021	4,628,932
		P(a)			640,342	4,628,932
		A			773,603	1,342,563



RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gastos administrativos REDES	P			4,602,326	16,336,143
		P(a)			1,220,274	16,336,143
		A			1,099,791	3,230,565
	Gastos administrativos CUS-Medicamentos	P			2,724,907	11,635,749
		P(a)			860,696	11,635,749
		A			800,661	2,174,487
	Fortalecimiento para la implementación del registro	P			659,343	899,061
		P(a)			0	899,061
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			70,139,401	166,000,001
		P(a)			15,115,352	166,000,001
		A			13,268,712	28,631,861

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estudio comparativo sobre experiencias provinciales en relación con la dispensa nominal y digital en el Primer Nivel de Atención	El Plan de Estudios y Evaluaciones del Programa se encuentra en revisión por las nuevas autoridades, que asumieron en diciembre de 2019. La información del plan físico y financiero 2020 es provisoria, dado que no se puede prever el impacto que la pandemia COVID-19 tenga en el proyecto. De momento, se replanificó financieramente el producto para que el costo total previsto coincida con el original.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	03/30/2020
	Estudio de acceso de medicamentos crónicos y su alcance en la planificación de CUS Medicamentos para asegurar su disponibilidad	El Plan de Estudios y Evaluaciones del Programa se encuentra en revisión por las nuevas autoridades, que asumieron en diciembre de 2019. La información del plan físico y financiero 2020 es provisoria, dado que no se puede prever el impacto que la pandemia COVID-19 tenga en el proyecto. De momento, se replanificó financieramente el producto para que el costo total previsto coincida con el original.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	03/30/2020
	Evaluación del Curso de Cuidados de Medicamentos en el PNA (CUMAPS)	El Plan de Estudios y Evaluaciones del Programa se encuentra en revisión por las nuevas autoridades, que asumieron en diciembre de 2019. La información del plan físico y financiero 2020 es provisoria, dado que no se puede prever el impacto que la pandemia COVID-19 tenga en el proyecto. De momento, se replanificó financieramente el producto para que el costo total previsto coincida con el original.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	03/30/2020
	Evaluación del cambio en práctica clínica de las capacitaciones en uso racional de medicamentos finalizada	El Plan de Estudios y Evaluaciones del Programa se encuentra en revisión por las nuevas autoridades, que asumieron en diciembre de 2019. La información del plan físico y financiero 2020 es provisoria, dado que no se puede prever el impacto que la pandemia COVID-19 tenga en el proyecto. De momento, se replanificó financieramente el producto para que el costo total previsto coincida con el original.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	03/30/2020
	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	La estrategia de capacitación se aprovechó del marco de los proyectos jurisdiccionales, lo cual permitió aumentar el alcance con reducción de los costos previstos.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NATALIAB	03/30/2020
	Proyectos de Implementación-Acción de REDES III finalizados	Se realizó una convocatoria desde la Secretaría de Gobierno de Salud, a través de la Dirección de Investigación para la Salud. El llamado estuvo orientado a la prevención y control de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares en la población vulnerable de Argentina. El 15 de junio de 2018 cerró el plazo para la presentación de notas conceptuales. Se seleccionaron 12 propuestas presentadas por instituciones académicas, científicas y entidades públicas del sector salud. Dada la necesidad de financiar proyectos que cuenten con los parámetros científicos y tecnológicos adecuados para lograr los objetivos de la convocatoria en términos de calidad y escalabilidad, se realizó un taller en el mes de agosto de 2018 con expertos de la GACD, para acompañar a las instituciones pre-seleccionadas en la elaboración de proyectos más robustos metodológicamente. Luego del proceso de acompañamiento técnico se abrió una nueva instancia para la presentación de las propuestas completas, que fueron evaluadas por un comité conformado por especialistas nacionales e internacionales, estos últimos integrantes de la GACD. Debido a que sólo cuatro de las doce propuestas presentadas cumplen con los criterios de evaluación - relevancia y calidad del proyecto de investigación, antecedentes del equipo de investigación, factibilidad del proyecto, impacto general y escalabilidad -, se acordó la reducción de la meta de 10 a 4, manteniendo el presupuesto original, puesto que se trata de estudios de más envergadura que los previstos originalmente.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NATALIAB	03/30/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
