

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1071	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	05/03/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Productive Communitarian Secondary Education	Loan Number	2828/BL-BO, 2828/BL-BO-1, 2828/BL-BO-2
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	Sector/Subsector	ED-VOC - EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION
Team Leader	MARAGALL, JUAN ERNESTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1071	40,000,000	39,858,023.85	0	0	40,000,000	39,858,023.85	39,828,259	99.93%	29,764.85
Aggregated	40,000,000	39,858,023.85	0	0	40,000,000	39,858,023.85	39,828,259	99.93%	29,764.85

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

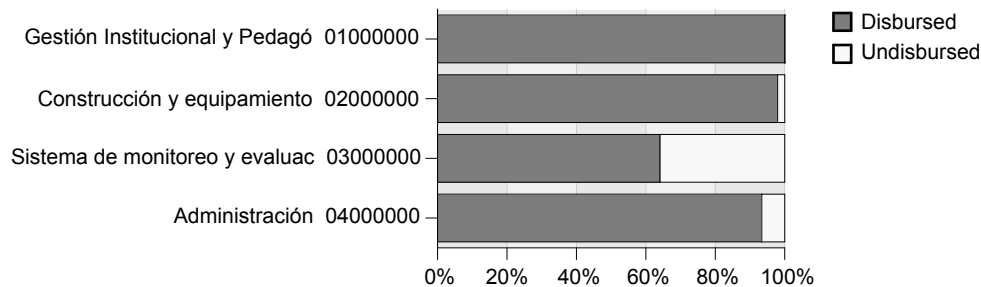

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la matrícula neta de estudiantes entre 14 y 17 años

Observation: Estrategia de país (GN-2631-1). Este indicador es a nivel de país. Durante el primer semestre de 2015, se calculará una línea de base y meta sobre los Núcleos/Unidades participantes del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.1	Tasa bruta de cobertura de estudiantes en 5° y 6° de secundaria en los 55 municipios intervenidos.	porcentaje	56.80	2012	P			58.50
					P(a)			58.50
					A		58.50	0.00
Details								
Means of verification: Sistema de Información Educativa, ME.								
Observations: Este indicador es a nivel del país. Durante el primer semestre del 2014, se calculará una línea de base y meta sobre los centros, núcleos y unidades educativas participantes. Todos los datos serán desagregados por urbano-rural, y sexo.								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 2: Incremento en la proporción de jóvenes de 15 a 19 años que completan el nivel secundario

Observation: Estrategia de país (GN-2631-1). Durante el primer semestre de 2015, se calculará una línea de base y meta sobre los Núcleos/Unidades participantes del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
2.1	Tasa de abandono en 5° y 6° de Secundaria en los 55 municipios intervenidos.	porcentaje	19.60	2012	P			20.19
					P(a)			20.19
					A		20.19	0.00
Details								
Means of verification: Sistema de Información Educativa, ME								
Observations: Este indicador es a nivel del país. Durante el primer semestre del 2014, se calculará una línea de base y meta sobre los centros, núcleos y unidades educativas participantes. Todos los datos serán desagregados por urbano-rural, y sexo.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: La oferta del BTH implementada

Observation: Fuente de verificación: Sistema de Información Educativa (SIE), Ministerio de Educación (ME)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.0	Establecimientos en condición de entregar la nueva oferta del BTH	Establecimientos	0.00	2013	P			55.00
					P(a)			55.00
					A		55.00	0.00

Details

Means of verification: Sistema de Información Educativa (SIE), Ministerio de Educación (ME)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.0	Maestros de secundaria formados en educación tecnológica productiva para el BTH	Maestros	0.00	2013	P			2,000.00
					P(a)			2,000.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Sistema de Información Educativa (SIE), Ministerio de Educación (ME)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2020
1.3	Estudiantes inscritos en el BTH en los establecimientos participantes en el programa	Students (#)	0.00	2013	P			15,000.00
					P(a)			15,000.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Sistema de Información Educativa (SIE), Ministerio de Educación (ME)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Afro-descendant				P			
					P(a)			
					A			
	Boys				P			
					P(a)			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Boys				A			
	Girls				P			
					P(a)			
					A			
	Indigenous				P			
					P(a)			
					A			
	Men				P			
					P(a)			
					A			
	Post-secondary				P			
					P(a)			
					A			
	Pre-primary				P			
					P(a)			
					A			
	Primary				P			
					P(a)			
					A			
	Secondary				P			
					P(a)			
					A			
	Women				P			
					P(a)			
					A			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la Gestión comunitaria, institucional y pedagogica de la ESCP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Módulos, Núcleos y/o Unidades Educativas con el sistema de gestión educativa comunitaria constituido	Documento	P		41		278,999.84
			P(a)	0	41	0	240,702.55
			A	0	41	0	240,702.55
1.2	Programa de Formación de Maestros para el BTH elaborado (incluye diseño curricular, modalidad y metodología para la formación) y en implementación	Programa	P		1		514,670.18
			P(a)	1	1	0	38,702.76
			A	1	1	0	38,702.76
1.3	Material educativo para maestros sobre las menciones del BTH en formato audiovisual e impreso diseñados	Paquete	P		8		118,330
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Construcción y Equipamiento para el BTH

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Estudios de Preinversión para la construcción de Módulos Tecnológicos Productivos elaborados.	Estudios	P		3		153,000
			P(a)	0	3	0	90,089.9
			A	0	3	0	90,089.9
2.2	Estudios de Preinversión para la construcción de Núcleos Tecnológicos Productivos elaborados	Estudios	P		14		420,000
			P(a)	0	11	0	313,750.81
			A	0	11	0	313,750.81
2.3	Módulos Tecnológicos Productivos construidos en 3 municipios urbanos	MTPs	P		3		2,867,602.5
			P(a)	0	3	0	5,433,257.56
			A	0	3	0	5,433,257.56
2.4	Núcleos Tecnológicos Productivos construidos en 11 municipios de zonas intermedias	NTPs	P		14		12,053,997.5
			P(a)	0	11	187,988.08	9,859,189.43
			A	0	11	187,988.08	9,859,189.43
2.5	Módulos Tecnológicos Productivos equipados en 3 municipios urbanos	MTPs	P		3		10,754,250
			P(a)	0	3	0	2,520,292
			A	0	3	0	2,520,292
2.6	Núcleos Tecnológicos Productivos equipados en 11 municipios de zonas intermedias	NTPs	P		14		7,700,000
			P(a)	0	11	0	1,771,221
			A	0	11	0	1,771,221
2.7	Núcleos Educativos equipados con Talleres Tecnológicos Productivos en 41 municipios del área rural	TTPs	P		38		3,572,750
			P(a)	0	41	0	4,088,824
			A	0	41	0	4,088,824
2.8	Unidades Educativas equipadas con laboratorios de física, química, biología y geografía	Establecimientos	P		0		0
			P(a)	1,650	1,650	8,186,338	11,447,630.9
			A	849	849	6,683,704	10,790,590.9

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Sistema de monitoreo y evaluación del BTH

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Línea de Base realizada	Línea de Base	P		1		80,000
			P(a)	0	1	0	59,694.3
			A	0	1	0	59,694.3
3.2	Sistema de Información Educativa SIE complementada con información sobre especialidades tecnológicas productivas	Informe	P		1		110,000
			P(a)	0	1	0	1,099,142
			A	0	1	20,618	692,016
3.3	Evaluación Final de los procesos de formación de maestros realizada	Informe	P		1		50,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.4	Sistematización de los Procesos de formación de maestros realizada	Informe	P		1		50,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	Evaluación final de carácter cuantitativo y cualitativo de las estrategias de implementación del BTH	Informe	P		1		120,000
			P(a)	1	1	25,000	20,408
			A	1	1	20,408	20,408
3.6	Ampliación de la línea de base a 150 municipios	Línea de Base	P		0		0
			P(a)	0	1	0	118,835.22
			A	0	1	0	118,835.22

Component Nbr. 4 Administración y Gestión del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración y gestión	P				1,156,400
		P(a)			190,630.69	1,997,054.41
		A			417,503	1,801,484.07
	Administración FPS	P				0
		P(a)			4,290.78	759,229.01
		A			4,290.78	759,229.01

Total Cost

	Total Cost	P				40,000,000.02
		P(a)			8,594,247.55	39,858,023.85
		A			7,334,511.86	38,598,287.51

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Evaluación final de carácter cuantitativo y cualitativo de las estrategias de implementación del BTH	El producto fue logrado y pagado en 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CLUNSTEDT	03/12/2020
	Sistema de Información Educativa SIE complementada con información sobre especialidades tecnológicas productivas	En 2019 se autorizó utilizar parte del remanente de recursos en la adquisición de servidores para el Datacenter del Ministerio. El Programa fue ampliado hasta el 30 de abril de 2020, de manera que los pagos a proveedores que no pudieron realizarse en 2019, se realizarán en 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CLUNSTEDT	03/12/2020
	Unidades Educativas equipadas con laboratorios de física, química, biología y geografía	El Programa fue ampliado hasta el 30 de abril de 2020, de manera que la entrega de los laboratorios remanentes se realizará durante ese periodo, así como algunos pagos a proveedores que no pudieron realizarse en 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CLUNSTEDT	03/12/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
