

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | CO-L1225 | Chief of Operations Validation Date | 04/03/20 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2019 | Division Chief Validation Date | 04/19/20 |
| Last Update | 04/03/20 | Country Representative Validation Date | 04/23/20 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Operation Name | Program for Strengthening Institutional Management of the Office of the Attorney General | Loan Number | 4443/OC-CO |
| Executing Agency | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | Sector/Subsector | RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT |
| Team Leader | ARISI, DIEGO | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Colombia |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | REPUBLICA DE COLOMBIA | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | C | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| CO-L1225 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 12,714,926.69 | 31.79% | 27,285,073.31 |
| Aggregated | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 12,714,926.69 | 31.79% | 27,285,073.31 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

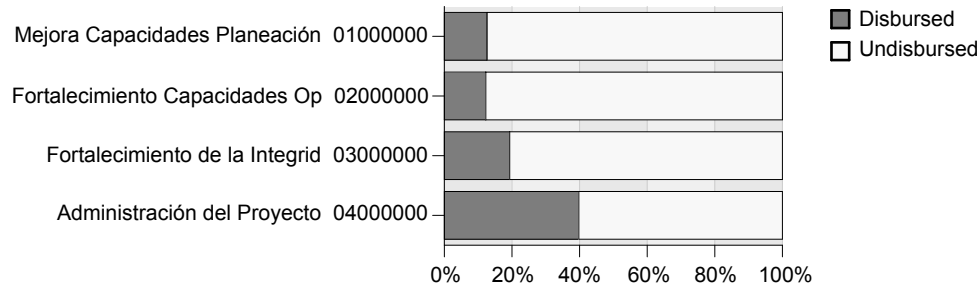

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mayor efectividad del control público

Observation: La evaluación del porcentaje de recomendaciones implementadas se realiza en el transcurso de los dos años a partir del momento de la realización de las recomendaciones. Línea de base: total de las recomendaciones realizadas en el 2017 a través de informes y/o comunicaciones en uso de la función preventiva a los sujetos vigilados Fórmula: # recomendaciones formuladas en k-2 (2017) implementadas hasta k (2020)/# recomendaciones formuladas en k-2. La línea de base será determinada durante el primer año de ejecución de la operación. La PGN actualmente no cuenta con un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación.

| En un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación. | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|----------|
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2022 | EOP 2022 |
| 0.0 | Recomendaciones y observaciones de acciones de control implementadas por entidades públicas | % | | 2017 | P | | | |
| | | | | | P(a) | | | |
| | | | | | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas. | | | | | | | | |
| Observations: La línea de base será determinada durante el primer año de ejecución de la operación. La PGN actualmente no cuenta con un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación. Meta general Doble de línea de base | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Mayor eficiencia de la gestión institucional de la PGN

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|----------|--------|--------|----------|
| 0.0 | Disminución procesos disciplinarios prescritos | Número | 1.21 | 2016 | P | 1,000.00 | 800.00 | 605.00 | 605.00 |
| | | | | | P(a) | 1,000.00 | 800.00 | 605.00 | 605.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de Planeación PGN con información de delegadas.

Observations: De 2011 a 2016 el número de prescripciones se ha triplicado de 484 a 1.210. Se espera una reducción de aproximadamente 200 procesos al año a partir del año 2.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|-------|----------|
| 0.1 | Disminución de fallos disciplinarios revocados | Porcentaje | 72.00 | 2016 | P | 65.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 |
| | | | | | P(a) | 65.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Procuradurías Provinciales. Responsable

Observations: La línea base se calcula tomando un promedio de fallos disciplinarios revocados en segunda instancia entre 2015 a 2017. Se estima una disminución en IAS revocatorias de fallos superior al 20%.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| 0.2 | Aumento de fallos de procesos disciplinarios | Porcentaje | 10.00 | 2016 | P | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Procuradurías Provinciales.

Observations: La medición se realizará teniendo en cuenta únicamente los fallos sancionatorios y absolutorios buscando al final de la operación una mejora del doble de la línea de base.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|---|------|--------|--------|----------|
| 0.3 | Disminución del número de procesos disciplinarios | Número | 305.00 | 2016 | P | 0.00 | 280.00 | 250.00 | 250.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 0.3 | a nivel provincial atendidos por funcionario | Número | 305.00 | 2016 | P(a) | 0.00 | 280.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

Observations: Número de procesos disciplinarios atendidos por funcionario al año (en promedio).

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|-------|----------|
| 0.4 | Incremento en tasa de éxito conciliaciones administrativas | Porcentaje | 10.00 | 2016 | P | 14.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | P(a) | 14.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de conciliaciones administrativas PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

Observations: Se estima un aumento porcentual de 4 puntos a la mitad del programa y un aumento de 10 puntos porcentuales al final de la operación. Esto representaría un incremento en la tasa de éxito del 20% al término del programa.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| 0.5 | Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC | Porcentaje | 46.70 | 2017 | P | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Medición de cumplimiento. Fuente: Oficina de Planeación y de Sistemas PGN.

Observations: Frente a la línea de base, se espera que la PGN cumpla con en torno al 70% de los lineamientos obligatorios (120) para entidades públicas en materia de TICs del MINTIC al término del programa.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|-------|-------|----------|
| 0.6 | Aumento en el nivel de consistencia en la información para la toma de decisiones | Porcentaje | 56.00 | 2017 | P | 0.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

Outcome Nbr. 1: Mayor transparencia e integridad interna y externa

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|-------|-------|----------|
| 1.0 | Disminución de tiempos promedio de respuesta a las denuncias, peticiones o quejas ciudadanas | Días | 107.00 | 2016 | P | 80.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | P(a) | 80.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de sistemas PGN con información de sistemas de registro de denuncias, peticiones o quejas.

Observations: El indicador realizará el número de quejas, denuncias o peticiones ciudadanas resueltas dentro los plazos establecidos por la norma/ número de denuncias peticiones o quejas ciudadanas totales.

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|-------|-------|-------|----------|
| 1.1 | Audiencias ciudadanas en línea | Porcentaje | 0.00 | 2017 | P | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | P(a) | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de sistemas PGN.

Observations: Se busca alcanzar una meta del 80% de las audiencias ciudadanas al término de la operación de manera progresiva y acumulativa a partir del año 2.

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|---|---|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 1.2 | Reducción del nivel de riesgo en aplicación de medidas anticorrupción | Nivel de Riesgo (alto=3, medio=2, bajo=1) | 4.00 | 2017 | P | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | P(a) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Fuente: Índice de Transparencia en Entidades Públicas – ITEP.

Observations: Fuente línea de base: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, 2015-16. Fichas: PGN. NOTA: Para el ingreso del indicador de línea base y metas se asignó valores numericos para cada nivel de riesgo. Estos valores no tienen relación alguna con el medio de verificación ni con su metodología

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| 1.3 | Incremento en la cobertura de vigilancia a sujetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Porcentaje | 0.20 | 2016 | P | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Responsable de recolección y reporte de datos: Datos de Grupo de Transparencia PGN - UEP PGN (reporte)

Observations: Al término de la intervención se buscará asegurar una cobertura del 10% (6.878) al final de la intervención priorizando el cubrimiento al 100% de los sujetos de alto riesgo y al 50% de los sujetos de riesgo medio.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 1.4 | Datos Abiertos Publicados | Número | 1.00 | 2017 | P | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | | P(a) | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF

Observations: Deberían existir datasets en datos abiertos de cinco sistemas de información misionales (SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2022 | 2019 | EOP 2022 |
| 1.1 | Planeación Estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de identificación de riesgos diseñada e implementada | Documento | P | 0 | 1 | 600,000 | 1,700,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 109,375 | 1,700,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Funciones disciplinarias y de intervención judicial actualizadas; y funcionarios capacitados | Documentos y Talleres | P | 0 | 1 | 200,000 | 800,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 354,222 | 800,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 396,004.02 | 562,253.28 |
| 1.3 | Sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a sujetos vigilados diseñado e implementado | Sistema | P | 0 | 1 | 100,000 | 300,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 50,000 | 300,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 72,047.41 | 72,047.41 |
| 1.4 | Modelo de Arquitectura Empresarial diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 320,000 | 1,950,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 379,192 | 1,950,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 675,956.02 | 1,150,905.63 |
| 1.5 | Modelo de arquitectura de software diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 250,000 | 1,450,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 250,000 | 1,450,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 250,000 | 750,000 |
| 1.6 | Modelo de gobierno de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 600,000 | 1,600,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 300,000 | 1,600,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 1.7 | Modelo de Inteligencia de Negocio y Datos diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 600,000 | 3,000,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 312,500 | 3,000,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 1,300,969.53 | 1,300,969.53 |
| 1.8 | Herramienta para el seguimiento y control georreferenciado de la implementación de los AP conforme a las competencias de la PGN diseñada e implementada | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 1,500,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 181,250 | 1,500,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 117,358.84 | 117,358.84 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-------------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2022 | 2019 | EOP 2022 |
| 2.1 | Diagnóstico de gobernanza con énfasis en el nivel territorial elaborado | Documento | P | 1 | 1 | 105,000 | 350,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 11,837.51 | 350,000 |
| | | | A | 0 | 1 | 11,837.51 | 350,000 |
| 2.2 | Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial piloteado, diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 950,000 | 10,000,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 421,287.49 | 10,000,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 1,228,565.55 | 1,228,565.55 |
| 2.3 | Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial evaluado | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 50,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 50,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Sistemas de información interoperables | Sistema | P | 0 | 1 | 0 | 1,000,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 200,000 | 1,000,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 261,179.73 | 261,179.73 |
| 2.5 | Servicios, infraestructura y software adquiridos | Equipos, licencias, servicios | P | 1 | 4 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| | | | P(a) | 1 | 4 | 538,733 | 8,000,000 |
| | | | A | 1 | 2 | 2,252,785.41 | 2,627,924.01 |
| 2.6 | Plan y política de mantenimiento, soporte y actualización diseñada e implementada | Documento | P | 1 | 3 | 300,000 | 1,000,000 |
| | | | P(a) | 1 | 3 | 187,500 | 1,000,000 |
| | | | A | 1 | 1 | 166,747.19 | 166,747.19 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2022 | 2019 | EOP 2022 |
| 3.1 | Marco normativo revisado y perfiles de riesgo de integridad desarrollados y adoptados | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 50,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 17,633.7 | 50,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 17,633.7 | 50,000 |
| 3.2 | Metodología para el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos diseñada e implementada | Documento | P | 0 | 1 | 150,000 | 300,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 239,866.3 | 300,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 295,519.29 | 295,519.29 |
| 3.3 | Herramienta de mitigación de riesgos en la contratación pública diseñada e implementada | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 450,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 75,000 | 450,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Sistema de monitoreo de conflictos de intereses al interior de la PGN diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 83,333 | 300,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 187,500 | 300,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 89,336.4 | 166,765.9 |
| 3.5 | Niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14 caracterizados | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 100,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 0 | 100,000 |
| | | | A | 1 | 1 | 0 | 100,000 |
| 3.6 | Estrategia y hoja de ruta para cumplir con la Ley, incluyendo la definición de la estructura institucional requerida diseñada e implementada | Documento | P | 0 | 1 | 700,000 | 2,400,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 362,500 | 2,400,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 357,044.61 | 619,295.66 |
| 3.7 | Política de datos abiertos diseñada e implementada | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 200,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 62,500 | 200,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 163,931.94 | 163,931.94 |
| 3.8 | Diagnóstico de brechas de la gestión de Quejas, Peticiones y Solicitudes Ciudadanas (QPSC) realizado y modelo de gestión diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 100,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 90,880.6 | 100,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 90,880.6 | 100,000 |
| 3.9 | Sistemas y canales para la gestión de QPSC ajustados (con base en modelo diseñado) | Sistemas | P | 1 | 2 | 300,000 | 900,000 |
| | | | P(a) | 1 | 2 | 0 | 900,000 |
| | | | A | 1 | 1 | 429,475.49 | 429,475.49 |
| 3.10 | Diagnóstico del estado actual de las comunicaciones en la entidad realizado y plan de comunicaciones, incluyendo articulación con redes sociales y mecanismos de participación de la sociedad civil diseñado | Documento | P | 0 | 1 | 0 | 200,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 0 | 200,000 |
| | | | A | 1 | 1 | 0 | 200,000 |
| 3.11 | Plan de comunicaciones de la PGN implementado | Plan | P | 0 | 1 | 400,000 | 1,000,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 281,250 | 1,000,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 444,165.62 | 453,614.54 |
| 3.12 | Modelo de audiencias ciudadanas en línea diseñado e implementado | Documento | P | 0 | 1 | 100,000 | 300,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 140,625 | 300,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 44,482.9 | 44,482.9 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|--|------------|-----------|
| | Coordinación y Asistencia Técnica | P | | | 360,000 | 700,000 |
| | | P(a) | | | 312,000 | 700,000 |
| | | A | | | 304,524.55 | 454,816.8 |
| | Auditorías | P | | | 50,000 | 200,000 |
| | | P(a) | | | 46,875 | 200,000 |
| | | A | | | 45,704.14 | 45,704.14 |
| | Evaluaciones | P | | | 0 | 100,000 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|---|---------|
| | Evaluaciones | P(a) | | | 0 | 100,000 |
| | | A | | | 0 | 0 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | 8,168,333 | 40,000,000 |
| | | P(a) | | | 5,112,527.6 | 40,000,000 |
| | | A | | | 9,316,150.45 | 12,011,557.83 |

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
