

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1243	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/19/20
Last Update	04/03/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Public Sector Strategic Management Capacities	Loan Number	4848/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	ARISI, DIEGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1243	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	1,406,047	9.37%	13,593,953
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	1,406,047	9.37%	13,593,953

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

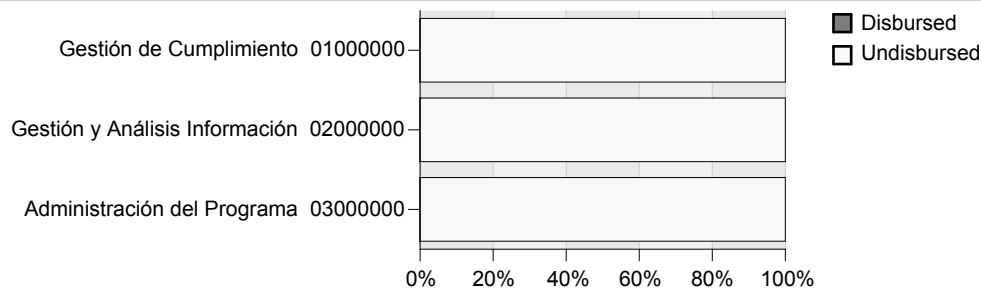

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora en la efectividad gubernamental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Índice de Efectividad Gubernamental (IEG)	Número	-0.07	2017	P	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	0.15	0.15
					P(a)	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	0.15	0.15
					A	0.00					

Details

Means of verification: Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI) project - Banco Mundial Responsable de recolección y reporte de datos: Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento (CGC - recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) DAPRE (reporte)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora en la capacidad de gestión de cumplimiento de PG

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Mejora en la calificación del gobierno en el índice de la Revisión de Capacidad de Cumplimiento (RCC - Delivery Capacity Review)	Número	2.21	2018	P	0.00	2.21	2.60	2.60	3.00	3.00
					P(a)	0.00	2.21	2.60	2.60	3.00	3.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Fuente: RCC (BID)

Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - (UEP) Dapre (reporte)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mejora en la gestión de PG mediante el uso de TIC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Prioridades gestionadas mediante el uso de datos masivos, analítica de datos y herramientas de visualización	Número	1.00	2018	P	0.00	1.00	3.00	5.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	1.00	3.00	5.00	6.00	6.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República

Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) Dapre (reporte)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de capacidades de gestión de cumplimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC) y plan de capacitación para aplicarlo en los ministerios y agencias responsables de implementar Prioridades Gubernamentales (PG) diseñado e implementado	Documento (MGC y plan de capac	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.2	Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	Funcionarios capacitados	P	0	200	0	500,000
			P(a)	0	200	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.3	Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Documento (Evaluaciones/Estrat	P	1	18	48,843	1,500,000
			P(a)	1	18	48,843	1,500,000
			A	1	1	48,843	48,843
1.4	Coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado al seguimiento y análisis de las Prioridades Gubernamentales (PG) realizada	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	15,522	500,000
			P(a)	1	5	15,522	500,000
			A	1	1	15,522	15,522
1.5	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 1 realizado – PG1	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	9,560	359,500
			P(a)	1	5	9,560	359,500
			A	1	1	9,560	9,560
1.6	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 2 realizado – PG2	Documento (análisis y seguimie	P	0	4	0	359,500
			P(a)	0	4	0	359,500
			A	0	0	0	0
1.7	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 3 realizado – PG3	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	11,656	359,500
			P(a)	1	5	11,656	359,500
			A	1	1	11,656	11,656
1.8	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 4 realizado – PG4	Documento análisis y seguimien	P	1	5	5,029	274,500
			P(a)	1	5	5,029	274,500
			A	1	1	5,029	5,029
1.9	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 5 realizado – PG5	Documento (análisis y seguimie	P	0	4	0	274,500
			P(a)	0	4	0	274,500
			A	0	0	0	0
1.10	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 6 realizado – PG6	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	8,193	274,500
			P(a)	1	5	8,193	274,500
			A	1	1	8,193	8,193
1.11	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 7 realizado – PG7	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	10,271	274,500
			P(a)	1	5	10,271	274,500
			A	1	1	10,271	10,271
1.12	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 8 realizado – PG8	Documento (análisis y seguimie	P	0	4	0	274,500
			P(a)	0	4	0	274,500
			A	0	0	0	0
1.13	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Transparencia) realizado – PG9	Documento (análisis y seguimie	P	0	4	0	274,500
			P(a)	0	4	0	274,500
			A	0	0	0	0
1.14	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Simplificación y digitalización de trámites) realizado - PG9	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	14,235	274,500
			P(a)	1	5	14,235	274,500
			A	1	1	14,235	14,235
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos	P	0	2	0	850,000
			P(a)	0	2	0	850,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos	A	0	0	0	0
1.16	Plan de cumplimiento de la REDAP con base en los diagnósticos realizados diseñado e implementado	Documento (plan de cumplimient	P	0	1	0	1,124,000
			P(a)	0	1	0	1,124,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Funcionalidades de analítica de datos definidas e integración de sistemas de información del gobierno para analizar datos que afectan la gestión de Prioridades Gubernamentales (PG) desarrolladas	Sistema (software)	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	3,000,000
			A	0	0	0	0
2.2	Herramienta de visualización de información georreferenciada diseñada e implementada	Sistema (software)	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.3	Funcionarios capacitados y actividades de gestión del cambio realizadas	Funcionarios capacitados	P	0	200	0	500,000
			P(a)	0	200	0	500,000
			A	0	0	0	0
2.4	Servicios de infraestructura y software adquiridos y operando	Documento (inventario de servi	P	0	4	0	1,500,000
			P(a)	0	4	0	1,500,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Coordinación y asistencia técnica	P			31,319	816,000
		P(a)			31,319	816,000
		A			31,319	31,319
	Auditorías	P			0	150,000
		P(a)			0	150,000
		A			0	0
	Evaluaciones	P			0	60,000
		P(a)			0	60,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			154,628	15,000,000
		P(a)			154,628	15,000,000
		A			154,628	154,628

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
