

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1067	Chief of Operations Validation Date	04/06/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/06/20
Last Update	04/03/20	Country Representative Validation Date	04/06/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening of the Management for Results of the Sector Health in Dominican Republic	Loan Number	2973/OC-DR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1067	146,000,000	146,000,000	0	0	146,000,000	146,000,000	141,464,749.21	96.89%	4,535,250.79
Aggregated	146,000,000	146,000,000	0	0	146,000,000	146,000,000	141,464,749.21	96.89%	4,535,250.79

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

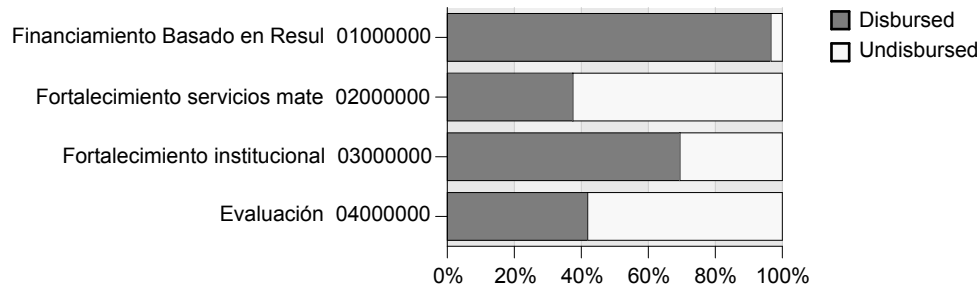

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Acceso de la población pobre a los servicios de salud mejorado y morbi-mortalidad materna e infantil disminuida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	Población pobre I-II (SIUBEN) no cubierta por ningún régimen con acceso garantizado a los servicios de salud primer nivel a través del FBR, en las cinco regiones de salud del Proyecto	Personas	0.00	2013	P		72,025.00		288,100.00		288,100.00
					P(a)		72,025.00		288,100.00		403,304.00
					A		80,955.00		288,100.00		

Details

Means of verification: Reportes de auditorias concurrentes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.2	Mortalidad materna disminuida en los seis hospitales en los que se implementará el Modelo de Centros de Excelencia CIME Materno Infantil (CEMI)	Porcentaje	155.00	2013	P		8.00		30.00		30.00
					P(a)			8.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Formulario EPI-2/Reportes SIGHO

Observations: The baseline will be calculated in 2015

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.3	Mortalidad infantil disminuida en los hospitales en que se implementará el CEMI	Porcentaje	24.00	2013	P		8.00		30.00		30.00
					P(a)			8.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Formulario EPI-2/Reportes del SIGHO

Observations: The baseline will be calculated in 2015

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejorar la asignación del gasto en salud mediante la expansión del FBR, con especial énfasis en el primer nivel de atención

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de mujeres de mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes de la semana 15 de embarazo en las cinco regiones del Proyecto, aumentada	Porcentaje	2.98	2013	P		15.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		15.00	30.00	50.00	70.00	70.00
					A		15.00	28.76	62.70	48.07	

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de mujeres púrpuras referidas del hospital a su unidad de atención primaria correspondiente con la documentación adecuada incluida en los archivos clínicos del centro de salud en las cinco regiones del Proyecto, aumentado.	Porcentaje	0.79	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	70.00	70.00
					A		10.00	29.63	67.29	45.98	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado	Porcentaje	6.79	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	100.00	100.00
					A		10.00	50.85	100.00	31.81	

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de vacunación	Porcentaje	1.80	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.1	completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado	Porcentaje	1.80	2013	P(a)		10.00	30.00	60.00	100.00	100.00
					A		10.00	32.21	100.00	23.88	

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.54	2013	P		20.00	30.00	60.00		60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	70.00	70.00
					A		10.00	18.73	64.98	7.73	

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia documentado en centro de primer nivel en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.81	2013	P		10.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	100.00	100.00
					A		10.00	30.85	100.00	38.52	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Hombres mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	12.44	2013	P		10.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00	80.00
					A		10.00	46.01	50.21	49.25	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Hombres diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	2.51	2013	P		10.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00	80.00
					A		10.00	15.12	37.33	11.01	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Hombres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.20	2013	P		10.00	30.00	50.00		50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00	80.00
					A		0.00	20.91	43.50	37.66	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Hombres diagnosticados con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	1.77	2013	P		10.00		50.00		50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00	80.00
					A		0.00	12.94	37.14	12.27	

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de población SIUBEN I y II con carnets de afiliación al régimen subsidiado en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		80.00		80.00
					P(a)		30.00	69.50	0.00	80.00	80.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes de empresa encargada de elaboración y entrega de carnets / reportes de auditorías concurrentes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.1	Cantidad de dependientes afiliados al régimen subsidiado que poseen información de acta de nacimiento en la base de datos de afiliados del SENASA en las cinco regiones del proyecto, aumentado.	Dependientes	0.00	2013	P		50,000.00		120,000.00	120,000.00
					P(a)		50,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
					A		0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Reporte de Base de Datos del SENASA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.2	Mujeres mayores de 18 años tamizadas para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	5.68	2013	P		10.00	30.00	50.00	50.00
					P(a)		10.00	30.00	80.00	80.00
					A		10.00	0.00	76.15	79.68

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.2	Mujeres diagnosticadas con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	1.16	2013	P		10.00		50.00	50.00
					P(a)		10.00		50.00	80.00
					A		10.00		71.40	20.19

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.2	Mujeres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.06	2013	P		10.00		50.00	50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00
					A		0.00	0.00	72.70	62.11

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
0.2	Mujeres diagnosticadas con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.67	2013	P		10.00		50.00		50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00	80.00
					A		0.00	0.00	72.13	24.25	
Details											
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 1: Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil mediante la expansión de una estrategia de mejoras gerenciales en los servicios de salud de segundo y tercer nivel

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	Hospitales con SIGHO implementado y en funcionamiento en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Sistema	0.00	2013	P		3.00		9.00		12.00
					P(a)		0.00		9.00	3.00	12.00
					A		0.00		9.00	0.00	
Details											
Means of verification: Reportes anuales de evaluación emitidos por la Dirección de Tecnología de Información del MISPAS											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	Porcentaje de muertes maternas e incidentes auditados por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00		95.00
					P(a)		30.00		95.00	95.00	95.00
					A		44.00		28.00	0.00	
Details											
Means of verification: Actas de las sesiones del Comité											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	Porcentaje de las muertes neonatales auditadas por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00		95.00
					P(a)		30.00		95.00	95.00	95.00
					A		1.00		0.00	0.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Actas de las sesiones del Comité											
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	Porcentaje de mujeres que reciben tratamiento activo de la tercera etapa del parto en los hospitales en que se implementará el CEMI, aumentado .	Porcentaje	0.00	2013	P		25.00		90.00		90.00
					P(a)		0.00	25.00	90.00	90.00	90.00
					A		59.00	0.00	82.00	88.00	
Details											
Means of verification: Reportes de Descripción de Parto obtenido en la primera etapa del registro físico de cada paciente, una vez implementado el SIGHO											
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	Beneficiaries (#)	P		1,448,100		130,000,000
			P(a)	403,304	1,448,100	2,783,487	130,266,361
			A	403,304	1,448,100	1,647,339	129,268,011

Component Nbr. 2 II. Calidad de los servicios de salud materno infantil fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Hospitales	P		10		272,000
			P(a)	4	4	253,563	762,394
			A	0	0	43,316	578,024
2.2	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		3,178,100
			P(a)	1	4	1,302,680	2,571,304
			A	2	0	1,891,599	2,273,107
2.3	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		1,130,000
			P(a)	6	12	1,911,666.88	4,884,861
			A	0	0	0	289,128
2.4	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Personas	P		200		2,415,999.98
			P(a)	0	205	0	270,812.6
			A	0	205	0	270,812.6
2.5	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Personas	P		150		539,000
			P(a)	0	150	0	11,022.76
			A	0	150	0	11,022.76
2.6	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Beneficiarias	P		50		1,122,000
			P(a)	50	50	2,960	9,040
			A	50	50	0	9,040

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III. Función de rectoría del sector salud fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Plan	P		1		160,000
			P(a)	1	1	255,038	278,633
			A	1	1	91,057	278,633
3.2	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Unidad	P		1		150,000
			P(a)	0	1	105,108	215,773
			A	0	0	4,963	145,569
3.3	Fortalecimiento de la Dirección de Habilitación	Normas	P		1		30,000
			P(a)	1	1	2,200	62,031
			A	0	1	0	60,309
3.4	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Normas	P		1		70,000
			P(a)	2	2	89,688	77,458
			A	2	2	0	64,383
3.5	Expediente Integrado de Salud implementado	Sistema	P		1		3,000,000
			P(a)	0	1	1,700,000	2,478,196
			A	0	0	1,966,277	2,170,511
3.6	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	Red	P		0		0
			P(a)	1	1	400,000	1,096,677
			A	0	0	190,513	203,577

Component Nbr. 4 IV. Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
4.1	Evaluación del Programa	Evaluación	P		1		50,000
			P(a)	0	2	50,000	83,000
			A	0	1	0	33,000

Other Cost

	Contratación personal UCP		P				2,525,702.03
			P(a)			100,000	1,153,605.01
			A			133,839	1,108,568.01
	Gerentes de Campo FBR (Componente I)		P				400,300
			P(a)			0	251,161.39
			A			0	251,161.39
	Gerentes de Campo CEMI (Componente II)		P				351,000
			P(a)			231,551	843,361.01
			A			151,511	798,577.01
	Gastos operativos visitas a regiones de salud para la implementación del FBR (Componente I)		P				178,000
			P(a)			2,000	90,970.55
			A			0	90,970.55
	Gastos operativos visitas a hospitales (Componente II)		P				120,000
			P(a)			25,000	195,632.41
			A			51,147	161,496.41
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del FBR (Componente I)		P				60,000
			P(a)			0	62,468.73
			A			0	62,468.73
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del CEMI (Componente II)		P				60,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del CEMI (Componente II)	P(a)			0	39,000
		A			0	39,000
	Readecuación física oficina UCP	P				0
		P(a)			0	296,238
		A			0	296,238

Total Cost

	Total Cost	P				146,000,000
		P(a)			9,214,941.88	146,000,000.46
		A			6,171,561	138,463,607.46

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Evaluación del Programa	Los recurso programados para el 2020 corresponden a la recolección de los indicadores de impacto y resultado del proyecto.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CGONZALEZ	04/03/2020
	Expediente Integrado de Salud implementado	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/13/2020
	Fortalecimiento de la Dirección de Rehabilitación	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CGONZALEZ	03/09/2020
	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CGONZALEZ	03/09/2020
	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CGONZALEZ	03/09/2020
	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/13/2020
	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/13/2020
	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Actualizacion de montos por cambios en el reagrupacion de las actividades por sus productos, de acuerdo con la informacion presentada por el Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	03/18/2020
	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Correccion de montos por error de digitación en el reporte presentado por el Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	03/18/2020
	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Actualizacion de montos por cambios en la reagrupacion de las actividades por sus productos, de acuerdo con la informacion presentada por el Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	03/18/2020
	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CGONZALEZ	03/09/2020
	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CGONZALEZ	03/09/2020
	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	Se actualizó la programación según el informe semestral y el PMR trabajado con la contraparte.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CGONZALEZ	03/09/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
