

PMR Operational Report

Operation Number	HA-L1057	Chief of Operations Validation Date	04/24/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/29/20
Last Update	04/24/20	Country Representative Validation Date	05/03/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Business Development and Training Services Program for Investment	Loan Number	2555/GR-HA
Executing Agency	Ministere du Commerce et de l'Industrie	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	FONSECA, DANIEL FERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D' HAITI		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HA-L1057	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	4,035,738.06	36.69%	6,964,261.94
Aggregated	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	4,035,738.06	36.69%	6,964,261.94

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

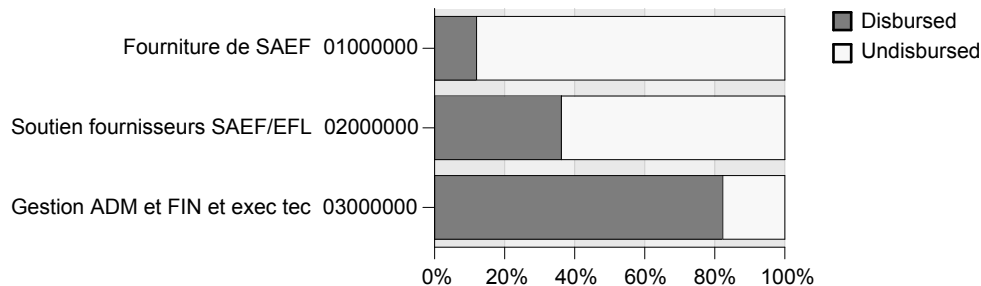

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar la Productividad de las PyMEs

Observation: En vue d'arriver à l'augmentation des marges de profit des entreprises, au 30 juin 2015, pas moins de 16 potentiels bénéficiaires ont été retenus pour recevoir une assistance technique. Au mois de septembre, le nombre de bénéficiaires identifiés/assistés est passé à 45. Des rencontres d'affaires sont aussi planifiées avec de potentiels bénéficiaires afin de susciter leur intérêt pour ce programme. Le MCI a déjà recruté, d'une part, pas moins de huit (8) consultants pour la standardisation des informations financières de potentiels bénéficiaires, et d'autre part dix-huit (18) firmes qui travaillent à l'élaboration de plans d'Affaires. Le registre de fournisseurs de BDS est en cours de préparation. Il compte 127 consultants (9 consultants individuelles et 118 par le biais des 18 firmes de consultation). Les modules de formation à l'attention de ces consultants sont en cours de finalisation et l'institution de formation déjà identifiée. En outre, trois (3) protocoles d'Accord avec trois (3) Institutions Financières Locales (IFL) sont en cours de négociation/finalisation. Aussitôt les protocoles finalisés, la préparation des modules de formation pour les officiers de crédit débiteront selon les filières identifiées. Étant donné les avancées récentes dans l'exécution du programme jusqu'à la dernière année, une augmentation dans la marge d'utilité des entreprise n'a pas pu être constatée, considérant que les effets du programme prendront du temps à se manifester.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Margen de ganancias de las empresas participantes (como señas de productividad) mejorado	Relación	1.00	2014	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20		1.20
					P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20
					A			0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Details

Means of verification: Informes de Progreso del Programa / Informe de evaluación de Impacto (Sobre la base de las encuestas de base y seguimiento).

Observations: El indicador es igual al margen de ganancias promedio, como porcentaje de las ventas de las empresas participantes en relación con el de otras empresas comparables.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso al crédito de PyMEs beneficiarias aumentado

Observation: Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de PyMEs beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las PyMEs beneficiarias del Programa y; ii) el número total de empresas comparables no beneficiarias del programa que ob

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Coeficiente PyMEs beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs beneficiarias) / PyMEs no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs no beneficiarias)	Coeficiente	1.00	2013	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
					P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
					A			0.00	0.00	1.00	1.00

Details

Means of verification: Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR

Observations: El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Acceso al crédito de las microempresas beneficiarias del programa aumentado

Observation: Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de microempresas beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las microempresas beneficiarias del Programa y; ii) el número total de microempresas comparables no beneficiaria

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Coeficiente microempresas beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas beneficiarias) / microempresas no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas no beneficiarias)	Coeficiente	1.00	2013	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
					P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
					A			0.00	0.00	1.00	1.00

Details

Means of verification: Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR

Observations: El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Comportamiento cartera de crédito PyMEs beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema

Observation: Calcula la relación entre la tasa de mora de las PyMEs beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a PyMEs beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / PyMEs benefi

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
3.1	Coeficiente tasa de mora PyMEs beneficiarias / tasa de mora PyMEs (promedio sistema financiero)	Coeficiente	1.00	2013	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					A			0.00	0.00	1.00	1.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR

Observations: El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: Comportamiento cartera de crédito microempresas beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema

Observation: Calcula la relación entre la tasa de mora de las microempresas beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a microempresas beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Coeficiente tasa de mora microempresas beneficiarias / tasa de mora microempresas (promedio sistema financiero)	Coeficiente	1.00	2013	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
					P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
					A			0.00	0.00	1.00		1.00

Details

Means of verification: Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR

Observations: El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Suministro de servicios de desarrollo empresarial y capacitación (SDEC) a las MiPyMEs elegibles

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
1.1	SMEs assisted by BDS program	Micro / small / medium enterpr	P	358	4,324,000
			P(a)	77	199,101.89
			A	125	319,700.94
1.2	Micro-enterprises assisted by BDS program	Micro / small / medium enterpr	P	112	1,775,000
			P(a)	199	393,550.2
			A	199	407,119.16

Component Nbr. 2 Apoyo para el suministro de SDEC y servicios de apoyo a instituciones de intermediación financiera

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2017	EOP 2017
2.1	Beneficiaries Identified	Beneficiarios	P	470	628,086
			P(a)	276	91,126.97
			A	319	154,237.86
2.2	Data base of BDS providers designed and functioning	Database	P	1	390,000
			P(a)	1	19,632
			A	1	4,632
2.3	Standardization and training provided to BDS providers carried out	Training Events	P	4	181,390
			P(a)	7	99,000
			A	7	120,522.66
2.4	Participating LFI's supported (development and delivery of products and processes for managing credit for MSMEs) (Desarrollo y ajuste productos y procesos para gestión crédito MiPyMEs)	Institutions	P	4	299,000
			P(a)	3	267,162
			A	3	273,336.76
2.5	Capacity building training for LFI credit officers	Training Sessions	P	9	189,859
			P(a)	4	4,841.05
			A	10	59,174.05

Component Nbr. 3 Apoyo para la ejecución estratégica, técnica y administrativa del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestión y Supervisión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Component Nbr. 5 Imprevistos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Gestión del Programa. Auditoría y Evaluaciones	P		1,389,493
		P(a)		768,904.63
		A		1,188,484.43
	Imprevistos	P		489,327
		P(a)		7,806,106.01
		A		0
	Firma Especializada Internacional	P		1,333,625
		P(a)		1,350,575.25
		A		1,477,421.88

Total Cost

	Total Cost	P		10,999,780
		P(a)		11,000,000
		A		4,004,629.74

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
