

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1105	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/29/20
<b>Last Update</b>	03/21/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/01/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support the Social Inclusion Network with Priority in Western Honduras	<b>Loan Number</b>	3723/BL-HO, 3723/BL-HO-1, 3723/BL-HO-2
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA, SECRETARIA DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1105	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	44,300,000	88.60%	5,700,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	44,300,000	88.60%	5,700,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

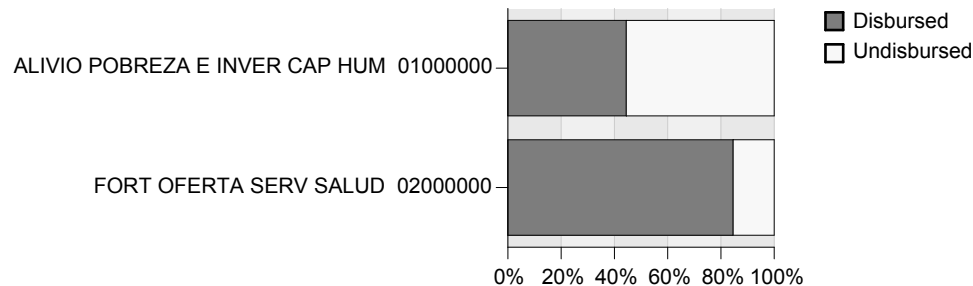

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Alivio de la Pobreza e Inversion en Capital Humano

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa de Pobreza extrema en beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor a nivel rural	%	61.20	2016	P		58.20
					P(a)	58.20	58.20
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta continua de Hogares

**Observations:** Contribuye al impacto que se mide a nivel de Programa BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Impact Nbr. 1:** Salud Materna e Infantil

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de mortalidad neonatal en Hospitales financiados por el proyecto	%	12.00	2016	P		10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Registros Hospitalarios

**Observations:** Linea base obtenidos de la Unidad de Gestión de la Información de los Hospitales de Occidente. Para 2016 Intibuca, Lempira, Valle y San Pedro Sula. Para 2018 se espera añadir Copan, La Paz y Comayagua.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Impact Nbr. 2: Nutricion

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses en población de participantes del BVM	Tasa	23.10	2016	P		20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de Hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Observations: Datos del seguimiento (EDH 2013) anemia según clasificación de OMS							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matricula del tercer ciclo de educacion	Students (#)	24.00	2016	P	
					P(a)	30.00
					A	

#### Details

Means of verification: Reporte de bases de datos SACE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Women		
		P	31.00
		P(a)	31.00
		A	
	Men	P	29.00
		P(a)	29.00
		A	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en las modalidades alternas	Students (#)	27.90	2016	P	32.00
					P(a)	32.00
					A	

#### Details

Means of verification: Informe de base de datos SACE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Women		
		P	31.00
		P(a)	31.00
		A	
	Men	P	33.00
		P(a)	33.00
		A	

Outcome Nbr. 1: Salud

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 SG en los últimos 12 meses.	%	44.30	2016	P		49.00
					P(a)	49.00	49.00
					A		

#### Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	% de cobertura de parto institucional por en los últimos 12 meses.	%	64.00	2016	P		69.00
					P(a)	69.00	69.00
					A		

#### Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	% de cobertura en atención puerperal en los primeros 7 días post parto* en hospitales, EAFs unidades de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

#### Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.3	% de atención neonatal en los primeros tres días de nacido** en hospitales, EAFs y centros de salud de la SESAL en los últimos 12 meses.	%	48.00	2016	P		52.00
					P(a)	52.00	52.00
					A		

#### Details

Means of verification: Informes de monitoreo de la UGD

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.4	Disponibilidad de Gineco-obstetras hospitalarios 24 horas al día / 7 días de la semana en los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	70.00	2016	P	80.00
					P(a)	80.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Informes de monitoreo de la UGD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.5	Establecimientos de salud de primer y segundo nivel abastecidos con métodos de Planificación familiar en los 33 municipios priorizados y los 8 hospitales descentralizados en los últimos 12 meses.	%	86.40	2016	P	89.00
					P(a)	89.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Expedientes de los centros de salud

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.6	% de recursos humanos capacitados en el uso de la metodología de consejería en PF.	%	0.00	2016	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Informes de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Eficacia y efectividad del Programa Bono Vida Mejor

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	P	70.00
					P(a)	70.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Cobertura de hogares elegibles para el programa en municipios priorizados	%	32.00	2016	A		
Details							
Means of verification: Informes del sistema gerencial de informacion							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares beneficiarios rurales que han recibido tres transferencias en el año en municipios priorizados	%	0.00	2015	P		80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de salud de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	17.00	2015	P		50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de niños participantes que cumplen con la condición de educación de acuerdo al ROP en el pago más reciente.	%	74.00	2015	P		83.00
					P(a)	83.00	83.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Informacion gerencial SSIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.4	Incremento en nivel de consumo per capita	%	0.00	2016	P		8.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.4	mensual en Hogares participantes del Piloto de graduación.	%	0.00	2016	P(a)	8.00	8.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación Fundación Capital							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Alivio de la pobreza e inversión en capital Humano.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas	Beneficiaries (#)	P	111,200	311,231	5,724,680	16,200,000
			P(a)	212,149	256,752	10,945,696	12,506,566
			A	210,593	0	6,809,715	10,530,859
1.2	Numero de consultorias para el fortalecimiento de la operatividad de la SSIS	Consultorias	P	0	170	0	1,404,100
			P(a)	0	170	172,066	4,296,351
			A	0	0	78,669	1,254,529
1.3	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	hogares	P	0	672	0	1,300,000
			P(a)	800	1,640	454,500	1,197,000
			A	845	840	554,951	1,297,451
1.4	Número de fichas socioeconomicas unicas levantadas	Hogares	P	5,000	20,000	64,803	194,411
			P(a)	0	49,566	101,475	90,552
			A	49,566	49,566	90,552	90,552

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	Beneficiaries (#)	P	543,863	543,863	1,561,015	17,290,000
			P(a)	543,863	543,863	2,828,656	17,475,378
			A	543,863	0	3,014,034	17,475,378
2.2	Municipios beneficiarios para estrategia de malaria	Municipios	P	20	20	2,200,000	2,400,000
			P(a)	0	20	1,400,000	2,400,000
			A	0	0	660,977	660,977
2.3	Convenios de Gestión firmados con Comités de Apoyo.	Convenios	P	0	5	0	784,177
			P(a)	0	5	0	1,141,202
			A	0	0	0	1,141,202
2.4	Número de convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel.	Convenios	P	2	8	2,952,044	6,660,262
			P(a)	3	8	2,687,851	6,025,842
			A	3	5	1,047,436	4,538,702
2.5	Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo.	Establecimientos de salud	P	0	75	0	420,000
			P(a)	0	75	0	417,018
			A	0	75	0	417,018
2.6	Consultorias para Fortalecimiento Hospitalario.	Consultorias	P	0	2	38,003	175,603
			P(a)	2	4	69,718	221,556
			A	2	4	72,363	194,056
2.7	Asistencia técnica para el fortalecimiento de certificación de gestores de primer y segundo nivel	consultoría	P	1	1	25,000	75,000
			P(a)	1	1	27,503	70,650
			A	1	1	23,153	70,650
2.8	Equipamiento para establecimientos de salud y hospitales	Equipo	P	1	3	200,000	584,270
			P(a)	1	4	519,290	499,729
			A	1	3	110,230	159,402
2.9	Taller de alto nivel para análisis del sistema de salud del Conjunto Garantizado de Servicios de Salud	Taller	P	0	1	0	60,000
			P(a)	0	1	0	34,123
			A	0	1	0	34,123
2.10	Consultorías para el fortalecimiento institucional de la SESAL.	Consultorias	P	1	20	20,000	669,958
			P(a)	1	20	188,937	818,016
			A	1	35	184,016	818,016
2.11	Talleres para el fortalecimiento de las intervenciones en salud en los gestores de la Iniciativa de Salud Mesoamérica	talleres	P	8	11	25,341	38,615
			P(a)	8	11	25,488	13,127
			A	8	11	0	13,127

## Other Cost

Gestión del Programa SSIS	P			356,492	661,489
	P(a)			766,680	1,636,045
	A			689,750	689,750
Auditoria SSIS	P			183,750	240,000
	P(a)			126,517	173,035
	A			91,640	107,292
Gestión del Programa Salud	P			156,539	692,115
	P(a)			254,933	812,168
	A			314,425	757,830
Auditoria SESAL	P			50,000	150,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria SESAL	P(a)			90,761	71,191
		A			56,175	71,191

Total Cost

	Total Cost	P			13,557,667	50,000,000
		P(a)			20,660,071	49,899,549
		A			13,798,086	40,322,105

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asistencia técnica para el fortalecimiento de certificación de gestores de primer y segundo nivel	Se cumplió con el producto para la Certificación de Gestores de primer nivel ya se cuenta con los lineamientos y una guía para la certificación de gestores , el remanente fue trasladado para el producto 2.6	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	03/11/2020
	Consultorias para Fortalecimiento Hospitalario.	Se continuaran financiando en este 2020 los dos recursos con los cuenta el departamento de hospitales para la supervision de los indicadores a nivel hospitalario.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	03/11/2020
	Consultorías para el fortalecimiento institucional de la SESAL.	Se cumplió con la meta programada de las consultorias para el fortalecimiento de la SESAL quedando un remanente de 4,921 dolares los cuales fueron trasladados al producto 2.6	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	03/11/2020
	Equipamiento para establecimientos de salud y hospitales	De lo remanentes de las compras de equipos se realiza la programacion de una nueva licitacion publica para la adquisicion de Rayos X y un equipo menor para hospitales	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HUGOG	03/11/2020
	Número de consultorias para el fortalecimiento de la operatividad de la SSIS	Desde el 2019 se trasladaron consultorías y actividades para financiar en casi la totalidad la operatividad del BVM. En este sentido para el 2020, se ha programado continuar el financiamiento de la operatividad en campo del programa con recursos de esta operación, aumentando ligeramente el número de gestores sociales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/12/2020
	Número de convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel.	Se ha cumplido con la meta programada en el 2019, se estaran reprogramando para el 2020 la descentralizacion de 3 hospitales .	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	03/11/2020
	Número de fichas socioeconomicas unicas levantadas	Se incorporaron actividades de movilización para el levantamiento de las fichas socioeconomicas unicas, elevando el monto en forma no relevante para el financiamiento de las mismas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/12/2020
	Número de hogares que se incorporan al piloto de graduación.	Se logró aumentar en un porcentaje mínimo la incorporación de hogares al piloto de graduación, viendose reflejado un aumento físico de 45 hogares más de lo planificado originalmente, sumando 845, y en la parte financiera un aumento resultado de esta incorporación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/12/2020
	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas	El monto ejecutado disminuyó debido a que en el año 2019 solo se cubrieron 8 meses de pago del BVM debido a la disponibilidad y asignación de recursos del Fondo de Solidaridad de Reducción de la Pobreza Extrema y se había programado 12 meses. Cabe nota que el P(a) de población beneficiaria y recursos para el BVM se reduce en 2020 debido a que la Secretaria de Finanzas solicitó la transferencia de recursos que originalmente fueron asignadas al pago del BVM, para que financie la estructura operativa del PBVM a nivel nacional.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/12/2020

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Personas cubiertas por gestores descentralizados priorizando los 33 municipios seleccionados.	Se ejecuto un poco mas del monto programado, debido a que el programa HO-L1195 no pudo comenzar en las fechas programadas, por lo que se realizo una redistribucion para poder pagar a los gestores de primer nivel y garantizar los servicios de salud en las poblaciones mas postergadas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	03/11/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
