

PMR Operational Report

Operation Number	NI-L1143	Chief of Operations Validation Date	04/11/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/12/20
Last Update	04/07/20	Country Representative Validation Date	04/15/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Programa Multisectorial de Atención a Determinantes de la Salud en el Corredor Seco	Loan Number	4422/BL-NI, 4422/BL-NI-1, 4422/BL-NI-2
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Nicaragua
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE NICARAGUA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Durante la misión se confirmó que el MINSA: (i) aún no ha cumplido con la cláusula contractual 4.08 inciso b) del contrato de préstamo (ver numeral 5 del cuadro 2 de este reporte), estando las obras del nuevo Hospital de Ocotol con un avance de 21.46%, y (ii) no ha cumplido con el 65% de las acciones acordadas en el plan de acción de la misión anterior (septiembre 2019).		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1143	133,000,000	133,000,000	5,306,210	0	138,306,210	133,000,000	15,364,391.11	11.55%	117,635,608.89
Aggregated	133,000,000	133,000,000	5,306,210	0	138,306,210	133,000,000	15,364,391.11	11.55%	117,635,608.89

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

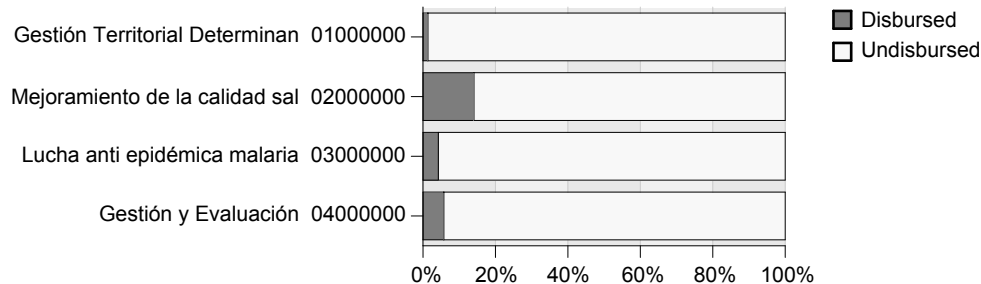

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mortalidad Materna e infantil reducidas

Observation: RMM referida en el resumen ejecutivo del informe de gestión 2015. Para Estelí la línea de base es la media nacional referida en el resumen ejecutivo del informe de gestión 2015; no tiene cifra específica para Estelí. Fuente de la Línea de Base (FLB): Base datos estadísticas vitales y producción de servicios del MINSA (DES-BEVPS).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Razón de mortalidad materna Estelí	Muertes por 100.000 nacidos vivos	19.80	2015	P	16.63	16.63
					P(a)	16.63	16.63
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Razón de mortalidad materna Jinotega	Muertes por 100.000 nacidos vivos	116.80	2015	P	109.79	109.79
					P(a)	109.79	109.79
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Razón de mortalidad materna Madriz	Muertes por 100.000 nacidos vivos	66.80	2015	P	59.80	59.80
					P(a)	59.80	59.80
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.3	Razón de mortalidad materna Matagalpa	Muertes por 100.000 nacidos vivos	25.00	2015	P	16.00	16.00
					P(a)	16.00	16.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.4	Razón de mortalidad materna Nueva Segovia	Muertes por 100.000 nacidos vivos	18.60	2015	P	17.11	17.11
					P(a)	17.11	17.11
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.5	Mortalidad en la niñez por neumonía Estelí	Muertes por 100.000 menores de 5 años	34.90	2015	P	26.18	26.18
					P(a)	26.18	26.18
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.6	Mortalidad en la niñez por neumonía Jinotega	Muertes por 100.000 menores de 5 años	25.30	2015	P	18.98	18.98
					P(a)	18.98	18.98
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.7	Mortalidad en la niñez por neumonía Madriz	Muertes por 100.000	31.90	2015	P	23.93	23.93

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.7	Mortalidad en la niñez por neumonía Matriz	menores de 5 años	31.90	2015	P(a)	23.93	23.93
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.8	Mortalidad en la niñez por neumonía Matagalpa	Muertes por 100.000 menores de 5 años	51.30	2015	P	38.48	38.48
					P(a)	38.48	38.48
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.9	Mortalidad en la niñez por neumonía Nueva Segovia	Muertes por 100.000 menores de 5 años	25.20	2015	P	18.90	18.90
					P(a)	18.90	18.90
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.10	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Estelí	Muertes por 100.000 menores de 5 años	7.80	2015	P	5.85	5.85
					P(a)	5.85	5.85
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2023	EOP 2023

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

		Measure		Year			
0.11	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Jinotega	Muertes por 100.000 menores de 5 años	4.00	2015	P	3.00	3.00
					P(a)	3.00	3.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.12	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Madriz	Muertes por 100.000 menores de 5 años	9.10	2015	P	6.80	6.80
					P(a)	6.80	6.80
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.13	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Matagalpa	Muertes por 100.000 menores de 5 años	5.50	2015	P	4.10	4.10
					P(a)	4.10	4.10
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.14	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Nueva Segovia	Muertes por 100.000 menores de 5 años	2.80	2015	P	2.20	2.20
					P(a)	2.20	2.20
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Impact Nbr. 1: Reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años

Observation: FLB: Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 2011 12.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Jinotega	Porcentaje	27.80	2012	P	24.00	24.00
					P(a)	24.00	24.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.1	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Madriz	Porcentaje	29.50	2012	P	26.00	26.00
					P(a)	26.00	26.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Nueva Segovia	Porcentaje	27.70	2012	P	24.00	24.00
					P(a)	24.00	24.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles reducida

Observation: Se ajusta LB conforme Datos oficiales DES-MINSA 2015. Se ajusta meta de los indicadores que varió su LB, manteniendo la misma dimensión y justificación establecida en la MR aprobada en el POD y que se ha calculado de 0.5 puntos porcentuales de disminución de muertes con respecto a LB ajustada (no se utiliza variación relativa, sino absoluta), considerando que el país tiene un programa de CaCu muy incipiente y conforme bibliografía consultada al momento de la formulación del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Estelí	Por 100.000 mujeres 15 y más años	14.30	2015	P	13.80	13.80
					P(a)	13.80	13.80
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.2	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Jinotega	Por 100.000 mujeres 15 y más años	6.80	2015	P	6.30	6.30
					P(a)	6.30	6.30
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.3	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Matriz	Por 100.000 mujeres 15 y más años	11.00	2015	P	10.50	10.50
					P(a)	10.50	10.50
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.4	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Matagalpa	Por 100.000 mujeres 15 y más años	12.60	2015	P	12.10	12.10
					P(a)	12.10	12.10

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

2.4	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Matagalpa	Por 100.000 mujeres 15 y más años	12.60	2015	A		
-----	--	-----------------------------------	-------	------	---	--	--

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.5	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Nueva Segovia	Por 100.000 mujeres 15 y más años	21.80	2015	P	21.00	21.00
					P(a)	21.00	21.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 3: Reducción de la prevalencia de malaria.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	Número de casos	10,944.00	2017	P	2,000.00	2,000.00
				P(a)	2,000.00	2,000.00
				A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Gestión territorial de determinantes de la salud mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Hospitalización de menores de 5 años por EDA en Madrid	Hospitalizaciones en <5a por 1,000 niños <5a	2.10	2015	P	1.74	1.74
					P(a)	1.74	1.74
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Hospitalización de menores de 5 años por EDA en Jinotega	Hospitalizaciones en <5a por 1,000 niños <5a	1.90	2015	P	1.58	1.58
					P(a)	1.58	1.58
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.3	Hospitalización de menores de 5 años por EDA en Nueva Segovia	Hospitalizaciones en <5a por 1,000 niños <5a	1.90	2015	P	1.58	1.58
					P(a)	1.58	1.58
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.4	Hogares en los que consumen agua con calidad adecuada	%	0.00	2018	P	8.00	8.00
					P(a)	8.00	8.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Elaborar Línea de base en 2018 y medición final en el 2022. Las encuestas se levantarán a través del MINSA como acciones de vigilancia. Meta: mejora en 8 puntos porcentuales

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.5	Velocidad promedio (camioneta, autobús) en las vías recolectoras principales rurales intervenidas	Km/Hra	20.00	2017	P	40.00	40.00
					P(a)	40.00	40.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Municipios de Quilalí-Wiwilí. Vías recolectoras: conectan las comunidades rurales a la unidad de salud cabecera del municipio.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Calidad de atención de la salud mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Ingreso oportuno de las púerperas (puerperio mediano)	%	65.30	2014	P	92.73	92.73
					P(a)	92.73	92.73
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Corresponde al puerperio mediano. Promedio nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Niños menores de 24 meses atendidos con el esquema de alimentación infantil y nutricional comunitaria	%	35.00	2016	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
1.3	Niños de 0-23 meses con cobertura para todas las vacunas según el esquema oficial del programa nacional de inmunización	%	83.00	2015	P	95.00	95.00
					P(a)	95.00	95.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.4	Adolescentes que acceden a servicios de planificación familiar	%	22.50	2012	P	28.13
					P(a)	28.13
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.5	Personas que requieren cuidados especiales y acceden a servicios de rehabilitación comunitaria de acuerdo a la condición de salud	%	7.00	2014	P	14.00
					P(a)	14.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Cuidados especiales: rehabilitación por discapacidad primaria o secundaria a enfermedad crónica o accidente.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.6	Personas mayores de 25 años en quienes se realizan acciones de captación oportuna de enfermedades crónicas: Diabetes, Hipertensión, Sobrepeso/obesidad, Cáncer cervical, Enfermedad renal crónica	%	20.00	2017	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Las acciones de detección requieren tener participación comunitaria, estrategias de sensibilización, continuidad con protocolos de diagnóstico y manejo en atención primaria y en el segundo nivel a través de la estrategia de redes del MOSAFC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.7	Pacientes con enfermedades crónicas que inician proceso de diagnóstico y tratamiento inmediato	%	50.00	2017	P	85.00	85.00
					P(a)	85.00	85.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Las acciones de detección requieren tener participación comunitaria, estrategias de sensibilización, continuidad con protocolos de diagnóstico y manejo en atención primaria y en el segundo nivel a través de la estrategia de redes del MOSAFC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.8	Cobertura hospitalaria cirugía electiva	% entre cirugías realizadas con el total de programadas	66.38	2015	P	81.38	81.38
					P(a)	81.38	81.38
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Se espera aumento por la mayor oferta de servicios hospitalarios. Porcentaje de cirugía programada en relación con el total de cirugías realizadas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Numero de casos de malaria reducidos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Establecimientos de salud reportando al sistema de vigilancia según norma nacional	%	70.00	2014	P	90.00	90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Observations: Indicadores del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria 2014-2018-MINSA

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.2	Casos diagnosticados que reciben tratamiento dentro de las primeras 24 horas	%	70.00	2014	P	95.00	95.00
					P(a)	95.00	95.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Observations: Indicadores del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria 2014-2018-MINSA							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Gestión territorial de determinantes de la salud (Alcance: municipios de Quilalí, Wiwili, Las Sabanas)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Planes de Inversión (PI) anuales ejecutados y supervisados	Planes	P	3	3	138,000	510,000
			P(a)	1	3	194,757.62	623,668.69
			A	1	0	138,501.43	178,544.21
1.2	Unidades de salud (puestos de salud, centros de salud y casas maternas), del área priorizada habilitados con acceso mejorado a agua y saneamiento	Unidades de Salud	P	3	15	300,000	1,300,000
			P(a)	3	15	365,000	1,204,655.58
			A	6	6	177,254.68	177,254.68
1.3	Familias del área rural con paquete de apoyo a prácticas saludables en el hogar y entorno	Familias con paquetes	P	400	3,000	450,000	2,500,000
			P(a)	0	3,000	0	2,470,000
			A	0	0	0	0
1.4	Km de caminos mejorados con mantenimiento mayor	Kilómetros	P		38.64	7,198,158	15,762,210
			P(a)	0	38.64	0	16,067,210
			A	0	0	306,210	306,210
1.5	Km de caminos con mantenimiento básico	Kilómetros	P		38.64		1,459,200
			P(a)	0	38.64	0	1,459,200
			A	0	0	0	0
1.6	Rutas de transporte colectivo en caminos intervenidos por el programa, con medidas regulatorias de optimización del servicio	Rutas	P		2		805,000
			P(a)		2	0	500,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de la calidad de la atención en salud (Alcance: nacional y 5 SILAIS priorizados)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Normas de alimentación infantil (Programa Comunitario de Salud y Nutrición -PROCOSAN, Lactancia Materna, Alimentación y Nutrición) actualizadas e implementadas en municipios	Municipios	P	15	50	445,000	1,070,000
			P(a)	15	50	269,104.48	1,049,025.43
			A	15	15	6,882.74	6,882.74
2.2	Municipios con la estrategia de promoción de la salud de las y los adolescentes implementada	Municipios	P	15	50	240,000	760,000
			P(a)	15	50	190,000	645,000
			A	0	0	0	0
2.3	Protocolos de detección y manejo oportuno de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y para atención a personas con necesidades especiales (cuidados especiales), actualizados y aprobados, incluye guía comunitaria	Protocolos o guías	P	3	10	20,000	170,000
			P(a)	2	5	320,857.31	1,065,857.31
			A	2	2	0	0
2.4	Pacientes crónicos nuevos captados en el censo	Pacientes	P	2,000	32,300	30,000	484,500
			P(a)	0	32,300	0	341,500
			A	0	0	0	0
2.5	Pacientes crónicos censados y con tres registros de atención en el último año	Pacientes	P		32,000		504,750
			P(a)	0	32,000		324,750
			A	0	0	0	0
2.6	Pacientes con necesidades especiales nuevos captados en censo	Pacientes	P	500	4,000	70,000	125,000
			P(a)	0	1,500	80,000	260,000
			A	0	0	10,349.46	10,349.46
2.7	Pacientes con necesidad especial, con protocolo semestral de seguimiento cumplido en el último semestre	Pacientes	P		4,000	10,000	40,000
			P(a)	0	4,000	0	40,000
			A	0	0	0	0
2.8	Municipios dotados de medios de transporte para la supervisión del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC)	Municipios	P		30		750,000
			P(a)	0	30	0	600,000
			A	0	0	0	0
2.9	Personal capacitado en el Marco de Gestión Ambiental y Social	Personal	P	80	250	12,500	32,500
			P(a)	80	250	12,500	20,000
			A	0	0	0	0
2.10	Talleres de mantenimiento de equipos y unidades móviles del SILAIS Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega, remplazados y/o habilitados	Talleres	P	2	4	227,500	1,020,000
			P(a)	2	4	225,000	1,010,000
			A	1	1	0	0
2.11	Hospital Departamental de Nueva Segovia, remplazado y equipado	Hospital	P		1	27,008,000	64,615,900
			P(a)	0	1	8,558,283.84	59,844,733.08
			A	0	0	2,737,951.96	13,233,018.58
2.12	Hospital de Jalapa construido y equipado	Hospital	P		1	2,280,000	12,689,600
			P(a)	0	1	0	16,408,422.62
			A	0	0	0	0
2.13	Hospital de Estelí rehabilitado y equipado	Hospital	P		1	892,100	1,500,000
			P(a)	0	1	8,600	1,492,100
			A	0	0	7,515.72	7,515.72
2.14	Hospital Primario de Wiwilí (JI) y Waslala (MT) remplazados y equipados	Hospital	P		2	53,000	9,035,000
			P(a)	0	2	60,000	10,100,480.04
			A	0	0	0	0
2.15	Hospital Primario de San Juan de Limay rehabilitado y equipado	Hospital	P		1	7,000	900,000
			P(a)	0	1	6,600	902,800

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.15	Hospital Primario de San Juan de Limay rehabilitado y equipado	Hospital	A	0	0	6,069.2	6,069.2
2.16	Unidades de Salud de la Trinidad (ES) mejorados	Unidades de Salud	P		1	459,000	1,500,000
			P(a)	0	2	0	1,410,519.96
			A	0	0	0	0
2.17	Salas de fisioterapia en Unidad de Salud cabecera construidas y equipadas	Salas	P		37	973,800	1,341,000
			P(a)	0	10	0	882,000
			A	0	0	0	0
2.18	Salas de fisioterapia en Unidades de Salud cabecera equipadas	Salas	P		0		0
			P(a)	0	12		324,000
			A	0	0	0	0
2.19	Costeo de las atenciones de servicios de salud	Estudio	P		0		0
			P(a)	1	1	30,000	30,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3. Lucha antipidémica y erradicación de la malaria (Alcance: Bilwi, Las Minas, RACCS, Chinandega y 5 SILAIS Priorizados)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Centro Nacional de Diagnóstico y red de Laboratorios de Referencia con equipamiento modernizado	Centros	P		1	500,000	1,030,000
			P(a)	23	23	1,030,000	1,030,000
			A	0	0	0	0
3.2	Laboratorio epidemiológico regional en Estelí construido y equipado	Laboratorio	P		1	16,000	650,000
			P(a)	0	1	8,600	1,983,300
			A	0	0	7,514.22	7,514.22
3.3	Bodega Regional de insumo construida y equipada	Bodega	P		1	20,000	2,596,500
			P(a)	0	1	8,600	2,183,883.45
			A	0	0	7,514.23	7,514.23
3.4	Municipios con plan de gestión de riesgo asociado al agua implementado	Municipios	P	36	36	450,000	1,800,000
			P(a)	10	36	133,480	418,741
			A	5	0	1,341.61	1,341.61
3.5	Municipios con gestión de focos implementada	Municipios	P	20	35	727,714	1,273,500
			P(a)	25	62	2,721,444.92	4,552,935
			A	25	25	706,732.85	706,732.85
3.6	Municipios equipados y con plan anual de control de vectores implementados	Municipios	P	28	28	600,000	2,400,000
			P(a)	8	28	175,960	496,824
			A	8	0	56,075.78	56,075.78

Other Cost

Gestión del Programa	P			500,000	2,146,550
	P(a)			240,931.2	1,444,603.84
	A			192,113.6	205,657.9
Evaluación	P				450,000
	P(a)			0	450,000
	A			0	0
Auditoría	P			7,500	220,000
	P(a)			7,500	220,000
	A			0	0
Costos Financieros	P			1,000,000	6,450,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Costos Financieros	P(a)			300,000	6,450,000
		A			163,624.44	163,624.44

Total Cost

	Total Cost	P			44,755,272	138,306,210
		P(a)			14,947,219.37	138,306,210
		A			4,525,651.92	15,074,305.62

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Bodega Regional de insumo construida y equipada	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	04/03/2020
	Hospital Primario de Wiwili (JI) y Waslala (MT) remplazados y equipados	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Km de caminos mejorados con mantenimiento mayor	Se ajustó el período de entrega del producto, actualmente, este se encuentra en proceso de licitación y se prevé firmar contrato en el primer semestre del 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/30/2020
	Laboratorio epidemiológico regional en Estelí construido y equipado	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/30/2020
	Municipios con la estrategia de promoción de la salud de las y los adolescentes implementada	Se modifica y ajusta la cantidad de municipios conforme planitificación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Municipios con plan de gestión de riesgo asociado al agua implementado	Se modifica y ajusta la cantidad de municipios conforme planitificación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/30/2020
	Normas de alimentación infantil (Programa Comunitario de Salud y Nutrición - PROCOSAN, Lactancia Materna, Alimentación y Nutrición) actualizadas e implementadas en municipios	Se modifica y ajusta la cantidad de municipios conforme planitificación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Pacientes crónicos nuevos captados en el censo	El estudio de costeo ha tenido retrasos de elaboración, que hace que se replanifique este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Planes de Inversión (PI) anuales ejecutados y supervisados	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Protocolos de detección y manejo oportuno de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y para atención a personas con necesidades especiales (cuidados especiales), actualizados y aprobados, incluye guía comunitaria	El estudio de costeo ha tenido retrasos de elaboración, que hace que se replanifique este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Rutas de transporte colectivo en caminos intervenidos por el programa, con medidas regulatorias de optimización del servicio	El Ministerio de Transporte reorientó recursos para el producto de caminos mejorados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Talleres de mantenimiento de equipos y unidades móviles del SILAIS Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega, remplazados y/o habilitados	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
	Unidades de Salud de la Trinidad (ES) mejorados	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RPASOS	03/30/2020
	Unidades de salud (puestos de salud, centros de salud y casas maternas), del área priorizada habilitados con acceso mejorado a agua y saneamiento	Se ajusta periodo de entregable, conforme cronograma de matriz de obras del MINSA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RPASOS	03/25/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Project Design
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
