

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1152	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/26/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/30/20
<b>Last Update</b>	03/26/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement and Expansion of employment Center Services for Formal Job placement	<b>Loan Number</b>	3547/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	<b>Sector/Subsector</b>	IS-LIS - SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
<b>Team Leader</b>	ROSAS SHADY, G. DAVID	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1152	30,000,000	30,000,000	8,900,000	0	38,900,000	30,000,000	5,658,690	18.86%	24,341,310
Aggregated	30,000,000	30,000,000	8,900,000	0	38,900,000	30,000,000	5,658,690	18.86%	24,341,310

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

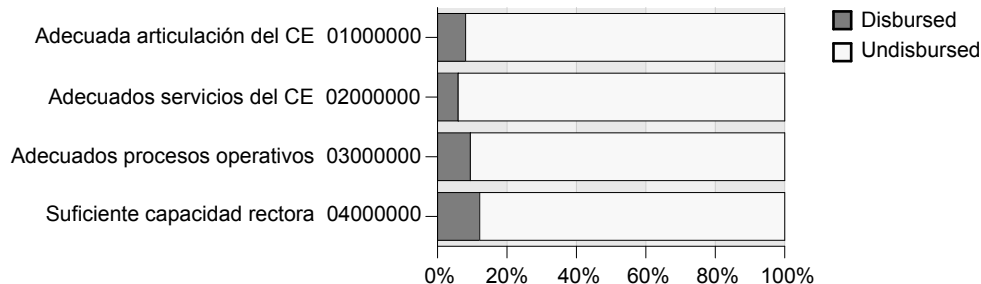

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incrementar la contratación formal (mejorar la incidencia)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
0.0	Incidencia de contratación formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Por ciento	10.70	2013	P		17.00	
					P(a)		17.00	
					A			
Details								

**Means of verification:** Tratado: SILNET, Planilla

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
0.1	Incidencia de contratación formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Por ciento	10.70	2013	P		15.00	
					P(a)		15.00	
					A			
Details								

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar la calidad de la contratación formal (mejorar la pertinencia)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
1.0	Salarios de jóvenes contratados formalmente capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Promedio de salario real por hora	5.49	2013	P		8.00	
					P(a)		8.00	
					A			
Details								

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
1.1	Salarios de jóvenes contratados formalmente vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Promedio de salario real por hora	5.49	2013	P		6.00	
					P(a)		6.00	
					A			
Details								

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Reducir los costos de la contratación formal (mejorar la eficiencia)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
2.0	Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Por ciento		2015	P		7.00	
					P(a)		7.00	
					A			

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2021
2.1	Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Por ciento		2015	P		5.00	
					P(a)		5.00	
					A			

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Adecuada articulación del Centro de Empleo con el sector productivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	Piloto	P		2		321,629
			P(a)		2	116,571	311,235
			A		0	0	0
1.2	Eventos de articulación ejecutados	Evento	P	22	112	212,903	1,083,870
			P(a)	17	112	470,566	1,446,261
			A	25	64	261,153	754,369
1.3	Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	Servicio	P	1	1	458,019	1,004,785
			P(a)	0	1	142,857	270,120
			A	0	0	0	0
1.4	Asistencia técnica BT-Triage implementada	Servicio	P	1	1	711,271	2,717,419
			P(a)	0	1	0	5,773,874
			A	0	0	0	0
1.5	Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado	Unidad de análisis	P		7	1,177,494	5,059,083
			P(a)		7	810,714	2,111,333
			A		0	1,996	11,934
1.6	Plan de medios de difusión al sector productivo implementado	Plan	P		1	710,359	3,726,034
			P(a)		1	188,571	4,000,000
			A		0	0	0

## Component Nbr. 2 Adecuados servicios del Centro de Empleo para los jóvenes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	Instrumento	P	1	1		240,469
			P(a)	1	1	279,995	283,375
			A	1	1	187,179	212,955
2.2	Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado	Beneficiaries (#)	P		2,600	574,031	3,167,321
			P(a)		2,600	875,714	5,272,496
			A		0	19,344	19,344
2.3	Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada	Servicio	P		1	76,645	766,452
			P(a)		1	0	1,653,104
			A		0	530,530	530,530
2.4	Pilotos diseñados e implementados (aprendizaje y mentoría)	Piloto	P		2	2,031,760	4,496,127
			P(a)		2	0	1,308,939
			A		0	8,939	8,939
2.5	Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL)	Servicios	P	1	2	365,806	2,132,718
			P(a)	1	2	753,143	2,285,175
			A	1	1	330,612	346,953

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Adecuados procesos operativos del Centro de Empleo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Estudio de arquitectura realizado	Estudio	P	1	1	55,361	221,444
			P(a)	0	2	28,571	328,652
			A	1	1	10,033	10,033
3.2	Hardware/Software aplicados	Software/Hardware	P		1	616,800	5,901,384
			P(a)		1	0	1,405,494
			A		0	27,849	27,849
3.3	Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas	Oficina	P	3	9	206,385	1,199,211
			P(a)	3	9	2,208,679	5,587,893
			A	3	3	1,167,695	1,247,543

#### Component Nbr. 4 Suficiente capacidad rectora del MTPE con los Gobiernos Regionales para la inserción laboral juvenil

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido	Unidad	P		1	150,735	1,192,847
			P(a)		1	17,857	1,823,779
			A		0	401,274	401,274
4.2	Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e implementado	Sistema	P	1	2	461,745	1,703,937
			P(a)	0	2	271,643	969,803
			A	0	0	86,211	86,211
4.3	Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado	Mecanismo	P		1		96,871
			P(a)		1	5,429	200,074
			A		0	0	0

#### Other Cost

	Remuneraciones	P			541,408	2,849,033
		P(a)			564,000	2,973,066
		A			563,496	1,708,070
	Gastos administrativos	P			27,636	140,483
		P(a)			53,143	467,809
		A			197,750	342,809
	Auditoría	P			70,000	350,000
		P(a)			70,000	328,641
		A			77,998	133,641
	Evaluaciones	P			115,789	549,998
		P(a)			0	120,000
		A			0	0

#### Total Cost

	Total Cost	P			8,564,147	38,921,115
		P(a)			6,857,453	38,921,123
		A			3,872,059	5,842,454

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Asistencia técnica BT-Triaje implementada	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Estudio de arquitectura realizado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Eventos de articulación ejecutados	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Hardware/Software aplicados	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Pilotos diseñados e implementados (aprendizaje y mentoría)	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Plan de medios de difusión al sector productivo implementado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL)	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e implementado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020
	Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado	Replanificación física y financiera del producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/04/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
