

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1105	Chief of Operations Validation Date	03/20/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/22/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	04/30/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Inclusion and Development Program	Loan Number	3512/OC-PN, 3512/OC-PN-1, 3512/OC-PN-2
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Comisión E-Panamá		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1105	50,000,000	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	50,000,000	11,068,200	22.14%	38,931,800
Aggregated	50,000,000	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	50,000,000	11,068,200	22.14%	38,931,800

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

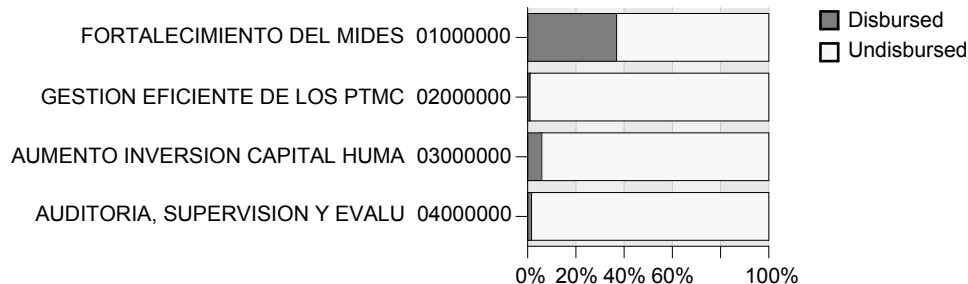

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Incidencia pobreza extrema	%	11.00	2015	P		6.50
					P(a)		6.50
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.

Observations: Los datos de la encuesta se utiliza para calcular (i) cobertura de los PTMC; (ii) pobreza y pobreza extrema.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.1	Incidencia pobreza general	%	25.80	2015	P		16.70
					P(a)		16.70
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.

Observations: Los datos de la encuesta se utiliza para calcular (i) cobertura de los PTMC; (ii) pobreza y pobreza extrema

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar la capacidad del sistema de protección social para promover la acumulación del capital humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.0	Niños en los COIF que tienen puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico	%	0.00	2015	P		-10.00
					P(a)		-10.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Independiente aplicadas en Centros de Orientación Infantil (COIF)

Observations: El instrumento de Edades y Etapas (ASQ-3 por su siglas en Inglés) es una herramienta de detección de rezagos en el desarrollo de niños de 1 y 66 meses de edad. Línea Base N/D.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.1	Niños en los COIF que tienen valor z talla para la edad por debajo de un umbral crítico	%	0.00	2015	P		-10.00
					P(a)		-10.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Independiente aplicadas en Centros de Orientación Infantil (COIF)

Observations: Mediciones antropométrica con tallímetro de acuerdo a estándares internacionales recomendados por la OMS y UNICEF.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema general

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Pobres extremos en hogares con menores de 18 años incluidos en el programa Red de Oportunidades (RdO) - cobertura	%	48.00	2015	P			80.00
					P(a)			80.00
					A			

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Ratio entre número de individuos que viven en hogares de la población objetivo que reciben beneficios del programa, y número total de individuos que viven en hogares de la población objetivo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Beneficiarios de la RdO que no son pobres extremos (filtración)	%	42.00	2015	P			35.00
					P(a)			35.00
					A			

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema).

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Beneficiarios del Programa 120 a los 65 que no son pobres (filtración)	%	53.00	2015	P			35.00
					P(a)			35.00
					A			

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Beneficiarios de Ángel Guardián (AG) que no son	%	0.00	2015	P			-5.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	pobres extremos (filtración)	%	0.00	2015	P(a)				-5.00
					A				
Details									
Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)									
Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Beneficiarios de la RdO recertificados	beneficiarios	0.00	2015	P				190,000.00
					P(a)				190,000.00
					A				
Details									
Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.									
Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.5	Beneficiarios de 120 a los 65 recertificados	beneficiarios	0.00	2015	P				44,000.00
					P(a)				44,000.00
					A				
Details									
Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.									
Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.6	Beneficiarios de ÁG recertificados	beneficiarios	0.00	2015	P				22,000.00
					P(a)				22,000.00
					A				
Details									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.7	Beneficiarios de la RdO que tienen acceso a los servicios de salud y educación	%	0.00	2015	P			5.00
					P(a)			5.00
					A			

Details

Means of verification: Datos administrativos del MINSA y del MEDUCA; Reportes SIG; Reportes RUB.

Observations: Se define acceso a servicios de salud y educación como población de una comunidad que accede a un proveedor de salud y escuela cuya comunidad esté a menos de una hora de distancia de dichas instalaciones. Línea de base a estimar en 2016 que fijara la meta en +5pp sobre la línea base..

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Aumentar la capacidad del Sistema de Protección Social para promover la acumulación del capital humano

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) que aplica los estándares de calidad aprobados por el MIDES	%	0.00	2015	P			60.00
					P(a)			60.00
					A			

Details

Means of verification: Datos administrativos del MIDES. Informe de la Dirección de Servicios Sociales.

Observations: No existen estándares de calidad definido para los CAIPI, por lo cual línea de base es 0. Los estándares de calidad para los CAIPI incluirán las siguientes áreas: infraestructura y equipamiento; salud y nutrición; gestión y administración, componente pedagógico y talento humano; y identidad, familia y comunidad. Se aplicará un checklist para medir dichas áreas de calidad.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Calidad de CAIPI medida por ITES-R	%	0.00	2015	P			20.00
					P(a)			20.00
					A			

Details

Means of verification: Encuestas Independientes aplicadas en COIF

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: ITERS-R (Infant and Toddler Environment Rating Scale-Revised) instrumento de medición de la calidad en centros para niños. La calificación se realiza siguiendo una escala numérica del 1 al 7, donde 1 significa baja calidad y 7 excelente. Línea base N/D. La meta es de +20 pp de los COIF con puntaje mayor a 4.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del MIDES a nivel central y territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Personal de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) contratado	# funcionarios	P		0		0
			P(a)	6	6	163,000	1,040,981.1
			A	6	6	168,347	640,981.1
1.2	Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) y enlaces gubernamentales capacitados	# funcionarios	P	0	5	0	33,000
			P(a)	0	78	0	6,675
			A	0	78	0	6,675
1.3	Dirección de programas para la administración, supervisión y monitoreo de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) conformada	# direcciones	P	0	1	0	36,700
			P(a)	0	1	68,000	676,348
			A	0	1	133,501	410,348
1.4	Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC)	# funcionarios	P	0	40	77,150	177,150
			P(a)	60	121	6,000	177,150
			A	30	121	2,738	47,480
1.5	Funcionarios de las Direcciones Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formados	# funcionarios	P	0	70	10,000	51,200
			P(a)	0	135	1,500	63,286
			A	0	135	6,086	40,286
1.6	Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) institucionalizada	# funcionarios	P	0	4	0	160,500
			P(a)	4	4	185,000	1,159,893.73
			A	6	6	124,135	859,893.73
1.7	Esquema de promotor único del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) diseñado	# manual	P	0	1	20,000	64,000
			P(a)	0	1	18,000	88,710
			A	0	1	20,000	88,710
1.8	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) capacitados en protocolo de servicios	# de promotores	P		0		0
			P(a)		200		97,137
			A	0	200	0	77,137
1.9	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pagados	# de promotores	P		0		0
			P(a)		200		1,440,000
			A	0	0	0	0
1.10	Direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Central equipadas con mobiliario y equipo tecnológico	# oficinas	P	3	6	270,400	1,161,070
			P(a)	0	6	0	1,658,589.84
			A	0	2	0	1,448,589.84
1.11	Direcciones Regionales acondicionadas	# direcciones regionales	P	3	6	4,438,500	8,927,000
			P(a)	4	6	233,817	2,705,029.39
			A	3	4	233,180	2,205,029.39
1.12	Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento	# Sistema	P	0	1	154,083	297,833
			P(a)	1	1	140,000	261,833
			A	1	1	12,852.24	199,127.83

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Gestión Eficiente de los PTMC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados	Reglamento Operativo	P	0	3	125,082	242,782
			P(a)	0	3	0	10,700
			A	0	3	0	10,700
2.2	Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada	# programas	P	0	3	107,000	250,000
			P(a)	0	4	0	129,020.25
			A	1	4	0	129,020.25
2.3	Protocolo de recertificación de beneficiarios operativizado	# protocolos	P	0	3	2,177,718	4,755,718
			P(a)	2	3	0	500
			A	0	1	0	0
2.4	Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) diseñada, equipada y con servicio de alojamiento	# sistemas	P	1	1	3,545,500	7,898,500
			P(a)	0	1	266,000	3,295,370
			A	0	0	265,895	265,895
2.5	Funcionarios capacitados en el manejo de la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB)	# funcionarios	P	30	30	0	50,000
			P(a)	0	60	0	50,000
			A	0	0	0	0
2.6	Número de beneficiarios de programas anti-pobreza (Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián) registrados en el PIIB	Beneficiaries (#)	P	650,000	650,000	200	200
			P(a)	0	650,000	0	0
			A	342,059	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Aumento de la Inversión en Capital Humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Acuerdos interinstitucionales con Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para la verificación de corresponsabilidades actualizados	# convenios	P	0	2	10,700	42,800
			P(a)	1	2	500	0
			A	1	2	0	0
3.2	Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados	# Instrumentos	P	0	3	531,250	1,040,750
			P(a)	1	3	0	24,284.85
			A	0	2	0	23,284.85
3.3	Número de beneficiarios de la Red de Oportunidades (RdO) que reciben transferencias monetarias en base a la verificación de corresponsabilidades a través del SIG	Beneficiaries (#)	P	12,500	25,000	4,016,700	8,033,400
			P(a)	20,000	25,000	1,500	4,943,047.05
			A	16,031	16,045	2,404,650	2,443,047.05
3.4	Estándares de calidad para aplicación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados	# estándares y guías	P	0	10	140,000	338,800
			P(a)	0	10	38,000	888,831.37
			A	0	10	191,637	468,113.37
3.5	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) construidos	# Centros	P	3	5	1,772,478	2,954,130
			P(a)	0	5	0	5,567,036.4
			A	0	2	0	1,525,564.4
3.6	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) rehabilitados	# Centros	P	0	44	2,449,102	8,341,690
			P(a)	7	44	2,700,092	31,843,240.55
			A	6	12	1,218,045.14	5,257,784.14
3.7	Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñada	# esquema	P	0	1	0	36,141
			P(a)	0	1	0	47,116.97
			A	0	1	0	36,141
3.8	Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño	# niños	P	14,000	40,000	0	250,000
			P(a)	14,000	53,000	6,677	100,000
			A	13,000	13,000	0	0
3.9	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado	# Centros	P	45	89	4,400,256	6,748,707
			P(a)	2	99	61,000	726,407.12
			A	10	14	40,190.8	77,908.32
3.10	Niños menores de cinco años atendidos en Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)	Beneficiaries (#)	P	3,000	3,449	1,298,387	2,409,687
			P(a)	36	3,449	0	0
			A	252	0	0	0
3.11	Niños menores de cinco años atendidos modalidad comunitaria	Beneficiaries (#)	P	5,400	5,400	380,026	695,542
			P(a)	50	5,400	0	2,900,000
			A	50	50	0	0

Other Cost

Auditoria Operativa y Financiera del Programa	P			267,500	785,000
	P(a)			17,816	61,365
	A			0	25,733
Supervisión del Programa	P			28,000	56,000
	P(a)			3,000	14,447.38
	A			5,447.38	5,447.38
Monitoreo y Evaluación del Programa	P			321,000	871,000
	P(a)			0	0
	A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			27,961,032	60,000,000
		P(a)			3,932,902	60,000,000
		A			4,826,704.56	16,292,896.65

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
				Modify Financial Historical Actual	CAROLINAF	03/09/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
				Modify Physical Historical Actual	CAROLINAF	03/09/2020
	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) construidos	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/20/2020
	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) rehabilitados	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/20/2020
	Direcciones Regionales acondicionadas	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CAROLINAF	02/26/2020
	Direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Central equipadas con mobiliario y equipo tecnológico	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
	Dirección de programas para la administración, supervisión y monitoreo	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value -	CAROLINAF	03/10/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) conformada			caused by a change in the Financial P(a).		
	Estándares de calidad para aplicación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
	Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CAROLINAF	02/26/2020
	Funcionarios capacitados en el manejo de la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB)	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
	Funcionarios de las Direcciones Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formados	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
	Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC)	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CAROLINAF	02/27/2020
	Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
	Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño	Se realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021. Es importante destacar que este producto fue realizado y por tanto se logra la meta fisica en 2019. sin embargo, fue pagado con otra fuente de financiamiento ya que no había suficiente asignación presupuestaria.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
				Modify Physical EOP	CAROLINAF	02/26/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño	Se realizó la actualización para la planificación 2020 y 2021. Es importante destacar que este producto fue realizado y por tanto se logra la meta física en 2019. sin embargo, fue pagado con otra fuente de financiamiento ya que no había suficiente asignación presupuestaria.	Modify Output	P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).		
	Niños menores de cinco años atendidos en Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)	En la columna de "EOP" (End of project), se ha corregido la meta que no debe sumar. Por tanto, se ha corregido la meta de fin de proyecto en la fila del P(a) y también ajustar el total de los actuales A. Las metas de este producto estaban calculadas como la suma automática de las cifras anuales, mientras que en realidad, y según los documentos de planificación enviados por ejecutor, las metas de fin de proyecto se obtienen con un cálculo manual. En la matriz de resultados original del proyecto se destaca que este indicador no debe sumar en EOP.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	CAROLINAF	03/09/2020
	Niños menores de cinco años atendidos modalidad comunitaria	Se corrigió la meta de fin de proyecto (EOP) en la fila del plan original P a 5,400, lo cual es consistente con la lógica "incremental" de las cifras reportadas y el valor indicado en la fila del plan P para el año 2019. Es consistente con la matriz de resultados original del proyecto	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
				Modify Output EOP to Not-Autocalculated	DIMITRAS	02/27/2020
				Modify Physical EOP P	DIMITRAS	03/06/2020
				Modify Physical EOP P(a)	CAROLINAF	03/06/2020
	Número de beneficiarios de la Red de Oportunidades (RdO) que reciben transferencias monetarias en base a la verificación de corresponsabilidades a través del SIG	En la columna de "EOP" (End of project), se ha corregido la meta que no debe sumar. Por tanto, se ha corregido la meta de fin de proyecto en la fila del P(a) y también ajustar el total de los actuales A. Las metas de este producto estaban calculadas como la suma automática de las cifras anuales, mientras que en realidad, y según los documentos de planificación enviados por ejecutor, las metas de fin de proyecto se obtienen con un cálculo manual. Los beneficiarios de la Red de Oportunidades pueden ser las mismas familias pagadas cada año. En la matriz de resultados original del proyecto se destaca que no debe sumar el EOP.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/10/2020
				Modify Output EOP to Not-Autocalculated	DIMITRAS	02/27/2020
				Modify Physical EOP P(a)	CAROLINAF	03/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CAROLINAF	02/26/2020
	Personal de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) contratado	e realizó la actualización para la planificación 2020 y 2021. Además se hizo el ajuste para que el EOP no sumara.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
				Modify Physical EOP P(a)	CAROLINAF	02/26/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) diseñada, equipada y con servicio de alojamiento	Se realizó la actualización para la planificación 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) capacitados en protocolo de servicios	Se ha desglosado en 2 el producto original numero 1.8 de Promotores del MIDES pagados y capacitados. Se ha creado el 1.8 correspondiente a Promotores del MIDES capacitados y el 1.9 correspondiente a Promotores del MIDES pagados. En la sección de avance físico, para el producto referido a "promotores capacitados" se ingresan las cifras de avance físico actualmente reportadas bajo del antiguo producto "Promotores del MIDES pagados y capacitados en protocolos de servicios" (672 en 2018, 131 en 2018). Además se ingresará el avance relativo al 2019. De igual forma, en la sección de avance financiero, se reportarán los costos incurridos para la capacitación de los promotores, copiándolos del producto antiguo y además agregando el costo del 2019. - Para el nuevo producto se ingresó la planificación física y financiera para 2020 y años futuros en la fila del Plan P(a). Para el producto referido a promotores capacitados, dicha planeación debería reflejar únicamente la porción BID de los recursos asignados y los promotores a capacitarse con dicho recursos.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CAROLINAF	03/10/2020
	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) capacitados en protocolos de servicios	Este producto estaba inactivado ya que el producto original que era Promotores del MIDES capacitados y pagados en protocolo de servicios, se desglosó para que apareciera como Promotores del MIDES capacitados y otro producto titulado Promotores del MIDES pagados. Al hacer la inactivación del producto original, cometí un error y no borré la información financiera por lo que estaba duplicada. Fue necesario activar nuevamente el producto original, borrar la información financiera, y luego volver a inactivarlo. Se adjunta justificación.	Modify Output	Inactivate Output	CAROLINAF	03/11/2020
				Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/11/2020
				Modify Financial Historical Actual	CAROLINAF	03/11/2020
				Modify Output name	CAROLINAF	03/10/2020
	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) capacitados en protocolo de servicios	Se ha desglosado en 2 el producto original numero 1.8 de Promotores del MIDES pagados y capacitados. Se ha creado el 1.8 correspondiente a Promotores del MIDES capacitados y el 1.9 correspondiente a Promotores del MIDES pagados. En la sección de avance físico, para el producto referido a "promotores capacitados" se ingresan las cifras de avance físico actualmente reportadas bajo del antiguo producto "Promotores del MIDES pagados y capacitados en protocolos de servicios" (672 en 2018, 131 en 2018). Además se ingresará el avance relativo al 2019. De igual forma, en la sección de avance financiero, se reportarán los costos incurridos para la capacitación de los promotores, copiándolos del producto antiguo y además agregando el costo del 2019. - Para el nuevo producto se ingresó la planificación física y financiera para 2020 y años futuros en la fila del Plan P(a). Para el producto referido a promotores capacitados, dicha planeación debería reflejar únicamente la porción BID de los recursos asignados y los promotores a capacitarse con dicho recursos.	Create Output	N/A	CAROLINAF	03/10/2020
			Modify Output	Modify Physical Historical Actual	CAROLINAF	03/10/2020
	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pagados	Se ha desglosado en 2 el producto original numero 1.8 de Promotores del MIDES pagados y capacitados. Se ha creado el 1.8 correspondiente a Promotores del MIDES capacitados y el 1.9 correspondiente a Promotores del MIDES pagados.	Create Output	N/A	CAROLINAF	03/10/2020
			Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CAROLINAF	03/10/2020
	Protocolo de recertificación de beneficiarios operativizado	Se realizó la actualización para la planificación 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
	Sistema de	Se realizó la actualización para la planificación 2020 y 2021.	Modify	Modify	CAROLINAF	03/10/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento	Ademas se hizo el ajuste para que el EOP no sumara.	Output	Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a)	CAROLINAF	02/26/2020
	Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) institucionalizada	e realizó la actualización para la planificacion 2020 y 2021. Ademas se hizo el ajuste para que el EOP no sumara.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CAROLINAF	03/09/2020
				Modify Physical EOP P(a)	CAROLINAF	03/10/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Cost and Budgetary Aspects
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
