

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1051	Chief of Operations Validation Date	04/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/29/20
Last Update	04/24/20	Country Representative Validation Date	05/01/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to Early Childhood Development	Loan Number	2667/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1051	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	18,941,880.71	70.16%	8,058,119.29
Aggregated	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	18,941,880.71	70.16%	8,058,119.29

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

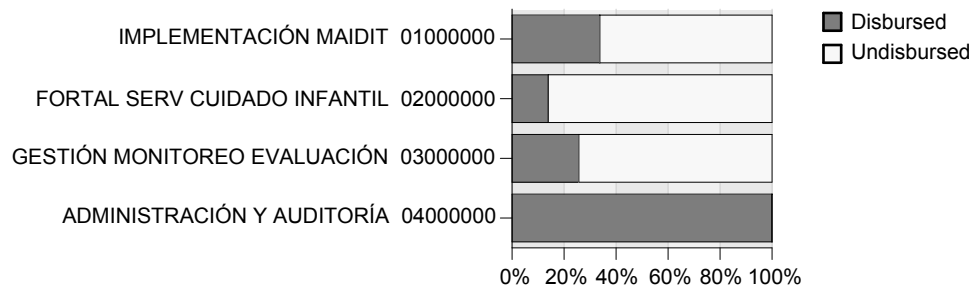

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2019	EOP 2021
1.1	Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.	% niños y niñas	10.00	2011	P			7.00
					P(a)			7.00
					A			

Details

Means of verification: Exámenes psicomotores y de lenguaje

Observations: Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano, ampliados.

Observation: Observaciones de indicador 1.1 Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado; 1.2 El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.3 El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.4, 1.5 y 1.6 Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas - porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
0.1	1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as	0.00	2011	P								10.00
					P(a)							0.00	10.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
0.1	1.2 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas	0.00	2011	P	5.00							10.00
					P(a)	5.00						0.00	10.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Observations: El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
0.1	1.3 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.	% niños/ñas	0.00	2011	P	20.00	30.00	40.00					50.00
					P(a)	20.00	30.00	0.00	10.00	50.00		0.00	50.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.

Observations: El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
0.1	1.4 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00					70.00
					P(a)		30.00	0.00	10.00	70.00		0.00	70.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
0.1	1.5 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00					70.00
					P(a)		30.00			70.00		0.00	70.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
0.1	1.6 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00					70.00
					P(a)		30.00		10.00	70.00		0.00	70.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: 2. Los servicios de los centros de desarrollo infantil articulados y fortalecidos.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
1.1	2.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00					30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00		0.00	30.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Encuesta específica al final de ejecución.

Observations: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2021
1.1	2.2 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00					30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00		0.00	30.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Encuesta específica al final de ejecución.

Observations: Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimient

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Persona	P		0		0
			P(a)	50	108	107,000	46,858.36
			A	58	58	11,858.36	11,858.36
1.2	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P		10		8,475,235
			P(a)	4	16	634,250	1,046,000
			A	0	0	0	0
1.3	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P		1		2,255,221
			P(a)	1	1	453,217	1,003,205.73
			A	1	1	368,676.35	1,003,205.73
1.4	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P		12		3,226,174
			P(a)	0	5	0	15,000
			A	0	0	0	0
1.5	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P		11		2,639,848
			P(a)	15	30	174,000	200,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P		167		3,678,615
			P(a)	7	11	1,043,980.12	1,042,357.95
			A	1	5	120,698.14	573,055.05
1.7	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P		0		0
			P(a)	3	3	852,399	600,377.96
			A	1	1	128,198.96	128,198.96
1.8	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P		0		0
			P(a)	0	10	667,440	898,217.39
			A	5	10	99,556.18	898,217.39
1.9	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	750	2,179	100,862	1,025,895.22
			A	1,012	2,029	206,907.96	405,895.22
1.10	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P		0		0
			P(a)	0	1	0	492,590.08
			A	0	1	0	492,590.08
1.11	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	30	60	75,000	22,155.91
			A	30	30	7,155.91	7,155.91
1.12	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agentes comunitarios	P		0		0
			P(a)	360	137	1,719,885	3,839,914.36
			A	374		1,600,283.58	3,669,914.36
1.13	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	34	44	5,070,760.6	6,123,693.98
			A	20	30	946,090.52	1,828,704.98
1.14	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	16	23	2,386,240.28	7,411,062.21
			A	10	17	666,688.62	1,248,852.21
1.15	1.3.4. Equipos de protección personal entregados	Número	P		0		0
			P(a)		2,210,000		3,500,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.15	1.3.4. Equipos de protección personal entregados	Número	A		0		0

Component Nbr. 2 2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P		1		388,000
			P(a)	0	1	6,583	15,628.39
			A	0	1	7,153.72	15,628.39
2.2	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P		31		1,188,519
			P(a)	29	32	604,363	437,265.8
			A	0	0	0	187,265.8

Component Nbr. 3 3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P		20		61,000
			P(a)	20	20	400,000	300,000
			A	0	0	0	0
3.2	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	sistema	P		1		130,000
			P(a)	0.3	1.7	43,985	378,119.38
			A	1	1.7	10,080.55	378,119.38
3.3	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	evaluaciones	P		2		640,000
			P(a)	0	2	36,061	28,254.3
			A	1	2	8,114.73	18,254.3

Other Cost

	Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Administración y Auditoría	P				1,318,258
		P(a)			494,894	1,573,402.98
		A			350,442.3	973,402.98
	Imprevistos	P				63,900
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				30,000,000
		P(a)			14,870,920	30,000,000
		A			4,531,905.88	11,840,319.1

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	04/21/2020
	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	04/21/2020
	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	04/05/2020
	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Se carga información conforme al Informe Semestral remitida por la Unidad Ejecutora	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	04/24/2020
	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/13/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/13/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	1.3.4. Insumos básicos prioritarios adquiridos para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19	Se crea el producto con el objetivo de contar con recursos e insumos necesarios para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19	Create Output	N/A	VSOSA	04/21/2020
	1.3.5. Equipos de protección personal prioritario adquiridos para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19		Delete Output	N/A	VSOSA	04/22/2020
	1.3.5. Insumos de alta complejidad adquiridos para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19	Se crea el producto con el objetivo de contar con recursos e insumos necesarios para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19	Create Output	N/A	VSOSA	04/21/2020
	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/13/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020
	3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	Se inactiva el producto conforme lo reportado en el informe semestral de la Unidad Ejecutora del Proyecto y los recursos planificados para el mismo se emplearán para otros productos prioritarios.	Modify Output	Inactivate Output	VSOSA	04/21/2020
	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	Se complementa los datos conforme a lo reportado por el ejecutor.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	04/24/2020
	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Se ajusta las proyecciones 2020 y 2021, conforme al Informe Semestral del consultor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARTAMA	03/12/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
