

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1153	Chief of Operations Validation Date	04/14/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/19/20
Last Update	04/07/20	Country Representative Validation Date	04/20/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Digital Agenda Support Program	Loan Number	4650/OC-PR
Executing Agency	Secretaría Nacional de Teconologías de la Información y Comunicación, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación	Sector/Subsector	RM-EGO - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-E-GOVERNMENT
Team Leader	THEINHARDT, JEAN ERIC	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las ubicaciones finales de los proyectos a ser apoyados por el Programa están pendientes de definición, resultando en la necesidad de actualizar el Analisis Ambiental y Social así como el Plan de Gestión Ambiental y Social del Distrito Digital, y realizar las evaluaciones socioambientales del Data Center, espacios Maker Space, y conexiones internacionales a fibra óptica. El MITIC ha cumplido con las condiciones de elegibilidad y se está preparando una Hoja de Ruta para desarrollar las evaluaciones socioambientales y las consultas públicas requeridas, previas al inicio de obras en cada proyecto.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1153	130,000,000	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	777,398	0.60%	129,222,602
Aggregated	130,000,000	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	777,398	0.60%	129,222,602

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

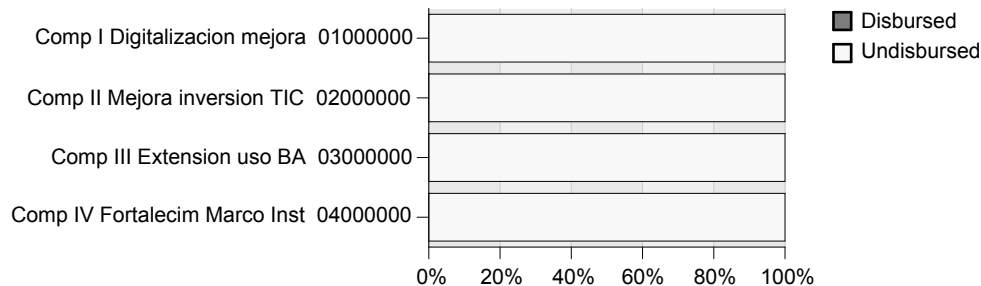

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora de la Competitividad y un aumento de la calidad de los servicios públicos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Nivel satisfacción ciudadano con los trámites	Escala 1 a 10	4.60	2015	P	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	6.00	6.00
					A								

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Ciudadanos que realizan trámites en línea	%	2.15	2017	P	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					A								

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Indicador Global de Competitividad (World Economic Forum)	puntos	3.73	2017	P	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	3.80	3.80
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	3.80	3.80
					A								

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: RESULTADO #1: Disminución de los costos transaccionales de servicios públicos para ciudadanos y empresas

Observation: Componente I

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Costo promedio de renovar la cédula de identidad	USD	94.00	2017	P				82.00			70.00	152.00
					P(a)				82.00			70.00	152.00
					A								0.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Costo promedio de abrir una empresa	USD	3,600.00	2017	P				3,000.00			2,700.00	5,700.00
					P(a)				3,000.00			2,700.00	5,700.00
					A								0.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: RESULTADO #2: Mayor uso de TICS por parte de las empresas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Empresas que invierten en TICS	Porcentaje	10.00	2013	P				10.50			11.00	11.00
					P(a)				10.50			11.00	11.00
					A								

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: RESULTADO #3: Aumento del número de usuarios conectados a servicios de BA de mayor calidad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Costo por MBPS	USD/MBPS	20.00	2016	P				7.24			4.18	4.18
					P(a)				7.24			4.18	4.18
					A								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.2	Cantidad de líneas de BA fija por cada 100 habitantes	%	3.35	2016	P				5.37			5.80	5.80
					P(a)				5.37			5.80	5.80
					A								
Details													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 4: RESULTADO #4: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Cumplimiento del MITIC del Artículo 7° de la Ley 6207/2018	%	0.00	2019	P				50.00			73.00	123.00
					P(a)				50.00			73.00	123.00
					A								0.00
Details													

Means of verification: Informe de cumplimiento de metas institucionales preparado por SENATICS, auditado

Observations: Actualmente la SENATICS cumple adecuadamente con 8 de sus 22 atribuciones y se espera alcanzar, al menos, a 16. Las nuevas serían: (i) emitir directrices para la optimización de los procesos de interoperabilidad; (ii) coordinar acciones interinstitucionales para la integración de los servicios públicos; (iii) promover el uso de TICS en las comunidades del país; (iv) supervisar las compras públicas de TICS; (v) asesorar otras instituciones en las compras de TICS; (vi) establecer políticas de protección de la información personal y gubernamental, y un sistema de organización de seguridad, proponer una política de seguridad a nivel nacional; (vii) definir las mejores tecnologías y especificar los equipos, programas y medios de conectividad, para el MEC; y (viii) implementar un sistema de operación y mantenimiento y asistencia técnica de los equipos y conectividades contratados.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.1	Grado de Madurez de Procesos del MITIC (Diagnóstico y Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional del MITIC – 2019)	Puntaje	1.27	2020	P				3.00			4.00	4.00
					P(a)				3.00			4.00	4.00
					A								
Details													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2025	2019	EOP 2025
1.1	1.1 Porducto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas	# Análisis jurídico y/o propue	P		10	0	500,000
			P(a)		10		500,000
			A		0		0
1.2	1.2 Producto 2: Servicios simplificados y digitalizados	# Servicios	P		120		3,913,835
			P(a)		120		3,913,835
			A		0		0
1.3	1.3 Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), implementado	# Establecimientos con HIS imp	P		110		12,101,278
			P(a)		110		12,101,278
			A		0		0
1.4	1.4 Producto 4: Hoja de Ruta de transformación digital del SNC, elaborada	# Documento	P		1		60,000
			P(a)		1		60,000
			A		0		0
1.5	1.5 Producto 5: Sistemas de gobierno digital implementados	# Sistemas de gobierno electró	P		7		10,024,885
			P(a)		7		10,024,885
			A		0		0
1.6	1.6 Producto 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado	# Laboratorio	P		1		1,000,001
			P(a)		1		1,000,001
			A		0		0
1.7	1.7 Producto 7: Modelo de atención multicanal, implementado	#Modelo	P		1		1,000,000
			P(a)		1		1,000,000
			A		0		0
1.8	1.8 Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido	# Sistema	P		1		3,999,999
			P(a)		1		3,999,999
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente #2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2025	2019	EOP 2025
2.1	2.1 Producto 9: Emprendimientos con Base Digital, financiados con capital semilla	# EBD	P		160		3,531,200
			P(a)		160		3,531,200
			A		0		0
2.2	2.2 Producto 10: Emprendimientos de base digital en fase de expansión impulsados	# EBD	P		20		747,800
			P(a)		20		747,800
			A		0		0
2.3	2.3 Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras, captadas	# Acuerdos de cofinanciación d	P		30		1,490,368
			P(a)		30		1,490,368
			A		0		0
2.4	2.4 Producto 12: Capacitaciones en habilidades digitales para la ciudadanía realizadas	# de personas certificadas en	P		22,500		6,192,660
			P(a)		22,500		6,192,660
			A		0		0
2.5	2.5 Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales avanzadas	# de personas certificadas en	P		3,500		4,749,972
			P(a)		3,500		4,749,972
			A		0		0
2.6	2.6 Producto 14: Proyectos de transformación digital sectorial implementados	# Proyectos	P		4		1,388,000
			P(a)		4		1,388,000
			A		0		0
2.7	2.7 Producto 15: Distrito digital construido y operando	# Distrito	P		1		11,499,999
			P(a)		1		11,499,999
			A		0		0

Component Nbr. 3 Componente #3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2025	2019	EOP 2025
3.1	3.1 Producto 16: Sitios y edificios públicos conectados	# de sitios y edificios públic	P		220		4,600,000
			P(a)		220		4,600,000
			A		0		0
3.2	3.2 Producto 17: Data Center y NOC operando	# Data Center	P		1		22,500,000
			P(a)		1		22,500,000
			A		0		0
3.3	3.3 Producto 18: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos	# Gigabytes/ Segundo	P		100		18,500,000
			P(a)		100		18,500,000
			A		0		0
3.4	3.4 Producto 19: Antenas de transmisión de señal TDT instaladas y con actualización tecnológica de transmisión satelital	# Antenas	P		3		2,300,000
			P(a)		3		2,300,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente #4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2025	2019	EOP 2025
4.1	4.1 Producto 20: Plan de Negocio diseñado	# Documento	P		2		127,500
			P(a)		2		127,500
			A		0		0
4.2	4.2 Producto 21: Modelo de Gestión del MITIC, diseñado e implementado	Modelo de Gestión	P		1		2,151,357
			P(a)		1		2,151,357
			A		0		0
4.3	4.3 Producto 22: Plataforma tecnológica de Gestión fortalecida y ampliada	# Sistema	P		1		1,400,000
			P(a)		1		1,400,000
			A		0		0
4.4	4.4 Producto 23: Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada	# Personal Incremental/ Año	P		80		6,077,643
			P(a)		80		6,077,643
			A		0		0
4.5	4.5 Producto 24: Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado	# Personas	P		100		272,500
			P(a)		100		272,500
			A		0		0
4.6	4.6 Producto 25: Estrategia de Comunicación y Sensibilización de la Agenda Digital implementada	# Estrategia	P		1		3,371,000
			P(a)		1		3,371,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración, y Monitoreo del Programa	P				5,660,000
		P(a)				5,660,000
		A				0
	Auditoría Externa	P				260,000
		P(a)				260,000
		A				0
	Evaluaciones del Programa	P				580,000
		P(a)				580,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			0	129,999,997
		P(a)				129,999,997
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
