

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1157	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/15/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/13/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	<b>Loan Number</b>	3169/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍADE LA PROVINCIA DE MENDOZA	<b>Sector/Subsector</b>	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
<b>Team Leader</b>	CASABURI, GABRIEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	PROVINCIA DE MENDOZA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1157	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	35,153,098.36	70.31%	14,846,901.64
Aggregated	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	35,153,098.36	70.31%	14,846,901.64

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

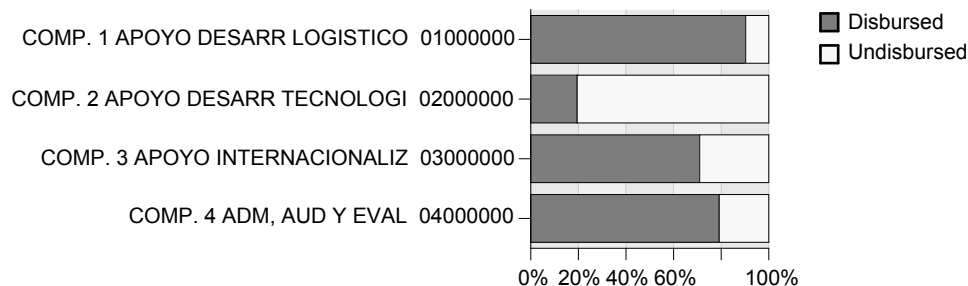

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Aumento de la competitividad de la economía mendocina

**Observation:** Índice Provincial de Competitividad (IPC). El IPC es un algoritmo que agrupa en siete dimensiones o factores los determinantes claves para definir el grado de competitividad de una provincia: personas, empresas, infraestructura, gobierno, recursos naturales, innovación, ciencia y tecnología y resultados económicos. El IPC es elaborado en forma bianual por la Bolsa de Comercio de Córdoba

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Aumento de la competitividad de la economía mendocina	Indice	2,589.00	2013	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa	US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013	P		0.65
					P(a)		0.65
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.	Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013	P		41.10
					P(a)		41.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 1:** Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.0	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Empresas	0.00	2013	P		11.00
					P(a)		10.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.1	Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.	Porcentaje	0.00	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.3	Diferencia en la tasa de supervivencia de los emprendedores asistidos/apoyados por el Programa y los emprendedores del grupo de control	Porcentaje	0.00	2017	P		
					P(a)		15.00
					A		

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.5	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2016	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones	# of enterprises	1,000.00	2013	P		1,400.00
					P(a)		1,400.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.3	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo al desarrollo logístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P		1		51,400,000
			P(a)	0	1	0	44,947,536.64
			A	0	1		44,947,536.64
1.2	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Unidad	P		0		0
			P(a)	1	1	2,667,002	2,724,555
			A	0	0	739,319	796,872
1.3	RPN82 Túnel 1: obra terminada	Unidad	P		0		0
			P(a)	1	1	2,035,897	2,035,897
			A	1	1	1,225,889	1,225,889

## Component Nbr. 2 Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P		200		450,000
			P(a)	0	116	5,000	309,034
			A	9	125	7,309	311,343
2.2	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	17,165	270,000.2
			A	0	1	5,132	257,967.2
2.3	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	61	2,151,967	3,750,000.75
			A	0	61	231,474	1,429,507.75
2.4	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Contratos de Mutuo suscriptos	P		0		0
			P(a)	3	9	1,250,000	7,256,009
			A	2	8	0	6,006,009
2.5	Obra acueducto finalizada	Obra finalizada	P		0		0
			P(a)	0	0	0	11,964,606.41
			A		0	0	949
2.6	Cursos de capacitación en habilidades digitales - Programa Mendoza TEC	Cursos	P		0		0
			P(a)	15	19	2,310,380	2,877,116
			A	20	20	91,070	257,806

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente III: Apoyo a la internacionalización

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Sistema	P		1		380,000
			P(a)	1	1	1,000	9,127
			A		0	492	8,619
3.2	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P		1		256,000
			P(a)	0	1	0	94,018
			A		1		94,018
3.3	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Estudios	P		5		725,000
			P(a)	1	3	50,000	124,500
			A		1		44,500
3.4	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P		1		220,000
			P(a)	0	0	1,500	9,322
			A		0	828	8,650
3.5	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Funcionarios	P		15		619,000
			P(a)	0	18	0	151,925
			A		18	0	151,925
3.6	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P		25		1,700,000
			P(a)	0	25	160,000	678,164
			A	12	37	63,190	581,354
3.7	Espacios logísticos asignados	Empresas asistidas	P		0		0
			P(a)	25	30	60,000	60,000
			A	35	40		0

## Other Cost

	Administración, Auditoría y Evaluación.	P				3,650,000
		P(a)			382,000	1,620,663
		A			51,565	1,090,828
	Imprevistos	P			1,000,000	1,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			2,250,000	79,000,000
		P(a)			11,091,911	79,000,000
		A			2,416,268	57,331,299.59

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Cursos de capacitación en habilidades digitales - Programa Mendoza TEC	Se ajusta el valor establecido del P (a) al final del proyecto (EOP) en función de lo reportado por el Ejecutor en su informe semestral.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MCORAGGIO	10/01/2020
	Espacios logísticos asignados	Se ajusta los valores en función de lo presentado por el Ejecutor en su reporte semestral.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MCORAGGIO	10/02/2020
	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Se ajusta el valor establecido en el P (a) en función del taller de revisión de la planificación del período 2020-2021, realizado el 11 de agosto de 2020, con el Ejecutor y el Órgano de Enlace (SAE).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JUANZE	09/23/2020
	Obra acueducto finalizada	Se ajusta el valor establecido en el P (a) en función del taller de revisión de la planificación del período 2020-2021, realizado el 11 de agosto de 2020, con el Ejecutor y el Órgano de Enlace (SAE). En el caso particular del acueducto, debido a que el Banco retiró su N.O. al resultado de la adjudicación de la licitación y al escaso plazo de ejecución del Programa para realizar todo el proceso nuevamente, el Ejecutor decidió redireccionar los recursos previstos de la obra hacia la nueva propuesta de gobierno digital.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MCORAGGIO	10/02/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MCORAGGIO	10/01/2020



## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
