

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1196	Chief of Operations Validation Date	10/15/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	MULTIPHASE PRIMARY HEALTH CARE PROGRAM FOR MANAGING CHRONIC NONCOMMUNICABLE DISEASES	Loan Number	3772/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL
Team Leader	TRISTAO, IGNEZ M.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1196	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	48,284,850.97	48.28%	51,715,149.03
Aggregated	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	48,284,850.97	48.28%	51,715,149.03

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

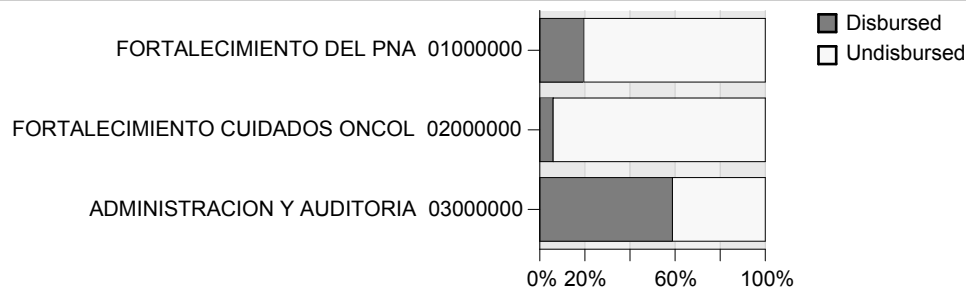

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, con énfasis en la población con cobertura pública exclusiva

Observation: Los indicadores de impacto se refieren a la población con cobertura pública exclusiva

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Hipertensos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de hipertensos del mismo rango etario	Porcentaje	62.30	2013	P	67.20		67.20
					P(a)	67.20		67.20
					A	0.00		

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Observations: Con base en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo. La próxima está prevista para 2018

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Diabéticos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de diabéticos del mismo rango etario.	Porcentaje	47.50	2013	P	52.10		52.10
					P(a)	52.10		52.10
					A	0.00		

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Mujeres entre 50 y 69 años con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano, sobre el total de mujeres registradas del mismo rango etario con diagnóstico de cáncer de mama.	Porcentaje	43.20	2015	P		49.40	49.40
					P(a)		49.40	49.40
					A			

Details

Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Mujeres entre 30 y 64 años con diagnóstico de lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino en estadio temprano, sobre el estimado del total de mujeres del mismo rango	Porcentaje	10.00	2015	P		18.00	18.00
					P(a)		18.00	18.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.4	etario con lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino .	Porcentaje	10.00	2015	A				
Details									
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.5	Personas entre 50 y 75 años con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal estadio temprano , sobre el total de personas tamizadas del mismo rango etario con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal .	Porcentaje	51.00	2015	P		60.00		60.00
					P(a)		60.00		60.00
					A				
Details									
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.6	Tiempo promedio que transcurre desde la sospecha diagnóstica de cáncer hasta el inicio del tratamiento definitivo.	Días	150.00	2015	P	100.00			100.00
					P(a)	100.00			100.00
					A	0.00			
Details									
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Personas de entre 40 y 65 años que utilizaron servicios de salud en el último mes, sobre el total de personas en el mismo rango etario y periodo de tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo hicieron habiendo tenido síntomas o problemas de salud	Porcentaje	75.00	2013	P	79.30			79.30
					P(a)	79.30			79.30
					A	0.00			
Details									
Means of verification: Este indicador se mide a través del estudio de impacto de Redes, sobre la base de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005, 2009, 2013 y 2018.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incrementar el acceso efectivo de la población con cobertura pública exclusiva a servicios de tamizaje para la detección oportuna de enfermedades crónicas o del riesgo de contraerlas

Observation: Los indicadores de resultado se refieren a la población con cobertura pública exclusiva

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de personas mayores de 40 años con CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron consultas de seguimiento en el último año	Porcentaje	16.00	2016	P	19.00		25.00	25.00
					P(a)	19.00	0.00	25.00	25.00
					A	7.50	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa	# of beneficiaries	0.00	2015	P	250,000.00	200,000.00		450,000.00
					P(a)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					A	231,574.00	345,733.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Personas entre 40 y 65 años que reportan haber tenido al menos una medición de presión arterial en los últimos dos años sobre el total de personas del mismo grupo etario	Porcentaje	72.00	2013	P	0.00	76.50		76.50
					P(a)	0.00	76.50	0.00	76.50
					A	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Personas entre 40 y 65 años que alguna vez tuvieron una medición de glucemia sobre el total de personas del mismo grupo etario.	Porcentaje	74.00	2013	P	0.00	78.40		78.40
					P(a)	0.00	78.40	0.00	78.40
					A	0.00	0.00	0.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details										
Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Mujeres entre 50 y 69 años con al menos una mamografía en los últimos 24 meses, sobre el total de mujeres del mismo grupo etario	Porcentaje	8.12	2015	P	0.00		10.00		10.00
					P(a)	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
					A	0.00	0.00	0.00		
Details										
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.5	Mujeres entre 30 y 64 años con al menos un tamizaje de cáncer cervicouterino según guías de práctica clínica , sobre el total de mujeres del mismo rango etario	Porcentaje	15.00	2015	P	0.00		18.00		18.00
					P(a)	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
					A	0.00	0.00	0.00		
Details										
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.6	Personas entre 50 y 75 años con al menos un tamizaje de cáncer colorrectal en los últimos dos años, sobre el total de personas del mismo rango etario en las provincias	Porcentaje	5.00	2015	P	0.00		6.60		6.60
					P(a)	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60
					A	0.00	0.00	0.00		
Details										
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 1: Incrementar las competencias de los efectores del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna o el tratamiento de enfermedades crónicas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	0.00	2016	P	1,890.00		3,780.00		3,780.00
					P(a)	1,890.00	2,880.00	3,780.00	0.00	3,780.00
					A	1,970.00	2,717.00	2,717.00		

Details

Means of verification: Informe de evaluación de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Médicos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en Terapéutica Racional de Medicamentos	Personas	1,800.00	2015	P	4,034.00	5,800.00	7,600.00		7,600.00
					P(a)	1,165.00	4,965.00	7,600.00	0.00	7,600.00
					A	733.00	2,126.00	2,126.00		

Details

Means of verification: Informe de Evaluación de Capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	0.00	2015	P	1,900.00				3,645.00
					P(a)	300.00	1,600.00	3,645.00	0.00	3,645.00
					A	590.00	858.00	858.00		

Details

Means of verification: Informes de evaluación de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Proyectos Jurisdiccionales de Inversión bajo la modalidad REDES 3 ejecutados	Jurisdicciones por año	P	24	24	16,957,090	66,966,965
			P(a)	0	24	26,478,132	55,567,723
			A	0	0	6,505,867	21,330,427
1.2	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	P	0	4,200	638,115	2,468,490
			P(a)	0	4,028	15,916	199,602
			A	0	4,028	10,269	193,955
1.3	Proyectos Innovadores de REDES finalizados	Proyectos	P	5	10	86,299	186,000
			P(a)	0	10	19,059	186,000
			A	0	0	0	1,049
1.4	Proyectos de Implementación-Acción de REDES III finalizados	Proyectos	P	10	10	1,190,000	2,000,000
			P(a)	0	4	24,365	228,044
			A	0	0	0	3,907
1.5	Avance en Evaluación Nacional a partir de diagnóstico de red provincial de atención de enfermos renales crónicos	Informe	P		0		0
			P(a)		1		42,000
			A		0		0
1.6	Tratamientos de medicamentos esenciales distribuidos en Centros del Primer Nivel de Atención	Tratamientos	P		0		0
			P(a)	25,000,000	25,000,000	20,096,880	29,876,865
			A	11,741,969	11,741,969	10,225,977	10,225,977
1.7	Jurisdicciones con estrategias de inversión para fortalecer la capacidad de respuesta frente al coronavirus COVID-19 ejecutadas	Jurisdicciones por año	P		0		0
			P(a)	24	24	4,662,564	10,801,103
			A	24	24	1,052,993	1,052,993
1.8	Compromiso de mercado para la adquisición de vacunas COVID-19 cumplido	pago	P		0		0
			P(a)	1	1	28,000,000	28,000,000
			A	0	0	0	0
1.9	Informes de carga de recetas finalizados	Informes	P	0	2	545,454	1,450,000
			P(a)	0	2	0	287,946
			A	0	1	0	287,946
1.10	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	Personas	P	4,160	15,000	1,878,373	5,424,129
			P(a)	2,495	12,390	14,427	502,963
			A	792	8,030	14,427	502,963

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la línea de cuidados oncológicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	Hospitales	P	16	46	2,575,488	7,033,274
			P(a)	16	46	373,050	6,349,348
			A	8	38	226,208	2,059,896
2.2	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Hospitales	P	14	50	1,819,104	4,464,594
			P(a)	5	33	106,756	4,464,595
			A	0	13	63,445	622,669
2.3	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Hospitales	P	15	39	110,644	434,935
			P(a)	2	21	25,269	434,935
			A	1	20	15,198	124,093
2.4	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Kits	P	136,800	326,070	2,142,989	13,113,481
			P(a)	174,506	337,340	1,799,866	11,141,428
			A	0	162,834	50,667	3,319,013
2.5	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Kits	P	300,000	435,000	611,335	2,467,324
			P(a)	254,125	385,050	14,838	5,958,377
			A	0	130,925	14,838	213,848
2.6	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	P	2,100	5,115	170,593	616,857
			P(a)	1,600	4,015	125	546,369
			A	60	2,475	125	16,096
2.7	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	Informe	P	0	1	99,892	794,498
			P(a)	0	1	8,603	118,031
			A	0	1	8,603	118,031

Other Cost

	Administración y auditoría	P			1,541,334	4,628,932
		P(a)			388,016	4,270,561
		A			132,842	1,475,405
	Gastos administrativos REDES	P			3,935,351	16,336,142
		P(a)			698,643	4,237,296
		A			390,555	3,621,120
	Gastos administrativos CUS-Medicamentos	P			3,211,721	11,635,749
		P(a)			377,343	2,699,814
		A			229,359	2,403,846
	Fortalecimiento para la implementación del registro	P			239,718	899,061
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			39,162,750	166,000,000
		P(a)			83,190,852	166,000,000
		A			18,941,373	47,573,234

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	El Ministerio de Salud informó los datos verificados por la auditoría médica, por lo cual se ajustó el valor reportado para 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	NATALIAB	09/28/2020
	Médicos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en Terapéutica Racional de Medicamentos	El Ministerio de Salud informó los datos verificados por la auditoría médica, por lo cual se ajustó el valor reportado para 2019. Se suspendió su dictado presencial por Pandemia Covid y la implementación de las actividades TRAPS se encuentran sujetas a definición de un nuevo acuerdo en materia de capacitación con referentes provinciales y se trabajará en la readecuación de alguno de los contenidos ya existentes a modalidad virtual así como a la Inducción de tutores virtuales. Este plan se estima implementar en el II Semestre 2021.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	NATALIAB	09/28/2020
	Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en estrategias de mejora de los cuidados de salud	El Ministerio de Salud informó los datos verificados por la auditoría médica, por lo cual se ajustó el valor reportado para 2019. Para el año 2020 se plantea un desafío particular, en cuanto el desfasaje entre ambos indicadores implica una brecha de 1063 personas para cumplir con la meta del indicador de resultados y una de 172 personas para alcanzar lo planificado en el marco del indicador de producto. Por otro lado, la creación de una unidad de capacitación dependiente directamente de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales (DNFSP) implicó la reformulación de la estrategia de capacitación, que debió adaptarse también al contexto de emergencia por COVID-19, en el que se ve dificultada la posibilidad de realizar los cursos planificados inicialmente. El Ministerio de Salud, por tanto, solicitó reducir la meta a 2.717.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	NATALIAB	09/28/2020
	Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa	El Ministerio de Salud informó los datos verificados por la auditoría médica, por lo cual se ajustó el valor reportado para 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	NATALIAB	09/28/2020
Output	Evaluación de la efectividad de las capacitaciones de REDES para promover estrategias de mejora de los cuidados de salud finalizada.	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Agentes	El Ministerio de Salud solicitó reducir la meta en 1000 agentes. Debido al contexto de pandemia por COVID-19, las estrategias de	Modify	Modify	NATALIAB	09/28/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	tamizaje sufrieron restricciones según la situación epidemiológica de cada jurisdicción, además de que parte de los equipos de APS debieron abocarse a otras tareas por o que se propone el cambio de mea, Además en algunas actividades históricas de capacitación, las personas capacitadas presentaron un porcentaje menor al 80% en el instrumento de evaluación, lo que implicó que no pudieran cuantificarse. Las capacitaciones planificadas por el INC de manera virtual por motivos administrativos y relacionados a cambios de gestión sufrieron retrasos en sus inicios (se espera para el segundo semestre poder cuantificar a aquellas personas que al momento de la medición se encontraban con capacitaciones en curso; además de la ejecución de nuevas ediciones planificadas).	Output	Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	09/25/2020
	Avance en Evaluación Nacional a partir de diagnóstico de red provincial de atención de enfermos renales crónicos	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud solicitó incorporar esta evaluación cuya etapa 1 se financiará con el préstamo 3772/OC-AR y la etapa 2 con el préstamo 5032/OC-AR.	Create Output	N/A	NATALIAB	09/15/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	NATALIAB	09/15/2020
				Modify Means of Verification	NATALIAB	09/15/2020
	Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora de la gestión farmacológica	Con el objetivo de contribuir a prevenir, mitigar y atender los impactos de la pandemia, el Contrato de Préstamo 3772/OC-AR fue enmendado mediante Contrato Modificatorio Nro 1 de fecha 8 de abril de 2020. En relación con el Subcomponente 1.2. Equipamiento de efectores del PNA, se solicitó una dispensa a lo previsto en la Cláusula 4.07 (b) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, que preveía la aprobación del Banco a un Plan de Equipamiento del Primer Nivel de Atención antes de realizar la primera licitación que se haga con cargo a los recursos asignados a este subcomponente. Con base en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Ley 27541), y entendiendo que resultaría consistente con el marco referencial para el Programa Multifase aprobado con la primera fase, se solicitó la inclusión de un conjunto de medicamentos financiados por el programa REMEDIAR y de la provisión de algunas vacunas. Ante la priorización de esta actividad, se redireccionaron los recursos de este producto al financiamiento de tratamientos médicos.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
Compromiso de mercado para la adquisición de vacunas COVID-19 cumplido		Como parte de la estrategia que el país ha elaborado para responder al aumento exponencial de casos del virus COVID-19, la República Argentina suscribió el 19 de septiembre de 2020 un contrato de "Arreglo de Compras Opcionales" (en inglés, "Optional Purchase Agreement" y, en adelante, el "Arreglo de Compras") con "GAVI, la Alianza para las Vacunas" (en inglés, "GAVI Alliance" y, en adelante, "GAVI") en el marco del "Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19" (en inglés, "COVAX Facility" y, en adelante, el "Mecanismo COVAX"). El Gobierno Argentino solicitó el Banco el financiamiento del pago inicial de la compra de vacunas por USD 28.000.000 se requerirá la reasignación de fondos no utilizados previstos originalmente para otros productos y gastos de administración. Se está procesando el Contrato Modificatorio Nro 2 para formalizar la elegibilidad de este gasto. La inclusión de este producto refleja esta nueva actividad que será financiada por el Programa.	Create Output	N/A	NATALIAB	09/21/2020
	Depósitos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejora en la gestión de medicamentos.	Con el objetivo de contribuir a prevenir, mitigar y atender los impactos de la pandemia, el Contrato de Préstamo 3772/OC-AR fue enmendado mediante Contrato Modificatorio Nro 1 de fecha 8 de abril de 2020. En relación con el Subcomponente 1.2. Equipamiento de efectores del PNA, se solicitó una dispensa a lo previsto en la Cláusula 4.07 (b) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, que preveía la aprobación del Banco a un Plan de Equipamiento del Primer Nivel de Atención antes de realizar la primera licitación que se haga con cargo a los recursos asignados a este subcomponente. Con base en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Ley 27541), y entendiendo que resultaría consistente con el marco referencial para el Programa Multifase aprobado con la primera fase, se solicitó la inclusión de un conjunto de medicamentos financiados por el programa REMEDIAR y de la provisión de algunas vacunas. Ante la priorización de esta actividad, se redireccionaron los recursos de este producto al financiamiento de tratamientos médicos.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Estudio	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en	Modify	Inactivate	NATALIAB	09/15/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	comparativo sobre experiencias provinciales en relación con la dispensa nominal y digital en el Primer Nivel de Atención	Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Output	Output		
	Estudio de acceso de medicamentos crónicos y su alcance en la planificación de CUS Medicamentos para asegurar su disponibilidad	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Estudio sobre la aplicación de TICs en los servicios de salud en red finalizado.	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Evaluación de costo-efectividad del Sistema de Información de Tamizaje y del uso de navegadoras finalizado	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Evaluación de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna de cáncer finalizado	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Evaluación de esquema alternativo de clasificación y	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	tratamiento del riesgo cardiovascular finalizada	de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.				
	Evaluación de resultados de los procesos en red finalizada.	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Evaluación del Curso de Cuidados de Medicamentos en el PNA (CUMAPS)	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Evaluación del cambio en práctica clínica de las capacitaciones en uso racional de medicamentos finalizada	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Evaluación del instrumento de certificación de procesos en red finalizada.	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
				Modify	DIMITRAS	09/25/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y financiera.	Modify Output	Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).		
	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Debido a la complejidad requerida de esta población definida (hemato-oncólogos infantiles, patólogo infantil, enfermeros oncopediatricos, cirujanos con expertis en cirugías oncológicas, terapistas con experiencia en inmunocomprometidos, psicooncólogos, cuidados paliativos etc), difícilmente se pueda modificar ampliamente el número de Unidades de tratamiento siendo que las de los hospitales públicos existentes ya están incluida en la red de ROHA, por lo que el Ministerio de Salud propone un cambio de meta mas alineado a las posibilidades reales de nuevas incorporaciones (existen 2 en proceso). El ROHA es un registro fuerte a nivel nacional, con una cobertura extendida del universo objetivo. Se ajustó un valor histórico por error de reporte.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	09/25/2020
				Modify Physical Historical Actual	NATALIAB	09/15/2020
	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	El desvío presentado en este indicador viene a consecuencia de distintas problemáticas internas del Instituto en lo que respecta a financiamiento y falta de RRHH del sector. Desde la nueva gestión se esta trabajando de manera activa en la reactivación de los procesos de formación de registradores, evaluando los convenios y abriendo canales de dialogo con distintas instituciones a fin de poder complementar la nueva meta propuesta, aparte de trabajar sobre los sistemas de registros.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	El 10 de diciembre de 2019 asumió el equipo del nuevo gobierno. A través del Decreto N° 50/19 se creó la Secretaría de Equidad en Salud, la cual absorbe las competencias relacionadas con los objetivos financiados mediante el Contrato del Préstamo 3772/OC-AR. Entre sus funciones, a esta Secretaría le compete el diseño de políticas estratégicas de carácter federal y territorial para el aumento de la equidad en salud y definir el modelo de financiamiento y gestión de la salud, contribuyendo a la articulación e integración de subsistemas de salud, programas sanitarios y redes de atención y entender en el diseño y desarrollo de una mayor integración de los sistemas de salud mediante la planificación, la articulación de estrategias de financiamiento, la distribución federal de recursos financieros y físicos y la armonización de coberturas. Entre las áreas que tendrá a cargo se encuentra la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, que incluye la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud y la Coordinación del programa REDES. El nuevo equipo revisó los estudios y evaluaciones previstos en el programa. Asimismo, el contexto COVID-19 obligó a revisar prioridades y la factibilidad de ciertas evaluaciones. En este marco, el Ministerio de Salud informó que no se realizará este estudio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
	Jurisdicciones con estrategias de inversión para fortalecer la capacidad de respuesta frente al coronavirus COVID-19 ejecutadas	Con el objetivo de contribuir a prevenir, mitigar y atender los impactos de la pandemia, el Contrato de Préstamo 3772/OC-AR fue enmendado mediante Contrato Modificatorio Nro 1 de fecha 8 de abril de 2020 para, entre otros, permitir la compra de insumos, equipamiento y medicamentos para la atención y prevención de la transmisión del virus COVID-19, como gastos elegibles del subcomponente 1.3. Estos gastos se financian como incentivos 6 y 7 de los proyectos jurisdiccionales de inversión. La inclusión de este producto refleja esta nueva actividad financiada por el Programa.	Create Output	N/A	NATALIAB	09/15/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	NATALIAB	09/15/2020
				Modify Means of Verification	NATALIAB	09/15/2020
	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica	En el contexto COVI-19 la estrategia de capacitación presentó demoras dada la imposibilidad de realizar las actividades presenciales previstas. Se realizarán cursos virtuales, lo cual supone un menor costo financiero.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value -	DIMITRAS	09/25/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	En el contexto COVI-19 la estrategia de capacitación presentó demoras dada la imposibilidad de realizar las actividades presenciales previstas. Se realizarán cursos virtuales, lo cual supone un menor costo financiero.	Modify Output	caused by a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	09/25/2020
	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	En el contexto COVI-19 la estrategia de capacitación presentó demoras dada la imposibilidad de realizar las actividades presenciales previstas. Se realizarán cursos virtuales, lo cual supone un menor costo financiero.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
	Plan de equipamiento centralizado de efectores para la mejora del diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Crónicas ejecutado.	Con el objetivo de contribuir a prevenir, mitigar y atender los impactos de la pandemia, el Contrato de Préstamo 3772/OC-AR fue enmendado mediante Contrato Modificatorio Nro 1 de fecha 8 de abril de 2020. En relación con el Subcomponente 1.2. Equipamiento de efectores del PNA, se solicitó una dispensa a lo previsto en la Cláusula 4.07 (b) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, que preveía la aprobación del Banco a un Plan de Equipamiento del Primer Nivel de Atención antes de realizar la primera licitación que se haga con cargo a los recursos asignados a este subcomponente. Con base en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Ley 27541), y entendiendo que resultaría consistente con el marco referencial para el Programa Multifase aprobado con la primera fase, se solicitó la inclusión de un conjunto de medicamentos financiados por el programa REMEDIAR y de la provisión de algunas vacunas. Ante la priorización de esta actividad, se redireccionaron los recursos de este producto al financiamiento de tratamientos médicos.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/15/2020
	Proyectos Jurisdiccionales de Inversión bajo la modalidad REDES 3 ejecutados	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y/o financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
	Proyectos de Implementación- Acción de REDES III finalizados	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by	NATALIAB	09/28/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y financiera.	Modify Output	a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	09/25/2020
	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Dado que el 11 de marzo de 2020 la OMS declara el brote de COVID-19 como pandemia, que en Argentina el 19 de marzo se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio aún vigente en el mes de septiembre, y la propagación exponencial de la enfermedad, la planificación 2020 física y financiera definida con anterioridad a estos eventos no reflejaba el plan de ejecución real del programa por lo que se procedió a ajustar las metas anuales de ejecución física y financiera.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NATALIAB	09/28/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	09/25/2020
	Tratamientos de medicamentos esenciales distribuidos en Centros del Primer Nivel de Atención	En el marco del Convenio Modificatorio Nro 1, en relación con el Subcomponente 1.3. Fortalecimiento de la red pública de gestión de medicamentos, el Gobierno Argentino solicitó incluir entre los gastos elegibles mencionados en el Párrafo 2.09 del Anexo Único del Contrato de Préstamo el financiamiento de medicamentos esenciales para el Primer Nivel de Atención. Con base en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (Ley 27541), y entendiendo que resultaría consistente con el marco referencial para el Programa Multifase aprobado con la primera fase, se solicitó la inclusión de un conjunto de medicamentos financiados por el programa REMEDIAR y de la provisión de algunas vacunas. La inclusión de este producto refleja esta nueva actividad financiada por el Programa.	Create Output	N/A	NATALIAB	09/15/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	NATALIAB	09/15/2020
				Modify Means of Verification	NATALIAB	09/15/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
